

**INFORME DEL AUDITOR
CUENTA DE INVERSIÓN
EJERCICIO FISCAL 2017
PROYECTOS DE INVERSIÓN
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO**



Auditoría General de la Nación

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

1. **TITULO:** Proyectos de inversión-Ejercicio Fiscal 2017
2. **DESTINATARIO:** Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
3. **DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES**

3.1. Responsabilidad del auditado

El organismo auditado conforme a la Ley 24.156, Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, es el Ministerio de Hacienda que tiene la función de coordinar, dirigir, supervisar y mantener los sistemas presupuestario, de contabilidad y tesorería del Sector Público Nacional (SPN).

La Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), como órgano rector del sistema presupuestario y de la Contaduría General de la Nación (CGN), como órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental del Sector Público Nacional (SPN) tienen las siguientes competencias:

- Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de la Administración Nacional (AN) e intervenir en los ajustes y modificaciones a los presupuestos, de acuerdo a las atribuciones que le fije la reglamentación.
- Evaluar la ejecución de los presupuestos, aplicando las normas y criterios establecidos por ley, su reglamentación y las normas técnicas respectivas.
- Realizar un análisis crítico de los resultados físicos y financieros obtenidos y de los efectos producidos por los mismos. Interpretar las variaciones operadas con respecto a lo programado, procurar determinar sus causas y preparar informes con recomendaciones para las autoridades superiores y los responsables de los organismos afectados.
- La CGN es responsable (entre otras funciones) de elaborar la Cuenta de Inversión.
- También es el administrador del Sistema Integrado de Información Financiera en Internet (e-SIDIF) para lo cual debe evaluar su funcionamiento y mantenerlo permanentemente actualizado conceptual y técnicamente,

El Sistema de Control Interno está a cargo de la SIGEN y de la UAI, siendo los responsables de la evaluación del ambiente de control.



Auditoría General de la Nación

La ONP nos informó que no hay registros de informes de auditoría emitidos por la UAI, relativos a Proyectos de Inversión para el ejercicio 2017.

Mediante la Disposición 820/2014 de la Subsecretaría de Presupuesto se creó el Comité de Impulso y Seguimiento para la Implementación del Presupuesto orientado a Resultados, el cual junto a la ONP realizaron acciones de mejoras entre las cuales se desarrollaron las siguientes tareas:

- Diseño de esquema de sistema de información de mediciones físicas mensuales, para su implementación a partir del ejercicio 2018.
- Diseño de un mejor enlace entre el Presupuesto Nacional y la Base de datos de Inversión Pública (BAPIN).

A su vez, la Subsecretaria de Evaluación Presupuestaria e Inversión Pública (ex Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo) es la autoridad de aplicación de la Ley de Inversión Pública y el Órgano Responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas recae sobre la DNIP, conforme la ley 24.354 y el Decreto 720/95.

La DNIP como Órgano Responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, tiene las siguientes competencias:

- Coordinar las acciones a seguir para el planeamiento y gestión de la inversión pública nacional y controlar la formulación y evaluación de los proyectos de inversiones realizadas en las jurisdicciones, en cuanto al cumplimiento de las metodologías, pautas y procedimientos establecidos.
- Elaborar anualmente el Plan Nacional de Inversiones Públicas e intervenir en la determinación de los proyectos a incluir en el mencionado plan, como parte integrante del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional.
- Organizar y mantener actualizado el inventario de proyectos de inversión pública, y desarrollar e implementar un sistema que proporcione información adecuada, oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero y sustantivo de las inversiones públicas, que permita el seguimiento de los proyectos de inversión pública.
- Controlar la evaluación ex post, realizada por los organismos, de los proyectos de inversión una vez finalizada la etapa de ejecución de la inversión.



Auditoría General de la Nación

3.2. Responsabilidad del auditor

Las responsabilidades de la Auditoría General de la Nación (AGN) consisten en evaluar las evidencias obtenidas mediante la aplicación de procedimientos seleccionados a juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos, para determinar si la información suministrada por el auditado y la expuesta en la Cuenta de Inversión se corresponde con los criterios establecidos para así emitir una conclusión al respecto.

El Auditor Gubernamental cumple con los principios éticos que establecen las normas de la AGN y los que le son aplicables al ejercicio de la función pública y en códigos de conducta que rijan como normas del ejercicio profesional.

Las normas de control externo gubernamental exigen una adecuada planificación, con identificación de los objetivos, el alcance y la estrategia metodológica a desarrollar, para obtener evidencia suficiente que permita alcanzar una conclusión en un marco de razonabilidad.

4. OBJETO

El objeto de la presente auditoría es la información física y financiera de la ejecución de los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional y la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2017, mediante el examen de la registración de las mismas referida al Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN III) de la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) y su interrelación con el Sistema Integrado de Información Financiera en Internet (e SIDIF).

5. OBJETIVO

Analizar el grado de cumplimiento de los componentes de la inversión pública desde el punto de vista físico y financiero a través de la evaluación de las distintas instancias del crédito y su ejecución presupuestaria, respecto al Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), la Ley 27.198, de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional, y la Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal 2017. A su vez, verificar y evaluar si la información suministrada por los organismos auditados cumple con los requerimientos establecidos por la normativa vigente para esta materia y verificar la correcta exposición en la Cuenta de Inversión.

Los aspectos más relevantes son:



Auditoría General de la Nación

- Inversión Pública por apertura programática, distribución geográfica, carácter económico, finalidad función y fuente de financiamiento.
- Programas con seguimiento físico-financiero de los organismos que conforman la inversión pública y de los organismos recaídos a la muestra de auditoría con proyectos definidos presupuestariamente.
- Asignación y ejecución del crédito presupuestario registrado en el sistema e-SIDIF (ejecución financiera).
- Documentación de respaldo relativa a cada una de las etapas presupuestarias informada en el subsistema e-PEF (ejecución física).
- Autorizaciones en materia de firma digital informadas en el registro de firmantes.
- La información expuesta en la Cuenta de Inversión 2017 comparativamente con los registros obrantes en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) y BAPIN (Banco de Proyectos de Inversión Pública).
- El seguimiento de las observaciones de los informes aprobados en ejercicios anteriores.

6. ALCANCE

El examen se realizó de conformidad con las Normas de Control Externo Gubernamental, aprobadas por Resolución N°26/15-AGN y N°187/16-AGN, y con el Código de Ética Institucional aprobado por Resolución N°18/15-AGN, que se encuentran fundadas y consistentes con los Principios Fundamentales de Auditoría de las Normas Internacionales aplicables por las Entidades Fiscalizadoras Superiores, las regulaciones especiales vigentes en la República Argentina en el marco del mandato establecido por el art. 85 de Constitución Nacional y el art. 118 de la Ley N° 24.156.

Nuestro análisis se llevó a cabo, a partir de una adecuada planificación y ejecución de labores de auditoría orientadas al examen de la ejecución física y financiera de la Inversión Pública Nacional, conformada por la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital para el ejercicio fiscal 2017.

Como a su vez, abarca el cumplimiento de la normativa en base a la información presentada por los organismos a la Dirección de Evaluación Presupuestaria (DEP), dependiente de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), su exposición en la Cuenta de Inversión 2017 y la registración en el sistema BAPIN.



Auditoría General de la Nación

El análisis general de la inversión pública de la Administración Nacional contempla a la muestra de auditoría correspondiente a la Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal 2017, que tuvieron proyectos conforme la Ley 27.341, de Presupuesto General de la Administración Nacional. Los Servicios Administrativos Financieros (SAF) que integran la muestra determinada, son los que a continuación se detallan:

Cuadro N°1: SAF que integran la muestra de auditoría

ADMINISTRACIÓN CENTRAL			
Jur	Jurisdicción	SAF	Servicio Administrativo Financiero
58	Ministerio de Energía y Minería	328	Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios)
81	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	342	SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)
75	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	350	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
26	Ministerio de Modernización	366	Ministerio de Modernización
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			
Jur	Jurisdicción	SAF	Servicio Administrativo Financiero
57	Ministerio de Transporte	604	Dirección Nacional de Vialidad
52	Ministerio de Agroindustria	623	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
80	Ministerio de Salud	904	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
80	Ministerio de Salud	906	Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán

Las tareas de campo se llevaron a cabo en el período comprendido entre el 1º de marzo y el 20 de diciembre de 2018.

6.1. Criterios

En este apartado se determinan los puntos de referencias o estándares de comparación de mayor relevancia, relacionados con el objeto y objetivo de la auditoría utilizados para opinar o concluir sobre la cuestión a evaluar.

6.1.1. Criterios Identificados

- Ley 24.354, Inversión Pública crea el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, estableciendo sus objetivos y alcances.



Auditoría General de la Nación

- Ley 27.328, Contratos de Participación Público-Privada.
- Ley 22.520, de Ministerios.
- Ley 27.341 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017.
- Decisión Administrativa N° 12/2017: Análisis del presupuesto físico y financiero inicial de los programas bajo seguimiento.
- Decreto 13/2015, Modificación Ley de Ministerios 22.520.
- Decreto 434/2016, Plan de Modernización del Estado.
- Decreto 561/2016, Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
- Decreto 720/1995, designa autoridad de aplicación de la Ley 24354 a la Secretaría de Política Económica y como órgano responsable del sistema a la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP).
- Decreto 118/2017, creó la Unidad de Participación Público Privada.
- Decreto 552/2018, la Subsecretaría de Participación Público Privado tendrá a su cargo, cuando se trate de proyectos de inversión pública ejecutados a través de contratos de participación pública privado en los términos de la Ley 27.328.
- Decreto 2/2017, modificación Ley de Ministerios.
- Decreto 513/2017, modificación Ley de Ministerios.
- Decreto 696/2017, modificación Ley de Ministerios.
- Decreto 746/2017, modificación Ley de Ministerios.
- Decreto 118/2017, Contratos de Participación Público-Privada.
- Decreto 936/2017, la Unidad de Participación Público Privada fue sustituida por la de Subsecretaría de Participación Público Privada.
- Decreto N°513/2017 creación en el ámbito del Ministerio de Finanzas, la Unidad de Participación Público Privada.
- Decretos 206 y 243 del 2009 Fondo Federal Solidario.
- Disposición SSEPIP 1-E/2017, de 20 de octubre de 2017, fija el monto máximo del programa o proyecto de inversión pública que podrá ser aprobado directamente en el organismo para su inclusión en el Plan Nacional de Inversiones Públicas.
- Circular N° 1/2010-Oficina Nacional de Presupuesto, Firma Digital de comprobantes de programación y ejecución física de programas y proyectos.
- Circular N°1/2016, Procedimiento Complementario de la Decisión Administrativa N°10/2016.
- Circular N° 2/2016-ONP, Firma Digital Gestión Física de Programas y Proyectos.
- Cuenta de Inversión 2017, Tomo I: Obras y Servicios que inciden en ejercicios futuros.
- Cuenta de Inversión 2017, Tomo II: Resultados por Programas y Proyectos



Auditoría General de la Nación

de la Administración Central y de los Organismos Descentralizados, Ver Anexos II.1 y II.2.

- Informes SIGEN-UAI
- Manual de Formulación Presupuestaria de Administración Nacional 2017-2019.-Formularios
- Página Web Dirección Nacional de Inversión Pública.
- Página Web Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- Resolución 24/2016, fija el monto máximo del programa o proyecto de inversión pública que podrá ser aprobado directamente en el organismo para su inclusión en el Plan Nacional de Inversiones Públicas.
- Resolución Conjunta N° 184/5/639 de 2010 normativa a cumplimentar por el Fondo Federal Solidario.
- Resolución de Cierre N°265/2017- de la Secretaría de Hacienda. La CGN efectúa el cierre de las cuentas correspondientes al Ejercicio 2017 y procede a confeccionar la Cuenta de Inversión para su remisión.
- Resolución SPE 125/2012, la cual fija los requisitos a cumplir por los proyectos que se quieran incorporar al Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP).
- Sistema BAPIN III
- Sistema Integrado de Información Financiera en internet (e-Sidif)
- Subsistema e-PEF (Programación y Ejecución Física de Programas y Proyectos).

6.1.2. Comentarios a los Criterios

• Sistema Nacional de Inversión Pública

Las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional no están habilitadas para contratar obras u ordenar compras de bienes de uso sin previa intervención de la Secretaría de la Transformación Productiva del Ministerio de Producción, ex Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, de acuerdo al art. 16 de la DA 10/2016, de 19 de enero de 2016. Posteriormente, conforme el Decreto 513/2017 y el Decreto 696/2017, de 14 de julio de 2017 y 4 de septiembre de 2017, respectivamente, dicha secretaría pasó bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, efectuándose las adecuaciones pertinentes de la Ley 24.354.

Es dable aclarar, que la última versión del sistema BAPIN, número III, se encontró activa y dejó sin vigencia a la versión II para el presente ejercicio.

La Resolución 24/2016, de 31 de agosto de 2016, fijó el monto máximo, en \$148 millones, del programa o proyecto de inversión que podrá aprobar directamente



Auditoría General de la Nación

el organismo o ente iniciador para su inclusión en el Plan Nacional de Inversiones Públicas. Cabe señalar, que mediante Disposición SSEPIP 1-E/2017, de 20 de octubre de 2017, se fija dicho importe en \$200 millones.

Respecto a los formularios de Programación Presupuestaria, de acuerdo al Manual para la Formulación Presupuestaria de la Administración Pública Nacional 2017 – 2019, se excluye el Formulario 17, de Programación Financiera de las Transferencias e Inversiones Financieras para Financiar Gastos de Capital, realizado por las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, que elaboraban por fuera del sistema en formato Excel, transformándolo en PDF con firma digital adjunto al comprobante electrónico e-Sidif FOP. Esta información requerida por la DNIP fue sustituida por medio de reportes de salida de información del e Sidif que la ONP prepara al efecto.

- **Contratos de Participación Público-Privada (Ley 27.328)**

De conformidad a la Ley 27.328, del 16 de noviembre de 2016, se estableció una nueva modalidad de contratación, denominada “Contratos de Participación Público-Privada”. Dichos contratos se celebran entre los entes que integran el Sector Público Nacional con el alcance previsto en el artículo 8° de la ley 24.156 y sujetos privados o públicos (en carácter de contratistas) con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica. Mediante el art. 30, de la citada ley, se dispuso la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada. (Ver Anexo N°1).

Por medio del Decreto 118, del 17 de febrero de 2017, se estableció crear, en el ámbito del Ministerio de Finanzas, la Unidad de Participación Público Privada (UPPP), la cual estará asistida por el Ministerio de Hacienda.

La Comisión Parlamentaria Mixta nos detalló que la misma se conforma por 7 senadores y 7 diputados y que entre las funciones asignadas se encuentra las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley 27.328 y la Ley 27.437. A su vez, nos informó que no existió interacción con la DNIP, respecto a los proyectos bajo la modalidad de Participación Pública Privada para el ejercicio estudiado.

Por el Decreto 808/2017 y el Decreto 936/2017, de 6 de octubre de 2017 y de 14 de noviembre de 2017, respectivamente, se creó la Subsecretaría de Participación Público Privada transformándose en la autoridad de aplicación de la Ley N° 27.328, la cual sustituyó a la UPPP y se jerarquizó en secretaría conforme el DA 962/2017, de 1° de noviembre de 2017.

Cabe destacar, que el Decreto 552/2018, de 15 de junio de 2018, definió que la Subsecretaría de Participación Público Privado tendrá a su cargo proyectos de



Auditoría General de la Nación

inversión pública ejecutados a través de contratos de participación pública privado en los términos de la Ley 27.328. A su vez, las competencias y funciones que la Ley 24.354 asigna a la Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria e Inversión Pública como autoridad de aplicación del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), así como el control de la formulación y evaluación de los proyectos de inversión, que el inciso b) del artículo 5° de la ley 24.354 impone a la DNIP, en su carácter de órgano Responsable de ese sistema.

Durante el ejercicio 2017, mediante la normativa vigente, se pudo utilizar un tope del 5% del Presupuesto para los proyectos de Participación Pública Privada. Independientemente a lo estipulado, tanto la DNIP como la Secretaría de Participación Público Privado nos informaron que no se registró ninguna previsión presupuestaria relativa a dichos proyectos, por lo que no hubo asignaciones presupuestarias, ni órganos y entes que participaran en carácter de convocantes de proyectos, ni oferentes y/o contratistas.

Por otro lado, el proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras Etapa I”, tramitado bajo el expediente N°2017-23987384-APN-DNV, contó con el Dictamen favorable de la Secretaría de Hacienda, previsto en el artículo 13 de la Ley N°27.328, de 23 de noviembre de 2017, el cual tendrá asignado crédito en los ejercicios siguientes.

- **Plan Belgrano**

El Decreto 12/2015, fechado el 10 de diciembre de 2015, creó la Unidad Plan Belgrano, bajo la órbita de Jefatura de Gabinete de Ministros, cuyo objetivo, entre otros, fue efectuar el seguimiento del grado de ejecución de las políticas implementadas relativas al desarrollo social y productivo, como el fortalecimiento de la infraestructura productiva y del transporte en 10 provincias argentinas: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, Misiones, Corrientes y La Rioja.

La conformación organizativa de la unidad y la determinación de funciones fueron modificadas por Decreto 435/2016, de 1° de marzo de 2016 y el Decreto 760/2017, de 28 de setiembre de 2017.

Respecto a lo informado por la DNIP, los proyectos incluidos en el Plan Belgrano no tienen tratamiento especial en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Existe interacción entre la Unidad del Plan Belgrano y DNIP, ya que la citada dirección, envía información a la Unidad, durante la formulación y de Ejecución del PNIP, permitiendo que se haga un análisis territorial de las propuestas y se



Auditoría General de la Nación

ajusten prioridades por las autoridades de políticas transversales y sectoriales en el marco del Comité de Inversiones.

- **Modificaciones Ley 22.520 de Ministerios**

Para el ejercicio fiscal 2017, el sistema presupuestario se encontró operativo en 122 SAF, de los cuales 57 pertenecen a la Administración Central, 62 son Organismos Descentralizados y 3 Instituciones de Seguridad Social.

El Decreto 2/2017, fechado el 2 de enero de 2017, sustituyó la denominación del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas por la de Ministerio de Hacienda o Ministerio de Finanzas, debiendo considerarse cada ministerio en función de las competencias asignadas.

Con posterioridad, conforme el Decreto 801/18 y el Decreto 802/18, de 5 de setiembre de 2018, se fusionaron diversos Ministerios a fin de centralizar las competencias en un número menor de Jurisdicciones.

- **Firma Digital**

En lo referente a la firma digital, todos los comprobantes de programación y ejecución física de programas y proyectos deben obligatoriamente estar firmados por el responsable del SAF y por las máximas autoridades responsables de las unidades ejecutoras (Circular 1/10). Posteriormente, la ONP dictó la Circular 2/2016, de 7 de octubre de 2016, por la cual se requirió que los SAF ejerzan el rol de coordinador, lo que implicó firmar digitalmente los comprobantes de programación y ejecución física, y posibilitó que las máximas autoridades de las unidades ejecutoras de programas puedan suscribir mediante firma digital los comprobantes de e- SIDIF.

La ONP expresó que la Circular 2/16 determina el rol de los SAF como firmantes de la información física, aunque con la “deseable intervención de las unidades ejecutoras de programas” en lo que respecta a la firma digital de los comprobantes de ejecución y programación física. Es decir, que la obligación que imperaba en la Circular 1/10 se flexibilizó con la Circular 2/16, fundamentada en el Decreto 434/16.

La ONP nos informó que todos los SAF que tienen implementado el módulo e-Sidif PEF, contaron con firma digital para el ejercicio 2017.

- **Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)**



Auditoría General de la Nación

Cabe destacar, que se ha implementado a partir del ejercicio 2016, el envío de información remitida por los SAF a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica, como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, de acuerdo al Decreto 561/2016. En razón, de no disponer del Sistema GDE, la circularización de requerimientos y respuestas fue sustanciada a través de la Mesa de Entradas de cada organismo.

Conforme la Resolución de Cierre 265/2017, de 18 de diciembre de 2017, se considerará válidos aquellos archivos embebidos a documentos generados en el Sistema de Gestión Electrónica, siempre y cuando sean firmados digitalmente con su respectivo dispositivo criptográfico.

- **Responsabilidad de la Información que surge de los Estados y Cuadros requeridos para la elaboración de la Cuenta de Inversión**

Respecto a la Resolución de Cierre (SH) 265/2017, la información que surge de los Estados y Cuadros requeridos para la elaboración de la Cuenta de Inversión, de su respaldo documental, del cumplimiento de su presentación en tiempo y forma y de la confección y registro de los Formularios o Comprobantes de contabilidad correspondientes a los ajustes que disponga la Contaduría General de la Nación recae, en el ámbito de su competencia jerárquica, en el Secretario o Subsecretario de Coordinación Administrativa, el Jefe del Servicio Administrativo Financiero y el Responsable de la Unidad de Registro Contable de cada Servicio Administrativo de la Administración Central. Para el resto de los Entes obligados, aquella responsabilidad recaerá en la máxima autoridad de cada uno.

- **Informes de Auditoría Interna**

La Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) nos informó que no obran en los registros de la Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria e Inversión Pública informes de auditoría emitidos por dicho organismo. Como a su vez, no hay registros de informes de auditoría emitidos por la UAI, perteneciente al Ministerio de Producción ni tampoco cuentan con auditorías realizadas al sistema BAPIN.

A continuación, se detallan informes respecto al SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finanzas que hacen referencia a puntos sustanciales del informe de Proyectos de Inversión:



Auditoría General de la Nación

- ✓ En el Informe de auditoría interna N°50/2015, relativo a la Oficina Nacional de Presupuesto, se le efectúan tres observaciones y recomendaciones a la ONP. Estas consistieron en: 1) Falta de un manual de procedimiento que describa en forma integral los circuitos y las responsabilidades de los procesos. Se recomienda elaborar un manual. 2) Los firmantes digitales de los comprobantes no siempre se ajustan a lo establecido por la Circular 1/10 ONP, se recomienda actualizar la normativa vigente y 3) la falta de implementación de los Centros de Información Física
- ✓ Asimismo, en el Informe de auditoría interna N°58/17, respecto a la Oficina Nacional de Presupuesto, se estableció que la Dirección de Presupuesto de sectores Económicos y Sociales, no contó con manuales de procedimientos formalmente aprobados. A su vez, se detalló que, para el proceso de Formulación Presupuestaria, se utilizó el Manual para la Formulación del Presupuesto de la Administración Nacional, a la Resolución emitida por el Ministerio de Hacienda y a Circulares emitidas por la ONP. Asimismo, la operatoria relacionada con la Programación de la Ejecución se basó en la Disposición 141/2015-Instructivo para la Programación y Reprogramación de la Ejecución Física y Financiera del Presupuesto Nacional.
- ✓ En el informe de auditoría interna N°22/2017, cuyo objeto fue evaluar la operatoria implementada en la Dirección de Presupuesto, se observó apartamiento normativo en el proceso de formulación de Techos Presupuestarios, que las tareas desempeñadas por la organización interna no se ajustan a las establecidas por norma.
- ✓ Mediante el Informe de auditoría interna N°26/2017, cuyo objeto fue evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finanzas, incluida la metodología para la confección de la Cuenta de Inversión 2016, se informó que el control interno de los sistemas de información contable y presupuestario resultó suficiente para asegurar la calidad de la documentación requerida para la confección de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2016.
- ✓ Conforme el Informe de auditoría interna N°26/2017, cuyo objeto fue evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del SAF 357 Ministerio de Hacienda y Finanzas, incluida la metodología para la confección de la Cuenta de Inversión 2016, se informó que el control interno de los sistemas de información contable y presupuestario resultó suficiente para asegurar la calidad de la documentación requerida para la confección de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2016. Entre las aclaraciones, figuraron que la operatoria del e-Sidif no abarcó la totalidad de las operaciones, utilizando



Auditoría General de la Nación

supletoriamente el CONTESO, como registro auxiliar de Tesorería y otras relativas a inconsistencias en el sistema UEPEX y a Fondos Fiduciarios.

A la fecha de terminación del trabajo de campo no hay Manuales de Procedimiento formalmente aprobados que describan en forma integral los circuitos y las responsabilidades de los procesos, respecto a lo expreso por la UAI. No obstante, la ONP cuenta con Manual de Formulación Presupuestaria y Manual de Cierre del Ejercicio que incluyen instructivos que detallan los mecanismos de remisión física como a su vez, los lineamientos operativos se detallan en las guías de usuarios para Gestión Física de Programas y Proyectos.

6.1.3. Otros Comentarios

- **Sistema de Identificación y Ponderación de Proyectos Estratégicos (SIPPE).**

Es una plataforma de gestión de proyectos y obras, bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. La Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, dependiente de dicho ministerio, evalúan los planes territoriales a distintas escalas que se ingresan al SIPPE para articularlos con el SNIP, de acuerdo a las funciones otorgadas por el Decreto 1824/2004 y Decreto 231/2015

6.2. Procedimientos

Los procedimientos de auditoría implican la determinación de los criterios adecuados, considerando la normativa vigente y el cotejo de la información de la materia controlada con dichas normas.

A continuación, se detalla el alcance de los procedimientos aplicados en nuestra labor de auditoría, previstos en la Planificación del Informe:

- Se analizó la composición de la inversión pública de acuerdo a las diversas clasificaciones presupuestarias: distribución geográfica, carácter económico, finalidades, funciones, SAF, categorías programáticas, fuente de financiamiento, jurisdicción, por beneficiario y su variación con respecto al ejercicio anterior.
- En base a los proyectos de inversión que conforman el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2017/2019, se procedió a identificar la demanda de



Auditoría General de la Nación

inversión para el ejercicio fiscal 2017, y establecer la demanda de inversión insatisfecha, efectuando un análisis de la misma con el máximo nivel de desagregación.

- Se analizó de la ejecución financiera de los Gastos de Capital (Inversión Real Directa – Transferencias de Capital-Inversión Financiera), incluidos en la Ley 27.341– Presupuesto General de la Administración Nacional 2017, distribuida a través de la Decisión Administrativa N° 12/2017 y la Resolución de Cierre 265/2017.
- Se identificó para el ejercicio 2017, los proyectos que requirieron dictamen por parte de la Dirección Nacional de Inversión Pública, conforme la resolución vigente al cierre del ejercicio.
- Se analizó formalmente los expedientes incluidos en el Fondo Federal Solidario, respecto a lo dispuesto por el reglamento operativo de la Resolución Conjunta N°184/5/639 de 2010.
- Se verificó que la información objeto de auditoría, sea coincidente con lo expuesto en el Tomo II de la Cuenta de Inversión ejercicio 2017, y se constató que el Crédito Inicial, las modificaciones presupuestarias y el Crédito Vigente concuerden con lo registrado en el e SIDIF.
- Se comprobó a nivel SAF, que los totales de Gastos de Capital en base a los datos que surgen de la DA 12/2017 distributiva de la Ley 27.341 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2017y sus modificaciones, sean coincidentes con lo registrado por igual concepto en el e-SIDIF.
- Se realizó un análisis por distribución geográfica del Crédito Inicial, Vigente y Devengado para los proyectos de inversión contemplados en el PNIP 2017/2019 y la Ley de Presupuesto 2017, y su apertura por fuente de financiamiento, clasificación por finalidad y función, beneficiarios y objeto del gasto.
- Se solicitó a la Dirección de Evaluación Presupuestaria la documentación de respaldo que avale la evolución física y financiera de los proyectos de inversión identificados en los organismos seleccionados en la muestra de auditoría.



Auditoría General de la Nación

- Se vinculó y analizó los datos registrados en el BAPIN con los del e-SIDIF referidos a los proyectos de inversión de los organismos seleccionados en la muestra de auditoría, teniendo en cuenta la información que a continuación se detalla:
 - Detalle de evolución financiera del proyecto
 - Detalle de evolución física del proyecto
 - Controlar los indicadores económicos para el proyecto analizado.
- Se analizó la ejecución presupuestaria de gastos del Presupuesto Nacional 2016, en base a la actualización ordenamiento de las clasificaciones presupuestarias para el Sector Público Nacional aprobadas por la Resolución 388 de 6 de diciembre de 2013 de la Secretaría de Hacienda y contemplando los cambios introducidos por el Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015, modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, que incorporó cambios de carácter sustantivo a la estructura institucional del Sector Público Nacional.
- Se analizó la evaluación del ambiente de control, en el marco de la administración del riesgo de auditoría.

7. RESUMEN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

7.1. Plan Nacional de Inversiones Públicas 2017/2019

7.1.1. Conformación del Plan Nacional de Inversiones Públicas.

El PNIP contó con un crédito de origen de \$199.317 millones para el ejercicio 2017 que estuvo compuesto por la Inversión Real Directa (IRD), por un importe de \$65.474 millones (32,85%, 1951 proyectos), y por las Transferencias de Capital (TC), que alcanzaron \$133.843 millones (67,15%).

Como consecuencia de los requerimientos efectuados en el marco de nuestra labor de auditoría, cabe señalar, que la información respecto a la conformación PNIP suministrada por la DNIP correspondió sólo a la IRD. Tal situación se debió a que dicha dirección sólo conciliaba la IRD en el periodo de referencia. Considerando la participación mayoritaria que han alcanzado las TC en el PNIP, cabe destacar la falta de cumplimiento integral al Art. 8 y 10 de la Ley N° 24.354, por parte del órgano de aplicación, hecho que ocasiona un menor seguimiento y



Auditoría General de la Nación

posible análisis de las mismas para el ejercicio estudiado, como lo señalado en ejercicios anteriores respecto a la versión anterior del BAPIN.

Asimismo, respecto a lo informado por la DNIP, no se dispone de datos sistematizados de ejecución física ya que dicho análisis no es relevado por el BAPIN III, como tampoco la fecha de licitación nacional e internacional.

A su vez, los Adelantos a proveedores de largo plazo son contemplados en la carga de BAPIN III, a diferencia de lo registrado en la anterior versión, esto genera una visión completa de la inversión pública.

Es de señalar, que la DNIP debe realizar el control de la evaluación que lleva adelante cada organismo con respecto a los proyectos de inversión una vez finalizada la etapa de ejecución de la inversión y, al menos una vez, cuando se hayan cumplido 5 años de operación de los mismos (el art. 5° inc. f de la Ley 24.354). Dicha tarea no fue implementada aún por la Dirección. Lo descripto precedentemente debilita el ciclo del control.

7.1.2. Composición de la Demanda de Inversión Pública.

La demanda de IRD solicitada por las distintas jurisdicciones que conforman la APN, ascendió a la suma de \$126.347 millones (4184 proyectos) y fue satisfecha en un 29% respecto a los proyectos incluidos en el PNIP 2017-2019. (Ver Anexo N°2). Es dable aclarar, que el SAF 604-Dirección Nacional de Vialidad fue el SAF con mayor cantidad de proyectos, 287, por un monto de \$16.285 millones, incluidos en la demanda satisfecha. (Ver Anexo N°3).

7.1.3. Análisis de Proyectos de Inversión de la Inversión Real Directa.

- **Según su registración en el BAPIN III :**

Los proyectos que conformaron la IRD de la APN alcanzaron 1951 casos con un monto total de \$65.474 millones, que mediante modificaciones presupuestarias ascendieron a un monto de \$54.276 millones. Dicho monto difiere de acuerdo a lo extraído del sistema e-Sidif. Cabe destacar, que la DNIP nos informó que existen problemas de calidad en la información que dificultan la vinculación de los proyectos BAPIN con las partidas presupuestarias asignadas.

En el Cuadro N°2, se detallan los proyectos conforme su registración y su asignación presupuestaria, la cual es extraída del sistema e-Sidif.

Los mismos revisten distintas características en función de su registración o no en el sistema, y de si se pueden o no discriminar entre ellos.

Cuadro N°2: Proyectos de Inversión según su registración en el BAPIN



Auditoría General de la Nación

DETALLE	Q	%Q	CREDITO INICIAL	CREDITO VIGENTE	%CV	DEVENGADO	%EJECUCIÓN
REGISTRADOS	981	50,28%	42.330.855.723	36.963.337.798	68,10%	33.604.710.858	90,91%
ND	339	17,38%	9.422.006.605	8.990.948.933	16,57%	6.410.217.243	71,30%
NR	631	32,34%	13.721.721.189	8.322.347.270	15,33%	6.485.431.711	77,93%
TOTAL IRD	1951	100,00%	65.474.583.517	54.276.634.001	100,00%	46.500.359.812	85,67%

NR: NO REGISTRADOS EN EL BAPIN II

ND: NO DISCRIMINADOS SEGÚN SU REGISTRACIÓN EN EL BAPIN III y e-SIDIF.

Expresado en pesos. Q: Cantidad. %Q: Porcentaje cantidad %CV: Porcentaje Crédito Vigente.

Devengado. Fecha de corte: 22 de noviembre de 2017-diferencia con Punto 7.2.1. (Cuadro N°4). Fuente:

Base de datos-Respuesta a Nota N°83/18-AG02

No existe una adhesión formal al Sistema Nacional de Inversión Pública por parte de los poderes Legislativo y Judicial nacionales, los cuales informan al BAPIN, no otorgando detalle que permita la evaluación de proyectos y emisión de dictamen por parte de la DNIP. Situación similar, ocurre con las empresas públicas e instituciones financieras que envían información ex post a modo de consolidar un total de inversión pública nacional, no siendo objeto de evaluación por proyectos de inversión.

Cabe señalar, que el 32,34% (\$13.721 millones Crédito Inicial, \$8.322 millones Crédito Vigente y \$6.485 millones Devengado) del total de los proyectos no se encuentran registrados en el BAPIN III.

A su vez, los proyectos reconocidos como ND, surgen de la compatibilidad generada entre la apertura programática del BAPIN III y la considerada por el e-SIDIF, de la cual deriva esta diferencia (17,38%).

- **Según el estado del proyecto:**

Cabe señalar, que un 21,62% (422 proyectos) del total de la IRD (1951 proyectos) correspondió a proyectos sin información respecto a su estado, contando con un Crédito Inicial de \$8.980 millones y un Crédito Vigente de \$1.274 millones. A su vez, 7 proyectos (N°39091-74227-74228-67620-73351-58696-58697) fueron cancelados con un Crédito Inicial de \$185 millones, pertenecientes al SAF 330- Ministerio de Educación y Deportes, 322- Ministerio de Turismo y 327- Ministerio de Transporte. En el Anexo N°4 Cuadros A y B, se exponen los proyectos detallando su estado para el ejercicio estudiado y los proyectos cancelados, respectivamente.

- **Según el estado del dictamen:**

Es de destacar, que 194 proyectos fueron incluidos al PNIP 2017-2019, con Dictamen por un Crédito Inicial de \$17.525 millones y Crédito Vigente de \$18.161 millones con ejecución financiera del 96,44% (\$17.516 millones Devengado). En el Cuadro N°3 se detalla la calificación otorgada a los mismos:



Auditoría General de la Nación

Cuadro N°3: Proyectos de Inversión según el estado del dictamen ingresados al PNIP 2017-2019

DETALLE DEL DICTAMEN	Q	Crédito Inicial	%CI	Crédito Vigente	%CV	Devengado	%Devengado
APROBADO	80	7.606.635.111	43,40%	7.973.855.780	43,91%	7.849.055.072	44,81%
APROBADO CON OBSERVACIONES	102	8.340.357.286	47,59%	8.368.817.872	46,08%	7.672.724.288	43,80%
SIN INFORMACION	12	1.578.487.567	9,01%	1.830.940.037	10,08%	2.007.153.725	11,46%
Total general de Proyectos con dictamen (PD)	194	17.525.479.964	100,00%	18.161.167.297	100,00%	17.516.307.323	100,00%
Total IRD	1.951	65.474.583.517		54.276.634.001		46.500.359.812	
PD/IRD		9,94%	26,77%	27,74%		26,75%	

Base de datos-Respuesta a Nota N°83/18-AG02. Conforme la normativa vigente.

Durante el ejercicio 2017, se emitieron dictámenes de 16 proyectos, de los cuales sólo un proyecto contó con dictamen aprobado, el resto fue aprobado con observaciones. Es de destacar, que 9 proyectos (N°71129/ 71124/ 73600/ 73576/ 42579/ 63629/ 71106/ 73263/73588) fueron incorporados en el PNIP 2017-2019, incluidos en el Cuadro N°3, quedando 7 proyectos (N°67724/ 101233/ 101137/ 101235/ 103572/ 101902/109099) para futuros Planes de Inversión. En el Anexo N°5 se exponen los proyectos ejecutados sin dictamen respecto a la Resolución 24/2016, del 31 de agosto de 2016 y Disposición SSEPIP 1-E/2017, de 20 de octubre de 2017.

En el PNIP analizado fueron incluidos 29 proyectos, con un importe Devengado superior a \$200 millones, que tuvieron ejecución en el ejercicio 2017, y carecieron de dictamen. Dichos proyectos contaron con un monto de Crédito Inicial de \$13.595 millones, de Crédito Vigente \$17.841 millones y un Devengado de \$16.533 millones. (Ver Anexo N°5). Existen casos que un proyecto ingresa al PNIP con un total inferior al requerido por la normativa vigente para obtener dictamen, pero debido a modificaciones en su crédito en distintos ejercicios, su Devengado puede superar a dicho tope.

Es de señalar, que 9 proyectos, registrados en el BAPIN bajo los números: 48679, 48680, 48681, 71118, 64347, 55430, 62309, 70098 Y 71112; contando con un Crédito Inicial de \$1.539 millones, Crédito Vigente \$1.730 millones y un Devengado de \$1.906 millones, fueron ejecutados con Dictamen de Calificación técnica en trámite, debido a que el organismo iniciador no completó la información solicitada por la DNIP (Ver Anexo N°6).

Para los casos calificados como "Aprobado con Observaciones", los organismos deben responder de manera fundamentada a las observaciones realizadas, ratificando o rectificando la formulación original, no pudiendo iniciar la ejecución del proyecto hasta tanto no se cumpla con este requisito (Res. 125/2012-SPEyDP- Art. 5°). Es de señalar, que existieron 62 proyectos, ejecutados y con



Auditoría General de la Nación

dictamen aprobado con observaciones, sin contestación a las mismas por parte de los organismos por un monto de \$5.245 millones de Crédito Inicial, \$6.676 millones de Crédito Vigente y un Devengado de \$6.046 millones. Este hecho resulta contrario a la normativa vigente (Ver Anexo N°7).

7.2. Gastos de Capital – Inversión Pública

7.2.1. Gastos de Capital - Composición

Los Gastos de Capital previstos en la Ley de Presupuesto alcanzaron un monto de \$215.082 millones. El mayor porcentaje de participación correspondió a la Inversión Pública con el 92,67%, donde las TC alcanzaron el 62,23% y la IRD 30,44%. A su vez, la Inversión Financiera (IF) representó el 7,33% del total de gastos de Capital. En el Cuadro N°4 y Ver Anexo N°8, se analizan la conformación y las variaciones sufridas por los Gastos de Capital.

Cuadro N°4: Gastos de Capital

CONCEPTO	2017								2017/2016 VAR INTERANUAL	DEVENGADO/PIB 2017
	CREDITO INICIAL	%CI	MP	%var	CREDITO VIGENTE	%CV	DEVENGADO	%EJECUCIÓN	DEVENGADO	
INVERSION REAL DIRECTA	65.474.583.517	30,44%	323.274.470	0,49%	65.797.857.987	31,17%	59.450.466.810	90,35%	37,57%	0,56%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	133.842.896.516	62,23%	-1.857.212.784	-1,39%	131.985.683.732	62,53%	126.389.214.921	95,76%	14,78%	1,20%
TOTAL INVERSION PUBLICA	199.317.480.033	92,67%	-1.533.938.314	-0,77%	197.783.541.719	93,71%	185.839.681.731	93,96%	21,21%	1,76%
INVERSION FINANCIERA	15.764.580.521	7,33%	-2.481.254.066	-15,74%	13.283.326.455	6,29%	12.713.153.664	95,71%	-33,82%	0,12%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	215.082.060.554	100,00%	-4.015.192.380	-1,87%	211.066.868.174	100,00%	198.552.835.395	94,07%	15,08%	1,88%

VAR=Considerando Devengado. Montos expresados en pesos. Ver Anexo N° 8 (Cuadro A) incluye la variación interanual en las 3 etapas del gasto. Fuente: Base de datos e-SIDIF. PIB utilizado Indec: \$10.555.846 millones/ promedio 4°trim \$11.533.613 millones.

Al conciliar los parametrizados de los gastos de Capital en el e-SIDIF (\$ 215.082 millones) con la información expuesta en la planilla del Anexo al Art. 1° del Proyecto de Ley de Presupuesto (\$215.044 millones), se verificó una diferencia negativa de \$37.824.019. Es dable mencionar, que dicho monto derivó de la instrumentación del artículo 70 de la presente Ley, donde se faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a proceder a la distribución de los créditos aprobados a incorporar en la Jurisdicción 58 –Ministerio de Energía y Minería, los saldos de recursos remanentes recaudados en el Ejercicio 2015, correspondientes a las leyes 15.336, 24.065 y 23.966. Dichos créditos se asignaron al FEDEI, bajo la órbita del SAF 328 –Ministerio de Energía y Minería, programa 78.



Auditoría General de la Nación

Es de destacar, que los porcentajes de participación del Crédito Inicial expuestos en el gráfico de la Cuenta de Inversión de la página 175, difieren con lo desarrollado en el Cuadro N°4 del presente informe.

La diferencia entre el PNIP y el Total de Gastos de Capital Presupuestados (TGP), se debe a que este último contempla la IF, con una asignación presupuestaria de \$15.764 millones, y un Crédito Vigente de \$13.283 millones. Al analizar la variación interanual (2017/2016) de la Inversión Pública, es de destacar que la IF disminuyó en un 33,82% mientras que la IRD se incrementó en un 37,57% y las TC 14,78%, con respecto al Devengado.

Cabe señalar, que el 94,52% (\$12.555 millones) del crédito asignado a la IF, se destinó a Aportes de Capital y Compra de Acciones, conformado por un 65,87% (\$8.750 millones) destinado al Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar y el 28,60% (\$3.798 millones) a Aportes de Capital a Organismos Internacionales (Ver Anexo N° 9).

Al analizar la variación interanual (2017/2016) de la Inversión Pública aplicando el Índice de Precios al Consumidor (IPC - INDEC), con respecto al Devengado, es de destacar que la misma disminuyó un 2,88% en términos reales. A su vez, la IF disminuyó en un 46,97% mientras que la IRD se incrementó en un 10,24% y las TC disminuyeron 8,03%. (Ver Anexo N° 8 – Cuadro B)

7.2.2. Relación entre los Gastos Corrientes y de Capital

El Total de Gastos Presupuestados para el ejercicio 2017, alcanzó un importe inicial de \$2.363.658 millones, conformado en un 90,90% (\$2.148.576 millones) por Gastos Corrientes y en un 9,10% (\$215.082 millones) por Gastos de Capital.

Los Gastos de Capital disminuyeron en un 1,87% (\$4.015 millones), alcanzando un Crédito Vigente de \$211.066 millones, mientras que los Gastos Corrientes aumentaron un 12,75%, con un crédito final de \$2.422.447 millones.

7.2.3. Inversión Pública Total


7.2.3.1 Composición de la Inversión Pública

La Inversión Pública según su nivel institucional correspondió a la Administración Central en un 76,04% (\$150.398 millones) mientras que a los Organismos Descentralizados y a Instituciones de Seguridad Social en un 23,47% (\$46.420 millones) y 0,49% (\$964 millones) respectivamente, de acuerdo a su Crédito Vigente.



Auditoría General de la Nación

Gráfico N°1: Inversión Pública detallada según su nivel institucional

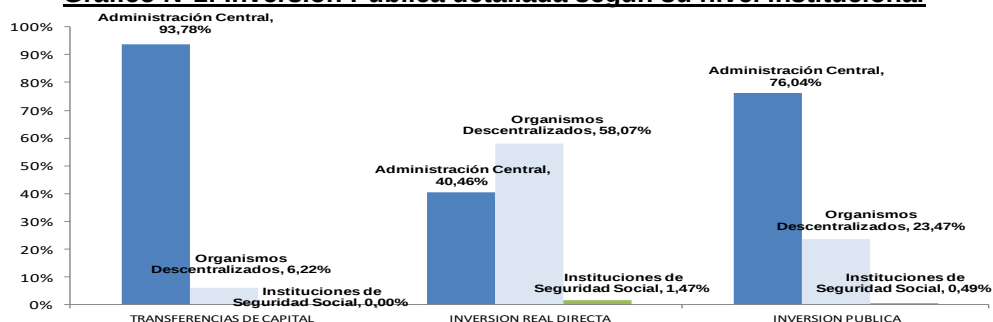

Fuente: Base de datos e-SIDIF. Ver Anexo N°10

Respecto al Devengado, el 75,48%(\$140.270 millones) del Total de la Inversión Pública correspondió a la Administración Central.


Durante el ejercicio 2017, el 74,73% del total de Crédito Vigente de la Inversión Pública se concentró en: la jurisdicción 91-Obligaciones a Cargo del Tesoro con el 29,30% (\$57.959 millones), la jurisdicción 57-Ministerio de Transporte con el 26,07% (\$51.561 millones) y en la jurisdicción 30-Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda con el 19,35% (\$38.275 millones). Considerando el Devengado, el 30,19%(\$56.101 millones) del Total de la Inversión Pública correspondió a la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro. (Ver Anexo N°11).

En el Gráfico N°2 se analiza la participación de los SAF en la Inversión Pública (Ver Anexo N°12).

Gráfico N°2: Inversión Pública detallada por SAF



Auditoría General de la Nación

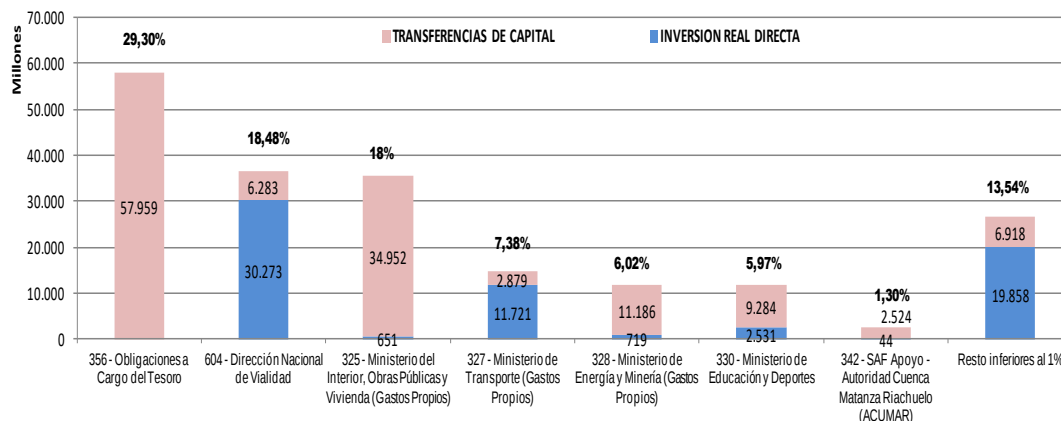

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF. Ver Anexo N°12

Considerando la IRD, el SAF 604—Dirección Nacional de Vialidad, participó en un 46,01% (\$ 30.273 millones) del Total de Crédito Vigente mientras que, con relación a las TC, el 70,40% (\$92.911 millones) del total de Crédito Vigente correspondió a: SAF 356-Obligaciones a Cargo del Tesoro (43,91%) y al SAF 325- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios) (26,48%).


Al considerar el Devengado, la participación más significativa respecto a la Inversión Pública correspondió al SAF 356 - Obligaciones a Cargo del Tesoro, con los mismos porcentajes y monto que el análisis por jurisdicción.

En el Gráfico N°3, se analiza a Inversión Pública por programas, de acuerdo al objeto del gasto (Ver Anexo N°13 y apartados 7.2.3.7.1. /7.2.3.7.2.). Los programas más significativos fueron: el programa 22-Construcciones bajo la órbita del SAF 604-Dirección Nacional de Vialidad, que participó del 19,47% del Crédito Vigente del total de IRD (\$12.809 millones, Devengado \$12.785 millones) y el programa SAF 356-PG.93 - Fondo Federal Solidario bajo la órbita del SAF 356 Obligaciones a cargo del Tesoro, que participó en un 19,49% del Crédito Vigente del total de TC (\$25.727. millones, Devengado \$23.968 millones).


Gráfico N°3: Inversión Pública detallada por programas
INVERSION REAL DIRECTA



Auditoría General de la Nación

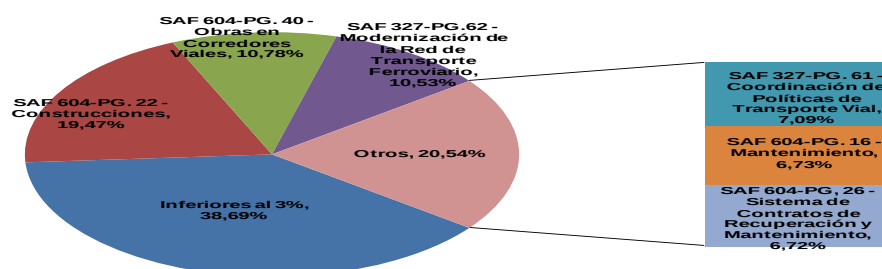

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

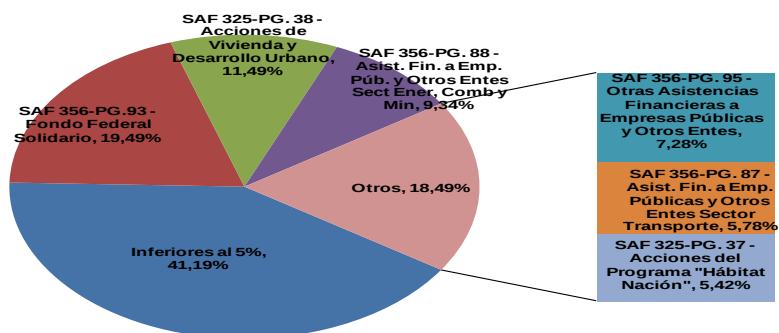

Fuente: Base de datos e-SIDIF. Ver Anexo N°13

7.2.3.2. Distribución geográfica de la Inversión Pública

En el país la mayor participación en el total de Crédito Vigente de la Inversión Pública fue para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con un 16,01% (\$31.660 millones, Devengado \$42.358 millones) y para la Provincia de Buenos Aires con un 16,98% (\$33.574 millones, Devengado \$27.900 millones). Es de señalar, que CABA disminuyó su participación en 2,94 puntos porcentuales sobre el total de la Inversión Pública con respecto al ejercicio 2016 mientras que la Provincia de Buenos Aires incrementó su participación, en 2,67 puntos porcentuales en el mismo periodo, con respecto al Crédito Vigente siendo las variaciones más significativas.

Catamarca y Santiago del Estero fueron las Provincias a las cuales más del 90% de la Inversión Pública se realizó a través de TC en detrimento de IRD. Dichas provincias tuvieron una participación menor al 2% del Crédito Vigente. (Ver Anexo N°14).



Auditoría General de la Nación

Al relacionar el total de la Inversión Pública 2017 con el total de habitantes por provincia, tomando como base de datos el Censo Nacional 2010 para ese ejercicio, C.A.B.A y la provincia de La Rioja, cuya ejecución presupuestaria representó \$42.358 millones y \$4.320 millones del Crédito Devengado respectivamente, tuvieron la mayor inversión pública per cápita. (C.A.B.A.: \$14.656 y La Rioja: \$12.949 per cápita). A su vez, las provincias con menor inversión per cápita correspondieron a Santa Fe y Buenos Aires (\$1.984y \$1.786 per cápita) (Anexo N°14).

Muchas de las obras localizadas en diferentes provincias sirven tanto a nivel local como a nivel nacional.

7.2.3.3. Fuente de Financiamiento de la Inversión Pública

La Inversión Pública se financió en un 86,80% con Fuente Interna y en un 13,20% de Fuente Externa. El Crédito Vigente destinado a fuentes de financiamiento de la Inversión Pública estuvo representado en un 93,40% por: el Tesoro Nacional en un 67,87% (\$134.243 millones, Devengado \$127.929 millones), el Crédito Interno en un 12,44% (\$24.602 millones Devengado \$23.173 millones) y un 13,09% (\$25.889 millones, Devengado \$23.896 millones) de Crédito Externo (Ver Anexo N°15). La fuente de financiamiento con mayor variación (2017/2016) fue el Crédito Interno que disminuyó su participación en 1,20 puntos porcentuales.

7.2.3.4. Finalidad y Función de la Inversión Pública

Según la finalidad, el 80,97% (\$160.148 millones) de Crédito Vigente de la Inversión Pública, se destinó a Servicios Económicos (47,19%) y a Servicios Sociales (33,78%). La finalidad Administración Gubernamental fue la única que incrementó su participación en 1,23 puntos porcentuales mientras que las demás disminuyeron sobre el total de la Inversión Pública. Respecto al Devengado la finalidad más significativa de la Inversión Pública correspondió a los Servicios Económicos con un monto de \$89.556 millones, representando el 48,19%.


Asimismo, con relación a la función, se destinó en un 30,04% a Transporte, equivalente a \$59.416 millones, marcando la mayor participación en el ejercicio. (Ver Anexo N°16). Con respecto al ejercicio anterior, la función Energía, Combustibles y Minería disminuyó su participación en 2,42 puntos porcentuales, marcando la variación interanual más significativa (Ejercicio 2016: 14,71%



Auditoría General de la Nación

participación Crédito Vigente \$25.787 millones). Considerando al Devengado la función más significativa de la Inversión Pública correspondió a Transporte con un monto de \$58.935 millones, representando el 31,71%.

Gráfico N°4: Inversión Pública detallada por función y variación interanual

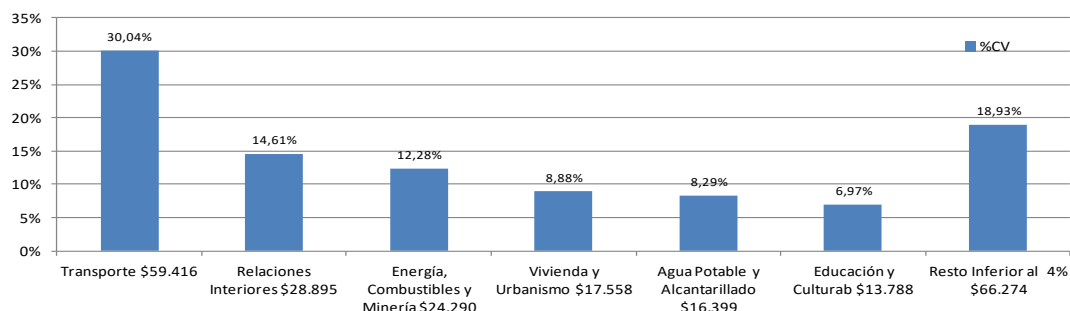

Montos expresados en millones de pesos, respecto al Crédito Vigente. Fuente: Base de datos e-SIDIF. Ver Anexo N°16

Con respecto al Crédito Vigente de la IRD en concepto de función, el 64,14% (\$42.202 millones) se concentró en la función Transporte.

Las funciones más significativas de TC que representaron el 65,74% fueron: Energía, Combustibles y Minería (17,82%, \$23.520 millones), Relaciones Interiores (21,57%, \$28.474 millones), Transporte (13,04%, \$17.214 millones) y Vivienda y Urbanismo (13,30%, \$17.554 millones).

7.2.3.5. Inversión Pública por Beneficiario

El Crédito Vigente de la Inversión Pública se distribuyó entre la IRD y las TC, con una participación del 33,27% y un 66,73% respectivamente. Los beneficiarios de la Inversión Pública según su conformación son los siguientes:

- **Inversión Real Directa:**

La IRD alcanzó un Crédito Vigente de \$65.797 millones respecto al objeto del gasto: un 95,49% (\$62.832 millones) correspondió a bienes de uso, el 3,12% (\$2.055 millones) a Servicios No Personales, 0,88% (\$581 millones) a bienes de consumo y 0,50% (\$330 millones) a gastos de Personal.

El 46,01% (\$30.272 millones) de su Crédito Vigente correspondió al SAF 604-Dirección Nacional de Vialidad (DNV), con un Devengado de \$ 29.987 millones,



Auditoría General de la Nación

marcando la mayor participación dentro de la IRD. Los beneficiarios más significativos del devengado por DNV se detallan a continuación:

Cuadro N°5: SAF 604-DNV: Beneficiarios más significativos

Detalle de Beneficiario	Importe Devengado	%Devengado
SIN BENEFICIARIO/DETALLE	5.642.750.536	18,82%
CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA SA	115.999.473	3,72%
SAF 604-HABERES Y OTROS -DIR. NAC. VIALIDAD	932.659.911	3,11%
DYCASA SA GREEN SA PERALES AGUIAR SA-UTE	856.068.521	2,85%
H5 S.A.	803.330.826	2,68%
CV1CONCESIONARIA VIAL S.A.	637.286.344	2,13%
EQUIMAC S.A.C.I.F. E.I.	619.453.131	2,07%
Resto Beneficiarios inferior al 2%	19.380.344.074	64,63%
Totales Generales	29.987.892.815	100,00%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF

A su vez, el 17,81% (\$11.721 millones) del total de Crédito Vigente de la IRD, le correspondió al SAF 327-Ministerio de Transporte con un Devengado de \$11.709 millones, donde el 64,77% (\$7.584 millones) no tiene información del beneficiario, conforme el Cuadro N°6:

Cuadro N°6: SAF 327-Ministerio de Transporte: Beneficiarios más significativos

Detalle de Beneficiario	Importe Devengado	%Devengado
SIN DATOS SOBRE BENEFICIARIOS	7.584.328.042,61	64,77%
CONSTRUMEX S.A.	804.677.316,36	6,87%
INGEVIAL SA-MARTELLI	752.894.785,88	6,43%
BRICONS S.A.	627.319.871,37	5,36%
ELEPRINT SA-ILUBAIRES SA-PEDRIAL CONSTRUCTORA SA-UNION TRANSITORIA	559.852.166,65	4,78%
MPFIPY S-5600/354-PY TRANSPURB-BIRF7794	420.248.059,00	3,59%
TEXIMCO S.A.	383.392.912,81	3,27%
MINTRANSP-5701/327 BID 2982-OC/AR-\$	324.329.768,00	2,77%
Inferiores al 2%	252.686.843,86	2,16%
Totales Generales	11.709.729.766,54	100,00%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF


- **Transferencias de Capital:**



Auditoría General de la Nación

Las TC contaron con un Crédito Vigente de \$131.985 millones y un Devengado de \$126.389 millones. Los beneficiarios de las TC se analizan en el Gráfico N°5 (Ver Anexo N°17).

Gráfico N°5: Beneficiarios de las TC

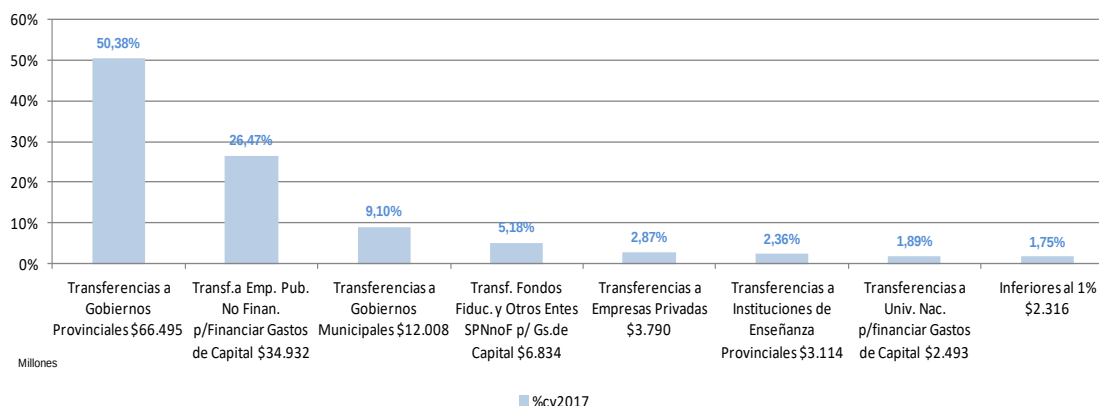

Montos expresados en millones de pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF. Ver Anexo N°17

El Crédito Vigente de las **TC destinadas al Sector Público Provincial** ascendió a \$66.495 millones, y representó el 50,38% del total de las TC. El 45,32% (\$59.809 millones) del Total de las TC se destinó a la Administración central provincial, donde el 19,40% (\$11.605 millones) se destinó a la Provincia de Buenos Aires.

Las **TC destinadas a las Empresas Públicas No Financieras** alcanzaron el 26,47% sobre el total de las TC, conformado casi en su totalidad por: Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.) (9,43%), Nucleoeléctrica Argentina S.A. (5,64%), Energía Argentina S.A. (3,55%) y Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (2,94%). Las TC destinadas a las Empresas Públicas No Financieras disminuyeron su participación en 2,40 puntos porcentuales con respecto al ejercicio 2016, siendo la variación interanual más significativa (2016: 28,87%, \$35.448 millones Crédito Vigente).

Las **TC destinadas a Gobiernos Municipales** alcanzaron un Crédito Vigente de \$12.008 millones (9,10%), donde en más del 90% se destinó a TC sin Discriminar. Situación similar, se dio con las **TC a Instituciones de Enseñanza Provinciales**, las cuales alcanzaron un Crédito Vigente de \$3.114 millones,



Auditoría General de la Nación

donde el 100% es Sin Discriminar. También las **TC a Universidades Nacionales** alcanzaron \$2.493 millones, con un 73,59% Sin Discriminar.

Del total transferido (\$6.834 millones) a los **Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público Nacional No Financiero para Gastos de Capital**, el 2,12% (\$2.800 millones) le correspondió al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal y el 1,52% (\$2.000 millones) al Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar. Cabe señalar, que los Fondos Fiduciarios y Otros Entes del Sector Público Nacional No Financiero para Gastos de Capital fueron los que tuvieron una variación positiva en la participación más significativa con respecto al ejercicio anterior, 1,41 puntos porcentuales (2016: 3,77%, \$35.448 millones Crédito Vigente).

Las TC a Empresas Privadas alcanzaron 2,87% (\$3.790 millones), que se encontraron Sin Discriminar en su totalidad.

Es de señalar que al analizar el Devengado, el Beneficiario más significativo de las Transferencias de Capital correspondió a la Administración central provincial con un monto de \$ 56.434 millones, representando el 44,65%.

7.2.3.5.1. Transferencias de Capital- Beneficiario Sin Discriminar (TCSD) – Partida Sub Parcial 9999


Para el ejercicio fiscal 2017, el 12,97% del total de Crédito Vigente de las TC, cuyo monto ascendió a \$17.125 millones, se clasificó como TC Sin Discriminar (TCSD). Las TCSD disminuyeron su participación en 1,57 puntos porcentuales, sobre el total de TC en comparación con el ejercicio 2016 (14,54%).

El 91,65% (\$15.695 millones) de las TCSD correspondió a Transferencias a Gobiernos Municipales (69,52%) y Empresas Privadas (22,13 %). (Gráfico N°6).

Gráfico N°6: Transferencias de Capital Sin discriminar



Auditoría General de la Nación



Montos expresados en millones de pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF. Ver Anexo N°18

Cabe señalar, que el 43,33% (\$7.419 millones) de las TCSD correspondió a dos programas: 27,16%(\$4.650 millones) Programa 37- Acciones del Programa "Hábitat Nación" bajo la órbita del SAF 325- Ministerio del Interior y el 16,17% (\$2.769 millones) Programa 74- Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, bajo la órbita del SAF 328- Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios). (Ver Anexo N°18)

Sin embargo, a través de la imputación del gasto por el Devengado pudimos analizar las TCSD, las cuales tuvieron como beneficiario a Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (C.A.M.M.E.S.A.) en un 12,72% (\$1.840 millones) como el más significativo de los beneficiarios de las TCSD. Es dable aclarar, que 3,70% (\$535 millones) se encontró sin detalle de información en la descripción del beneficiario (Detallado en el Cuadro N°7).

Cuadro N°7: TCSD: Beneficiarios más significativos

DESCRIPCIÓN	Devengado	%Devengado	Pagado
CAMMESA P/CTA.Y O. DEL ESTADO NACIONAL R.S.E. N° 389/2004 SIN INFORMACION	1.840.851.000	12,72%	1.840.851.000
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE-PROGRAMA ARRAIGO	535.731.483	3,70%	459.392.357
SUBSECRETARIA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO	332.193.717	2,30%	320.193.717
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. - ENHOSA	242.130.808	1,67%	242.130.808
OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNOPS)	232.230.371	1,60%	232.230.371
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA	218.702.755	1,51%	218.702.755
MEJORAMIENTO DE INFRA. VIAL PARA TRANSPORTE PUBLICO	213.598.083	1,48%	198.864.242
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO RES 671	193.776.126	1,34%	178.776.126
MUNICIPALIDAD DE EZEIZA - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES	156.295.426	1,08%	156.295.426
Inferiores al 1%	146.400.117	1,01%	122.479.243
TOTAL TCSD	10.361.889.016	71,59%	9.408.912.853
	14.473.798.901	100,00%	13.378.828.898

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF

7.2.3.6. Modificaciones Presupuestarias realizadas a la Inversión Pública



Auditoría General de la Nación

Para el ejercicio 2017, se determinó un Resultado Financiero negativo de \$480.840 millones, considerando recursos totales por \$1.882.818 millones y gastos totales por \$2.363.658 millones.

Examinadas las modificaciones presupuestarias al crédito de origen, los recursos totales alcanzaron \$1.974.470 millones y los gastos totales \$2.633.514 millones, situación que implicó un déficit presupuestario de \$659.043 millones. Si les descontamos las Rentas (BCRA y FGS) e intereses, alcanzamos un déficit de \$616.599 millones.

Los Gastos de Capital se redujeron en un 1,87% (\$4.015 millones); donde la Inversión Financiera fue el componente que disminuyó con mayor variación, 15,74% (\$2.481 millones), mientras la IRD y las TC modificaron en un 0,49% (\$323 millones) y en un -1,39% (\$1.857 millones) respectivamente (detallado en el Cuadro N°4-Gastos de Capital).

Cabe señalar, que el DNU 1013, de 7 de diciembre 2017, fue el que mayor impacto generó a la Inversión Pública, con una modificación presupuestaria negativa de \$7.584 millones en IRD y \$19.289 millones en TC.

En el Anexo N°19, se detalla la variación negativa del 100% de IRD y TC al crédito asignado a programas (\$24 millones crédito de origen) y TC (\$ 43 millones crédito de origen) Es dable aclarar, que el SAF más perjudicado, fue 330 - Ministerio de Educación y Deportes, donde a 2 programas se los dejó sin asignación de Crédito Vigente en IRD (Pg. 10-Actividades Comunes a la Secretaria de Innovación y Calidad Educativa y Pg.19- Desarrollo y Fortalecimiento de la Educación Física, la Recreación y la Infraestructura Deportiva).

7.2.3.7. Ejecución presupuestaria de la Inversión Pública

Los Gastos de Capital se ejecutaron en un 94,07%, alcanzando un Crédito Vigente de \$211.066 millones y un Devengado de \$198.552 millones. Asimismo, respecto a la conformación de los Gastos de Capital, la Inversión Pública alcanzó una ejecución financiera del 93,96% y la Inversión Financiera del 95,71%(Ejercicio 2016: 94,03% y 95,71% respectivamente). Es dable aclarar, que tanto la IRD como las TC alcanzaron una ejecución financiera superior al 90%. La mayor variación interanual en valores corrientes, respecto al Devengado correspondió a la IRD, 37,57% (detallado en el Cuadro N°4 y Ver Anexo N°8).



Auditoría General de la Nación

A nivel institucional, las Instituciones de Seguridad Social fueron la disminución relativa más significativa interanual en valores corrientes, de acuerdo al Devengado, alcanzando un 74,75% (Ver Anexo N°10).

Conforme la Finalidad, la Inversión Pública tuvo una ejecución financiera superior al 90%, salvo en Servicios de Defensa y Seguridad, que alcanzó el 64,44%. A su vez, la función con menor ejecución financiera fue Inteligencia, con el 45,37%. La mayor variación interanual en valores corrientes, conforme el Devengado correspondió a la finalidad Servicios Económicos, 22,46% y a la función Sistema Penal, 348,65% (Ver Anexo N°16).

A su vez, la ejecución financiera por ubicación geográfica fue superior al 83% tanto para las provincias como para la Ciudad de Buenos Aires. La mayor variación interanual en valores corrientes, conforme el Devengado, correspondió a la Provincia de San Luis, en un 79,61%. (Ver Anexo N°14).

La fuente de financiamiento externa fue la mayor variación interanual en valores corrientes, respecto al Devengado, alcanzando el 37,94% y, a su vez, la menor ejecución financiera fueron las Transferencias Externas (66,78%) (Ver Anexo N°15).

A continuación, se realiza un análisis de la Ejecución presupuestaria de la Inversión Pública por Jurisdicción y por SAF:

- **Por Jurisdicción**

Todas las jurisdicciones de la APN, alcanzaron una ejecución financiera superior al 50% del crédito otorgado. En el Cuadro N°6 se detalla las jurisdicciones con una ejecución financiera inferior al 80%.

Cuadro N°6: Inversión Pública-Ejecución por Jurisdicción-Inferiores al 80%



Auditoría General de la Nación

Cod. y Desc. Jurisdicción	INV. PUB.				%Ejecución
	Crédito Inicial	Crédito Vigente	%CV	Devengado	
Poder Judicial de la Nación	226.402.181	303.568.933	0,35%	308.737.639	55,58%
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	379.353.998	462.638.885	0,23%	266.714.223	57,65%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	65.228.444	70.574.382	0,04%	41096.477	58,23%
Ministerio de Seguridad	1949.385.132	3.082.274.929	1,56%	1947.931011	63,20%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1236.622.687	1252.398.855	0,63%	800.840.751	63,95%
Ministerio Público	193.773.000	174.860.368	0,09%	112.636.391	64,42%
Ministerio de Defensa	1635.060.398	2.336.034.135	1,38%	1523.749.461	65,23%
Jefatura de Gabinete de Ministros	566.133.749	423.627.655	0,23%	285.467.358	67,39%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	2.539.071.267	1303.136.395	0,66%	887.359.570	68,08%
Ministerio de Desarrollo Social	129.794.684	636.627.606	0,33%	439.971.532	71,35%
Presidencia de la Nación	669.667.345	748.964.621	0,38%	539.339.027	72,03%
Ministerio de Turismo	657.359.785	717.066.572	0,36%	529.728.846	73,87%
Poder Legislativo Nacional	187.606.910	228.737.590	0,12%	170.583.892	74,58%
Ministerio de Modernización	1000.475.231	987.475.231	0,50%	739.580.401	74,90%
Ministerio de Salud	1035.000.000	953.551.213	0,48%	736.826.853	77,27%
Resto Jurisdicciones con ejecución superior al 80%	336.866.945.485	384.122.244.544	93,09%	176.649.409.807	95,94%
Suma Total	199.317.480.033	197.783.541.719	100,00%	185.839.753.017	93,96%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

- **Por SAF**

Cabe señalar, que 5 SAF (916 - Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), 346 - Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, 319 - Defensoría del Pueblo, 370 - Ministerio de Defensa (Gastos Propios), 372 - Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas) tuvieron una ejecución inferior al 10% de la Inversión Pública por SAF (Ver Anexo N°12).

7.2.3.7.1. Inversión Real Directa

La IRD contó con un Crédito Vigente de \$65.797 millones y un Devengado de \$59.450 millones, ejecutándose financieramente en un 90,35%. De ello, los mismos SAF (916 - Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), 346 - Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, 370 - Ministerio de Defensa (Gastos Propios), 319 - Defensoría del Pueblo, 372 - Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas) que la Inversión Pública alcanzaron una ejecución financiera inferior al 10% del crédito otorgado (Ver Anexo N°12).

Es dable aclarar, que del total de programas que conforman la IRD: 379 (\$52.570 millones), 37 programas que la integran no tuvieron ejecución financiera (\$36 millones, Crédito Vigente), de los cuales 4 programas (\$6 millones, Crédito Vigente) fueron incorporados mediante modificaciones presupuestarias (Ver Anexo N°20). Los programas más relevantes conforme su significatividad en el Crédito Vigente, sin ejecución financiera correspondieron



Auditoría General de la Nación

al: SAF 310-Ministerio de Salud PG.17-Atención de la Madre y Niño (\$13 millones), SAF 330-Ministerio de Salud PG 17-Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo (\$ 5millones) y SAF 357-Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas PG 47-Coordinación con las Provincias (\$4 millones).

Por su parte, la IRD se conformó de 1742 obras, de las cuales el 48,22% (840 obras), que representaron el 2,74% del Crédito Vigente no tuvieron ejecución financiera. Mientras que, de un total de 902 actividades, el 25,27% no tuvo ejecución (228 actividades). Cabe señalar, que la cantidad de obras y actividades sin ejecución disminuyeron en un 50,18% y 2,15%, respectivamente, con respecto al ejercicio anterior (Ejercicio 2016: Q: Cantidad 1686 obras y 233 actividades) (Cuadro N°7).

Cuadro N°7: IRD-Ejecución financiera discriminada por obras y actividades

DESCRIPCION	CREDITO INICIAL	%CI	CREDITO VIGENTE	%CV	DEVENGADO	Q	%Q	SIN EJECUCION(SE)2017				
								QSE	%QSE/Q	CREDITO VIGENTE	VAR (2017/2016)	Q2016
OBRAS	51.181.396.156	78,17%	47.866.499.962	71,25%	45.098.470.602	1.742	65,89%	840	48,22%	1.315.999.410	-50,18%	1.686
ACTIVIDADES	14.293.187.361	25,88%	17.931.358.025	28,75%	14.351.996.208	902	34,11%	228	25,28%	570.679.159	-2,15%	233
TOTAL IRD	65.474.583.517	100,00%	65.797.857.987	100,00%	59.450.466.810	2.644	100,00%	1068		1.886.678.569		2.946

Q: Cantidad. QSE: Cantidad sin ejecución financiera considerando CV. Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF

Respecto a las obras ubicadas en las provincias que integran el Plan Belgrano (471 obras, \$8.157 millones Crédito Vigente y \$8.503 millones Devengado) el 46,50% (219 obras) no fueron ejecutadas financieramente (\$459 millones Crédito Vigente) (Ver Anexo N°14).

Del total de obras de la Administración Nacional, el SAF con mayor Crédito Vigente asignado a obras sin ejecución financiera correspondió al SAF 327-Ministerio de Transporte (Gastos Propios) con un Crédito Vigente de \$730 millones, 29 obras. Sin embargo, el SAF 604- Dirección Nacional de Vialidad, fue el organismo con mayor cantidad de obras sin ejecución (283) con un Crédito Vigente menor, alcanzando \$227 millones (Analizado en el Apartado 7.2.5. Proyectos incluidos en la muestra de auditoría y Ver Anexo N°31).

7.2.3.7.2. Transferencias de Capital



Auditoría General de la Nación

Las TC contaron con un Crédito Vigente de \$131.985 millones y un Devengado de \$126.389 millones, ejecutándose financieramente en un 95,76%. De ello, surge que 4 SAF (SAF 107 - Administración de Parques Nacionales, 374 - Estado Mayor General del Ejército, 305 - Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete y 608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial) no tuvieron ejecución financiera y sólo el SAF 317 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios) alcanzó una ejecución financiera inferior al 40% del crédito otorgado. Cabe mencionar, que el resto de los SAF alcanzaron una ejecución financiera superior al 40% según se detalla en el Anexo N°12.

Es de destacar, que del total de programas que conforman las TC: 129 (\$131.985 millones), 14 no tuvieron ejecución financiera (\$108.451 millones Crédito Vigente), de los cuales 4 programas fueron incorporados mediante modificaciones presupuestarias (Ver Anexo N°21).

Dentro de las TC, las participaciones más significativas en el Crédito Vigente correspondieron al SAF 325-Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (26,48%) y al SAF 356-Obligaciones a Cargo del Tesoro (43,91%), razón por la cual, se detallan a continuación:

7.2.3.7.2.1. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (SAF 325)

La participación del SAF 325 - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, en el total del Crédito Vigente de las TC, alcanzó el 26,48%, representando un total de \$34.952 millones, contando con un Devengado de \$34.694 millones y una ejecución financiera del 99,26%.

El programa que mayor participación tuvo bajo la órbita del SAF fue el Prog.38- Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano con el 43,38% (\$15.163 millones) (Ver Anexo N°22). Cabe destacar que el 45,13%(\$ 6.843 millones) del total de Crédito Vigente de dicho programa se localizó en la Ciudad de Buenos Aires (17,20%) y en la Provincia de Buenos Aires (27,93%). Cabe señalar, que sólo el programa 86- Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios tuvo una ejecución financiera inferior al 65%.

7.2.3.7.2.2. Obligaciones a Cargo del Tesoro (SAF 356)

La participación del SAF 356 - Obligaciones a Cargo del Tesoro, en el total del Crédito Vigente de las TC, alcanzó el 43,91%, representando un total de \$57.959 millones, contando con un Devengado de \$56.101 millones y una ejecución financiera del 96,79%.



Auditoría General de la Nación

El 95,42% (\$55.305 millones) del Crédito Vigente se concentró en 4 programas: Programa 87-Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del Sector Transporte con el 13,17%(\$7.631 millones), Programa 88-Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del Sector Energético, Combustibles y Minería con un 21,28% (\$12.333 millones), 95- Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente Binacional con el 16,59% (\$9.613 millones) y Prog.93-Fondo Federal Solidario con el 44,39% (\$25.727 millones). Todos los Programas del SAF 356 tuvieron una ejecución financiera superior al 93%. (Ver Anexo N°23).

7.2.3.7.2.2.1. Programa 88-Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros

Dicho programa contó con un Crédito Vigente de \$ 12.333 millones y un Devengado de \$12.319 millones, generando una ejecución del 99,88%. Es dable aclarar, que el 90,71% (\$11.187 millones) de dicho programa tuvo como beneficiario a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (52,67%) y a Energía Argentina S.A. (38,04%).

7.2.3.7.2.2.2. Programa 93- Fondo Federal Solidario (FFS) (SAF 356)

Para el ejercicio 2017, al FFS se le asignó un Crédito Vigente por un monto de \$25.727 millones, el cual surgió de modificaciones presupuestarias al crédito de origen, disminuyendo en \$4.659 millones.

El Devengado totalizó la suma de \$23.968 millones, generando una ejecución financiera del 93,16%. Las partidas presupuestarias de mayor cuantía se destinaron a la provincia de Buenos Aires, a la que se le asignó el 21,21% del total del Crédito Vigente (\$5.456 millones), siguiéndole las provincias de Santa Fe, que participó en un 8,63% (\$2.220 millones) y Córdoba en un 8,58% (\$2.206 millones) (Ver Anexo N°24).

Como consecuencia de los requerimientos efectuados en el marco de nuestra labor de auditoría, la Secretaría de Obras Públicas de la Nación dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, remitió los expedientes y las actas, confeccionados conforme lo dispuesto por el reglamento operativo de la Resolución Conjunta N° 184/5/639 de 2010 de la Secretaría de Hacienda (actualmente Ministerio de Hacienda), Secretaría de Interior y Secretaría de Obras Públicas (hoy Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda) y, correspondientes al 1° y 2° semestres del ejercicio 2017. En el Acta del 1° Semestre, la Secretaría de Obras Públicas manifestó que es necesario proceder



Auditoría General de la Nación

a realizar auditorías técnicas en el marco de lo previsto por la citada resolución, ya que la información presentada por las jurisdicciones no acompaña documentación técnica respaldatoria del avance físico de las obras (fotografías, relevamiento técnico, etc.). A su vez, agregó que la no objeción es provisional y sujeta al resultado de las citadas auditorías, sin desmedro de las acciones complementarias que se adopten. En función a la información recibida, se analizó las actas y los expedientes, según el cumplimiento que dio cada jurisdicción a los parámetros establecidos en los Decretos 206 y 243 de 2009, no considerando el análisis de gestión de cada jurisdicción sino sólo sus aspectos formales (Ver Anexo N°25).

El análisis de los expedientes, concluyó en los siguientes puntos:

- *En un gran número, los municipios no remitieron la información en soporte magnético, sólo en papel. (Falta de cumplimiento a la Resolución 184/5/639-2010).*
- *Los Anexos contaron con formatos diferentes a lo establecido en la citada Resolución, la cual determina los modelos a emplear por las Provincias y la CABA (Falta de cumplimiento a la Resolución 184/5/639-2010).*
- *Los proyectos no se encuentran registrados en el Sistema BAPIN provincial, ni BAPIN nacional (Falta de cumplimiento de la Ley 24.354, de Inversión Pública, art. 7°).*
- *Información entregada fuera de término por las jurisdicciones. A los efectos de lo establecido en el Decreto 243/2009, art.7°, inciso a, la información correspondiente al primer semestre debe remitirse con anterioridad al 31 de agosto de cada año, en tanto que la del segundo semestre deberá informarse antes del 28 de febrero del año siguiente.*

Es de destacar, la falta de estricto cumplimiento en los puntos detallados anteriormente con respecto a lo establecido en la Resolución Conjunta 184/5/639 de 2010 de la Secretaría de Hacienda (actualmente Ministerio de Hacienda), Secretaría de Interior y Secretaría de Obras Públicas (hoy Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda) y demás normativa vigente.

Cabe señalar, que mediante el Decreto 756/2018, del 14/08/2018, se derogó el Decreto N° 206, del 19 de marzo de 2009, dando fin al FFS.

7.2.4. Programa de Inversiones Prioritarias (PIP)

Cabe aclarar, que en el artículo 64 del Proyecto de ley de Presupuesto de 2017, se exponen las aperturas programáticas de las obras que conformaron el PIP para el ejercicio, a diferencia de ejercicios anteriores que la exposición dificultaba la individualización de las mismas.



Auditoría General de la Nación

Mediante el art. 5° del Decreto N° 1013/2017, fechado 12 de diciembre de 2017, se dejó establecido que en lo que respecta al alcance del “Proyecto 2 Mejora del Transporte en el Área Metropolitana” del Programa 61 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial, contempla las obras urbanas e interurbanas de mejora en el transporte público en el Área Metropolitana de todo el país, obras de mejora de la conectividad urbana e interurbana e intervenciones viales en tramos de conectividad urbana e interurbana, bajo la órbita del Ministerio de Transporte.

A su vez, en el artículo 34 se autorizó, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 60 de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones, a realizar distintas operaciones de crédito público. Entre ellas se encuentra una autorización de hasta un valor efectivo de colocación de \$90.000 millones, para tomar préstamos o emitir títulos públicos cuyo financiamiento son las obras del PIP detalladas en el artículo 64.

Como consecuencia de los requerimientos efectuados en el marco de nuestra labor de auditoría, la DNIP nos informó que los proyectos calificados como PIP no se incluyen como información detallada del PNIP y que, por ello, al realizar un cruce con el e-SIDIF, no se pudo identificar la totalidad de las obras ni tampoco una determinación fehaciente de su ejecución financiera. A su vez, dicha dirección nos señaló que no se dispone de datos sistematizados de ejecución física ya que dicho análisis no es relevado por el BAPIN III. Por lo tanto, al conciliar la información remitida de la DNIP con el artículo 64 del Proyecto de ley de Presupuesto de 2017 y con la información obtenida del e-Sidif, surgen diferencias en cuanto a la consideración de obra prioritaria y créditos asignados a las mismas.

En el Anexo N°26, se analizan las PIP respecto a su ejecución físico financiera y si contó con Dictamen de Calificación Técnica respecto a la información emitida por la DNIP.

A su vez, dicha Dirección nos informó que 3 proyectos, registrados en el BAPIN bajo los números 71519, 71499 y 71515 fueron ejecutados contando con Dictamen con Calificación Aprobado con Observaciones, sin contestación a las mismas por parte del organismo. Este hecho es contrario a la normativa vigente.

Las obras e iniciativas prioritarias que se encuentran a cargo de empresas públicas, no se reflejan en la estructura programática del Presupuesto de la Administración Nacional, estando excluidas del seguimiento físico.


Las obras que integran el PIP alcanzaron un Crédito Vigente de \$80.842 millones, conformados por: 91,41% (\$73.901 millones) de Adelantos a Proveedores y 8,58% (\$6.941 millones) de IRD.



Auditoría General de la Nación

Los Adelantos a Proveedores a largo Plazo (ADPL) alcanzaron un Crédito Inicial de \$90.528 millones y un Crédito Vigente de \$101.287 millones. Los ADLP contaron con un Devengado de \$ 27.652 millones y una ejecución financiera del 27,30%, representaron casi en su totalidad obras incluidas en el PIP. En el gráfico N°7 se detallan las obras más significativas de acuerdo a su participación en el Devengado.

Gráfico N°7: Adelantos a Proveedores a Largo Plazo -Obras más significativas respecto a su participación en el Devengado

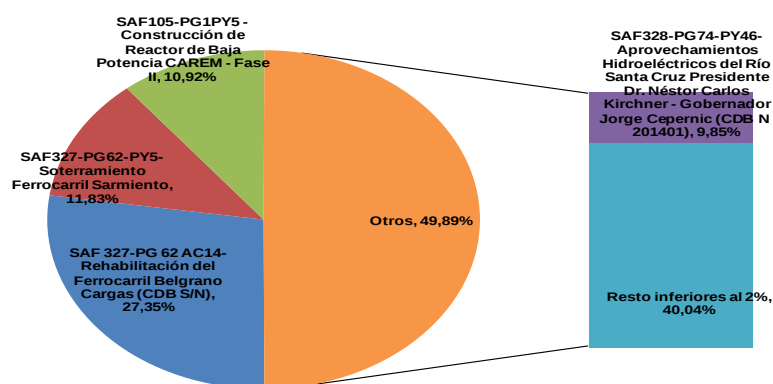

SAF 105- Comisión Nacional de Energía Atómica, SAF327-Ministerio de Transporte (Gastos Propios), SAF328-Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios) Fuente: Base de datos e-SIDIF

A su vez, en el Cuadro N°9, se detallan los beneficiarios de los ADLP, en un 77,81% no tienen descripción, conforme su Devengado.

Cuadro N°9: Beneficiarios de los Adelantos a Proveedores a Largo Plazo.



Auditoría General de la Nación

Leyenda	Devengado	%Devengado	Pagado
SIN INFORMACION	21.517.807.302,71	77,81%	16.362.139.036,91
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PROYECTO REACTOR CAREM	3.020.837.328,00	10,92%	3.020.837.328,00
INVAP S.E.	606.545.766,48	2,19%	318.741.644,08
BANCO NACION ARGENTINA-	322.835.515,00	1,17%	158.500.000,00
MINTRANS-5701/327 BID 2982-OC/AR-\$	298.180.812,00	1,08%	186.590.406,00
LEMIRO PABLO PIETROBONIA SA LUIS LOSI SA R N 19 UNION TRANSITORIA	261.625.758,97	0,95%	131.187.417,53
CRZ CONSTRUCCIONES S.A.-PERALES AGUIAR S.A. UNION TRANSITORIA	183.758.268,75	0,66%	78.689.113,48
PAOLINI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	95.213.388,00	0,34%	0,00
ROVELLA CARRANZA S.A.	91.432.245,09	0,33%	0,00
JOSE J. CHEDIACK SAICA	84.189.727,45	0,30%	0,00
CINCOVIAL S.A.	83.861.623,54	0,30%	0,00
CPC S.A. - CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M	77.048.753,67	0,28%	77.048.753,67
CARRETERAS CENTRALES DE ARGENTINA SA	71.095.800,84	0,26%	0,00
MUJOVI S.R.L.	69.270.124,77	0,25%	0,00
CV1 CONCESIONARIA VIAL S.A.	66.886.461,18	0,24%	0,00
PETERSEN THIELE Y CRUZ SA DE CYM-ROVELLA CARRANZA SA-UTE	60.173.843,82	0,22%	0,00
SERVICIOS TECNICOS Y MARITIMOS S.A.	59.530.431,33	0,22%	0,00
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - ROVELLA CARRANZA S.A. - UTE	54.720.939,03	0,20%	0,00
Resto inferior al 0,20%	627.840.900,12	2,27%	41.616.349,84
Total Beneficiarios a Proveedores a Largo Plazo	27.652.854.990,75	100,00%	20.375.350.049,51

Fuente: Base de datos e-SIDIF

Es de señalar, que determinadas inversiones durante el ejercicio analizado son ejecutadas, con IRD y/o TC, quedando ubicadas sobre la línea presupuestaria, mientras que otras, se financian, casi en su totalidad, con Adelantos a Proveedores y Contratistas, por debajo de la línea presupuestaria.

Al considerar los Adelantos a Proveedores al Resultado Financiero del Crédito Vigente, se generó un déficit del \$760.330 millones (Ver Apartado 7.2.3.6. Modificaciones Presupuestarias realizadas a la Inversión Pública).

Cabe destacar, que mediante el Proyecto de Ley de Presupuesto 2019 se derogó el PIP, lo que permitiría de ahora en adelante una mejor cuantificación del resultado financiero.

7.2.5. Ejecución Financiera de Obras, Bienes y Servicios que Inciden en Ejercicios Futuros

De conformidad con el Art. 11 de la Ley 27.341, el total a comprometer para el ejercicio 2017 para la contratación de obras alcanzó 335 casos por un monto de \$48.227 millones, y para la adquisición de bienes y servicios alcanzó 36 casos, por un monto total de \$6.324 millones.



Auditoría General de la Nación

El 75,52% del total de obras incluidas en el Art.11 de la Ley de Presupuesto no tuvieron ejecución financiera en el ejercicio 2017. Dicho porcentaje disminuyó en 14 puntos porcentuales con respecto al ejercicio anterior (89,87%-2016) (Ver Cuadro N°10).

Cuadro N°10: Ejecución Financiera de Obras, Bienes y Servicios que inciden en Ejercicios Futuros

Detalle	Obras	Bienes y Servicios
COMPARACIÓN LEY DE PRESUPUESTO -SIDIF	Es de señalar, que al comparar las obras incluidas en el Anexo al Art. 11 de la Ley 27.341, Ejercicio 2017 (335 obras, \$48.227 millones), con los datos expuestos en el Sidif (\$48.252 millones), surge una diferencia de \$25,2 millones en el Crédito Inicial, conformado por modificaciones a 4 obras.	Es de señalar, que al comparar la adquisición de bienes y servicios del Art. 11 de la Ley N°27.341 con los datos expuestos en el Sidif (\$122.048 millones-Crédito Inicial), surge una diferencia de \$16.357 millones. Los SAFs informaron que la diferencia entre lo ejecutado por los SAF y lo obrante en el SIDIF corresponde a otros gastos de los organismos.(Anexo 04-Cuenta de Inversión 2017)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	Para la ejecución de obras que inciden en ejercicios futuros se asignaron partidas presupuestarias por \$48.252 millones, que mediante una variación negativa del 19,07%, alcanzó un Crédito Vigente de \$39.049 millones y un Devengado de \$ 8.038 millones.	Para la ejecución de bienes y servicios que inciden en ejercicios futuros se asignaron partidas presupuestarias por \$ 122.048 millones, que mediante una variación del 13,40%, alcanzó un Crédito Vigente de \$138.405 millones.
Decreto 1013/2017		Se agregaron 4 actividades por un monto de \$215 millones
Decreto 595/2017		Se agregó una nueva actividad por \$2 millones.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Cabe señalar, que se alcanzó una ejecución presupuestaria del 20,58%. El 75,52%(253 obras) del total de obras (335 obras) con crédito vigente no tuvo ejecución financiera en el Ejercicio 2017.	Los bienes y servicios tuvieron una ejecución financiera del 76,23%(Devengado de \$ 105.507 millones.)

Fuente: Decreto 595/2017, 1013/2017 y Planilla anexa al art.11 ley 27.341

7.2.6. Proyectos Incluidos en la Muestra de Auditoría y los organismos recurrentes SAF 604- Dirección Nacional de Vialidad y SAF 342- SAF de Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) – Ejecución Física y Financiera

Los SAF que integraron la Muestra de auditoría 2017 se detallan a continuación, distinguiendo los pertenecientes a la Administración Central y a Organismos Descentralizados.



Auditoría General de la Nación

Cuadro N°11: Ejecución Financiera - Muestra de auditoría



Auditoría General de la Nación

SAF INCLUIDOS EN LA MUESTRA DE AUDITORIA									
DESCRIPCION			Detalle	\$Cred. Inicial	Modificaciones	%var	\$Cred. Vigente	\$Devengado	%Ejecución
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SAF 328-Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios)	Actividades	22.541.858	21.954.058	97,39%	44.495.916	16.801.568	37,76%	
		Proyectos-Obras	6.500.000	668.382.157	10282,80%	674.882.157	548.345.061	81,25%	
		IRD	29.041.858	690.336.215	2377,04%	719.378.073	565.146.629	78,56%	
		TC	19.654.217.020	-8.467.910.867	-43,08%	11.186.306.153	9.073.741.852	81,11%	
		INV PUBLICA	19.683.258.878	-7.777.574.652	-39,51%	11.905.684.226	9.638.888.482	80,96%	
	SAF 342-SAF de Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)	Actividades	3.038.798	-3.000.000	-98,72%	38.798		0,00%	
		Proyectos-Obras	267.720.681	-223.611.000	-83,52%	44.109.681	42.469.187	96,28%	
		IRD	270.759.479	-226.611.000	-83,69%	44.148.479	42.469.187	96,20%	
		TC	1.733.891.740	790.444.994	45,59%	2.524.336.734	2.524.336.229	100,00%	
		INV PUBLICA	2.004.651.219	563.833.994	28,13%	2.568.485.213	2.566.805.417	99,93%	
	SAF 350-Ministerio de Trabajo, Empleo Y Seguridad Social	Actividades	67.377.270	30.014.000	44,55%	97.391.270	68.136.490	69,96%	
		Proyectos-Obras	17.271.832	-17.271.832	-100,00%	0	0	0,00%	
		IRD	84.649.102	12.742.168	15,05%	97.391.270	68.136.490	69,96%	
		TC	177.442.854	27.139.000	15,29%	204.581.854	164.826.314	80,57%	
		INV PUBLICA	262.091.956	39.881.168	15,22%	301.973.124	232.962.804	77,15%	
	SAF 366-Ministerio de Modernización	Actividades	1.000.000	11.000.000	1100,00%	12.000.000	1.004.074	8,37%	
		Proyectos-Obras	999.475.231	-24.000.000	-2,40%	975.475.231	738.576.327	75,71%	
		IRD	1.000.475.231	-13.000.000	-1,30%	987.475.231	739.580.401	74,90%	
		TC		0					
		INV PUBLICA	1.000.475.231	-13.000.000	-1,30%	987.475.231	739.580.401	74,90%	
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	SAF 604-Dirección Nacional de Vialidad	Actividades	294.025.894	2.762.836	0,94%	296.788.730	201.626.315	67,94%	
		Proyectos-Obras	29.728.900.645	247.037.599	0,83%	29.975.938.244	29.786.266.501	99,37%	
		IRD	30.022.926.539	249.800.435	0,83%	30.272.726.974	29.987.892.815	99,06%	
		TC	5.318.273.461	964.376.838	18,13%	6.282.650.299	6.238.440.099	99,30%	
		INV PUBLICA	35.341.200.000	1.214.177.273	3,44%	36.555.377.273	36.226.332.914	99,10%	
	SAF 623-Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	Actividades	0	49.085.000		49.085.000	22.075.870	44,97%	
		Proyectos-Obras	72.296.413	101.264.057	140,07%	173.560.470	166.724.622	96,06%	
		IRD	72.296.413	150.349.057	207,96%	222.645.470	188.800.492	84,80%	
		TC		0					
		INV PUBLICA	72.296.413	150.349.057	207,96%	222.645.470	188.800.492	84,80%	
	SAF 904-Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica	Actividades	13.503.868	10.869.900	80,49%	24.373.768	19.834.357	81,38%	
		Proyectos-Obras		0					
		IRD	13.503.868	10.869.900	80,49%	24.373.768	19.834.357	81,38%	
		TC		0					
		INV PUBLICA	13.503.868	10.869.900	80,49%	24.373.768	19.834.357	81,38%	
SAF 906-Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán	Actividades	20.639.912	-1.092.300	-5,29%	19.547.612	13.194.101	67,50%		
	Proyectos-Obras	28.613.197	2.002.800	7,00%	30.615.997	29.245.641	95,52%		
	IRD	49.253.109	910.500	1,85%	50.163.609	42.439.742	84,60%		
	TC		0						
	INV PUBLICA	49.253.109	910.500	1,85%	50.163.609	42.439.742	84,60%		
TOTALES	Total SAF incluidos en la Muestra (SAF MUESTRA)	Actividades	422.127.600	121.593.494	28,80%	543.721.094	342.672.775	63,02%	
		Proyectos-Obras	31.120.777.999	753.803.781	2,42%	31.874.581.780	31.311.627.339	98,23%	
		IRD	31.542.905.599	875.397.275	2,78%	32.418.302.874	31.654.300.114	97,64%	
		TC	26.883.825.075	-6.685.950.035	-24,87%	20.197.875.040	18.001.344.494	89,12%	
		INV PUBLICA	58.426.730.674	-5.810.552.760	-9,95%	52.616.177.914	49.655.644.608	94,37%	
	Total SAF Administración Nacional (SAF ADM NAC)	Actividades	14.293.187.361	3.638.170.664	25,45%	17.931.358.025	14.351.996.208	80,04%	
		Proyectos-Obras	51.181.396.156	-3.314.896.194	-6,48%	47.866.499.962	45.098.470.602	94,22%	
		IRD	65.474.583.517	323.274.470	0,49%	65.797.857.987	59.450.466.810	90,35%	
		TC	133.842.896.516	-1.857.212.784	-1,39%	131.985.683.732	126.389.214.921	95,76%	
		INV PUBLICA	199.317.480.033	-1.533.938.314	-0,77%	197.783.541.719	185.839.681.731	93,96%	
	Total SAF MUESTRA/ SAF ADM NAC	Actividades	2,95%			3,03%	2,39%		
		Proyectos-Obras	60,80%			66,59%	69,43%		
		IRD	48,18%			49,27%	53,24%		
		TC	20,09%			15,30%	14,24%		
		INV PUBLICA	29,31%			26,60%	26,72%		

Montos expresados en pesos. Fuente: Base e-SIDIF

Es dable aclarar, que 7 SAF de la Muestra de auditoría contaron con proyectos de inversión para el presente ejercicio y el 66,59% (\$31.874 millones) del total del Crédito Vigente asignado a proyectos de la Administración Nacional (\$47.866 millones) es incluido en la Muestra de auditoría.



Auditoría General de la Nación

El SAF 904 no contó con proyectos sólo con actividades por un Crédito Inicial de \$13 millones, un Crédito Vigente de \$24 millones y un Devengado de \$19 millones, generando una ejecución financiera 81,38%.

A continuación, se analiza los aspectos formales de exposición y cumplimiento como, a su vez, el estado de ejecución de los proyectos de los SAF que integran la muestra de auditoría 2017, según su nivel institucional:

Administración Central

- **SAF 328-Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios).**
 - 1- Aspectos formales de exposición y cumplimiento**

Se constató la presentación fuera de los plazos establecidos por la DA 12/17, de los comprobantes electrónicos relativos a la programación, ejecución de los cuatro trimestres del ejercicio auditado.

El Cuadro de Cierre y el Cuadro V fueron presentados fuera del plazo dispuesto por la Resolución de Cierre 265/2017. En lo que respecta a la firma digital, analizando los comprobantes, se verificó que no se cumplimentó con las dos firmas digitales requeridas por la Circular 1/10 ONP. La persona que firmó los comprobantes de ejecución del segundo y tercer trimestre figura en estado eliminado en el Registro de Firmantes del e-SIDIF, no pudiendo observarse desde cuando tiene ese estado a los fines de analizar si estaba o no habilitado para suscribir los formularios.

Resulta oportuno destacar que el proyecto “Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio”, en el parametrizado del e-SIDIF aparece en el programa 32 pero en el formulario de cierre figura en el programa 74.

2- Ejecución físico-financiero

Los proyectos bajo la órbita del SAF 328, tuvieron un Crédito Inicial de \$6,5 millones y Vigente de \$674,872 millones con un Devengado de \$548 millones y una ejecución del 81,25%.

La ejecución física del proyecto Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio, perteneciente al Programa 74-Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, fue prevista por la DA dentro del Programa 32, no obstante, no se efectuó la programación correspondiente. El proyecto se encuentra en una profunda revisión y re-evaluación de su plan de obras quedando sus actividades



Auditoría General de la Nación

reducidas al mantenimiento mínimo, no contando ni con ejecución física ni financiera para el ejercicio estudiado.

A su vez, el porcentaje de avance físico acumulado al 2016 informado por la DA, no coincide con el expuesto en el formulario de Cierre respecto al proyecto Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner - Gobernador Jorge Cepernic (CDB N° 201401) perteneciente al programa citado anteriormente (Prog. 74). Este proyecto se financió con Adelantos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo por un Crédito vigente de \$19.545 y un Devengado de \$2.723 millones, con una ejecución financiera del 13,93%. (Ver Apartado 7.2.4. Programa De Inversiones Prioritarias-Adelantos)

La DA no informó el avance físico previsto en los proyectos del Programa 73-formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos (Construcción Gasoducto Centro II, Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata y la Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano – Patagónico). A su vez, detalló que existieron demoras en la formalización de los contratos y sus correspondientes pagos de anticipos y certificaciones, como también retrasos en la obtención de la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y permisos ante Vialidades Nacional y Provincial. Asimismo, se produjo un error en la confección del informe de ejecución en el 4° trimestre. (Ver Anexo N°27)

- **SAF 342-SAF de Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)**

1- Aspectos formales de exposición y cumplimiento

Se verificó la presentación fuera del plazo establecido por la DA 12/17, de los comprobantes electrónicos relativos a la programación y ejecución de los cuatro trimestres del ejercicio auditado.

En lo que respecta a la firma digital, no se cumplió con lo dispuesto por la Circular 1/10, evidenciando la línea de acción tendiente a la flexibilización de dicho requisito.

La programación y ejecución del primer trimestre fue firmado por una persona que figura en el Registro de Firmante en estado eliminado, se advierte que dicha herramienta no brinda información respecto de la fecha en que se produce el cambio de estado. Asimismo, la ejecución del segundo y tercer trimestre fueron firmados por una persona que figura dada de alta con posterioridad a la fecha en que se presentaron los formularios.



Auditoría General de la Nación

2- Ejecución físico-financiero

Los proyectos bajo la órbita del SAF 342, tuvieron un Crédito Inicial de \$267 millones, Vigente de \$44 millones y un Devengado de \$42 millones con una ejecución financiera del 96,28%. (Ver Anexo N°28).

El Proyecto 1- Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR), correspondiente al PG.39- Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR), contó con 3 obras, contando con un Crédito Inicial \$6,6 millones, que sufrió una variación del 100%.

A su vez, el programa 44- Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF N°7706-AC) se le asignó un Crédito Inicial de \$261 millones, con una reducción de \$217 millones, alcanzando un Crédito Vigente de \$44 millones. A su vez, contó con 6 proyectos con un Devengado de \$42 millones. De los cuales sólo 3 tuvieron una ejecución superior al 90% financieramente, debido a que 2 proyectos se dejaron sin asignación de crédito mediante una modificación presupuestaria. Existieron Demoras en la adjudicación de la obra, demoras en los procesos licitatorios e interferencias en la traza que obligó a gestionar una adenda al proyecto original.

Cabe señalar, que la DA no especificó la ejecución física acumulada al 2016 ni la programada para el ejercicio.

• SAF 350-Ministerio de Trabajo, Empleo Y Seguridad Social

1- Aspectos formales de exposición y cumplimiento

Se verificó la presentación fuera de los plazos establecidos por la DA 12/17, de los comprobantes electrónicos relativos a la programación y ejecución correspondientes de los cuatro trimestres del ejercicio auditado.

No se presentaron dentro del plazo establecido por la Resolución de Cierre 265/17 SH, el Cuadro I – Cierre de la ejecución Anual de Mediciones Físicas- ni el Cuadro V - Informaciones y Comentarios complementarios-.

Del análisis de los comprobantes, surge la falta de cumplimiento de las firmas requeridas por la Circular 1/10 ONP. A su vez, la programación y la ejecución de los cuatro trimestres fue firmada por una persona que en el registro de firmantes aparece en estado eliminado. El Registro de Firmantes no brinda una información certera sobre la fecha en que se produjo el cambio de estado.



Auditoría General de la Nación

Corresponde señalar que los proyectos programados no tuvieron ejecución.

2- Ejecución físico-financiero

Los proyectos bajo la órbita del SAF 350, tuvieron un Crédito Inicial de \$17 millones, que mediante una modificación presupuestaria tuvieron una disminución del 100% del crédito. A su vez, los 6 proyectos no tuvieron ejecución física, entre los motivos informados en la Cuenta de Inversión figuran por decisión de las autoridades, readecuación de pliegos de obras públicas respecto a la normativa vigente.

El porcentaje acumulado al 2016 informado en la DA no coincidió con el expuesto en el formulario de Cierre. (Ver Anexo N°29)

- **SAF 366-Ministerio de Modernización**

1- Aspectos formales de exposición y cumplimiento

Se verificó la presentación fuera del plazo establecido por la DA 12/17, de los comprobantes electrónicos relativos a la programación y ejecución de los cuatro trimestres del ejercicio auditado.

No se presentaron dentro del plazo establecido por la Resolución 265/17 SH, el Cuadro I – Cierre de la ejecución Anual de Mediciones Físicas- y el Cuadro V.

En lo que respecta a la firma digital, no se cumplió con lo dispuesto por la Circular 1/10, evidenciando la línea de acción tendiente a la flexibilización de dicho requisito.

2- Ejecución físico-financiero

Los proyectos bajo la órbita del SAF 366, tuvieron un Crédito Inicial de \$999 millones, con un Crédito Vigente de \$975 millones y un Devengado de \$738 millones, con una ejecución financiera del 75,71%.

Se conformó de 8 proyectos, los cuales tuvieron una ejecución física superior al 59%. (Ver Anexo N°30)

- **SAF 604-Dirección Nacional de Vialidad**

1- Aspectos formales de exposición y cumplimiento



Auditoría General de la Nación

Se constató la presentación fuera de los plazos establecidos por la DA 12/17, de los comprobantes electrónicos relativos a la programación y ejecución correspondiente a los tres primeros trimestres del ejercicio auditado. La ejecución del cuarto trimestre fue presentada antes de finalizar el mismo.

El Cuadros I - Cierre de la Ejecución Anual de Mediciones Físicas y el Cuadro V - Informaciones y Comentarios Complementarios- se presentaron fuera de los plazos establecidos por la Resolución 265/17 SH.

En lo que atañe a la firma digital, no se cumplió con lo dispuesto por la Circular 1/10, evidenciando la línea de acción tendiente a la flexibilización de dicho requisito. Se debe exponer que en el Registro de Firmantes uno de los que suscribe los formularios tiene fecha de alta el 28/03/17 pero su aceptación es un año después 16/06/18. Con lo cual la firma de los formularios realizada entre estas dos fechas, carecía de vigencia. Esta auditoría advierte que la herramienta Registro de Firmantes es sujeta a constantes modificaciones, no permitiendo tener certeza si la persona que suscribe los comprobantes tiene estado autorizado.

2- Ejecución físico-financiero

Los proyectos bajo la órbita del SAF 604, tuvieron un Crédito Inicial de \$ 29.728 millones, con un Crédito Vigente de \$29.975 millones y un Devengado de \$29.786 millones, con una ejecución financiera del 99,37%.

Los proyectos de inversión comprendieron 609 obras, contando con un Devengado de \$29.786 millones. (Ver Anexo N°31).

La cantidad de obras expuestas en la Cuenta de Inversión 2017 difirió en 5 con la informada en el e-SIDIF, con un Crédito Vigente \$ 12.388.294 y un Devengado de \$12.388.291, de acuerdo al Cuadro N°12.



Auditoría General de la Nación

Cuadro N°12: SAF 604 Diferencias entre la Cuenta de Inversión y el e Sidif

Pg	Programa Desc.	Sp	Subprograma Desc.	Py	Proyecto Desc.	Ob	Obra Desc.	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido
37	Infraestructura en Concesiones Viales	0		4	Autovía Mar de Plata - Balcarce - 2° tramo - Rnn 226 km 317- km	51	Autovía Mar de Plata - Balcarce - 2° tramo - Rnn 226 km 317- km	0	2.807.494	2.807.494
TOTAL PROGRAMA 37									2.807.494	2.807.494
26	Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento	2	CREMA II (Préstamo 4295)	69	Ruta Nacional N°35- Malla 116 b	51	Ruta Nacional N°35- Malla 116 b	0	6.650.132	6.650.131
26	Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento	4	CREMA IV	11	Sist.c.re.ma. Fase2, malla 501 Ruta Nac. N°14, tramo: emp. Ruta Nac. N°117- emp Ruta PROV. N°155, Ruta Nac. N°122, tramo: emp Ruta Nac N°14- Yapeyú y Ruta Nac N°123, tramo: k, 139,00 emp. Ruta Nac. N°14 Prov. Corrientes	51	Sist.c.re.ma. Fase2, malla 501 Ruta Nac. N°14, tramo: emp. Ruta Nac. N°117- emp Ruta PROV. N°155, Ruta Nac. N°122, tramo: emp Ruta Nac N°14- Yapeyú y Ruta Nac N°123, tramo: k, 139,00 emp. Ruta Nac.	0	706.378	706.378
TOTAL PROGRAMA 26									7.356.510	7.356.509
16	Mantenimiento	4	Señalamiento	10	Señalamiento Horizontal Zona Sur	51	Señalamiento Horizontal Zona Sur	0	316.901	316.900
16	Mantenimiento	8	Obras de Conservación Mejorativas - Fase I	55	Ruta Nacional N°119 - Empalme Ruta Nacional N°14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal Km.44,04 - Sección II - Km.44,04 - Km. 70,61	51	Ruta Nacional N°119 - Empalme Ruta Nacional N°14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal Km.44,04 - Sección II - Km.44,04 - Km. 70,61	0	1.907.389	1.907.388
TOTAL PROGRAMA 16									2.224.290	2.224.289
A-TOTAL PROYECTOS-DIFERENCIAS ENTRE LA CUENTA DE INVERSIÓN Y EL SIDIF									12.388.294	12.388.291
B-TOTAL PROYECTOS-TOTAL CUENTA DE INVERSIÓN 2017								29.728.900.645	29.963.549.950	29.773.878.062
A+B TOTAL PROYECTOS SIDIF								29.728.900.645	29.975.938.244	29.786.266.501

Montos expresados en pesos. Fuente: Base e-SIDIF.

A pesar de la gran participación en el Crédito Vigente de la IRD, el SAF 604-DNV fue el organismo con mayor cantidad de obras sin ejecución financiera, el 46,01% (283 obras, \$10.370 millones Crédito Inicial, \$227 millones Crédito Vigente), debido a la reasignación de créditos en determinadas obras. (Ver Apartado 7.2.3.7.1. Inversión Real Directa –Ejecución)

Del total de 615 obras del SAF 604, el 54,63%(336 obras) no tuvo ejecución física durante el ejercicio, y el 43,74% (269 obras) contó con un avance físico inferior al 100%, según lo expuesto en el Ver Anexo III.1 de la Cuenta de Inversión (Cuadro N°13).

Cuadro N°13: Avance Físico y Financiero de las Obras del SAF 604

Avance Físico	Q	%	Ejecución Financiera					
			Crédito Inicial	Modificación	%var	Crédito Vigente	Devengado	%Ejecución
Sin Ejecución	336	54,63%	10.558.638,58	-9.621.634,88	-91,13%	937.003,71	705.321,02	75,27%
<100%	269	43,74%	18.220.003,07	8.675.234,16	47,61%	26.895.237,23	27.006.037,98	100,41%
Al 100%	10	1,63%	950.259,00	1.193.438,32	125,59%	2.143.697,31	2.074.907,50	96,79%
>100%	0	0,00%						
Totales	615	100,00%	29.728.900,65	247.037,60	0,83%	29.975.938,24	29.786.266,50	99,37%

Expresados en miles. Q: Cantidad de obras conforme ejecución física



Auditoría General de la Nación

Del total de obras sin ejecución física (336 obras), 44,35% (149 obras) se encontraba al cierre del ejercicio pendiente de licitación (Cuadro N°14).

A su vez, en el gráfico N°8, se analiza cómo se ha reducido el porcentaje de obras sin ejecución física desde el ejercicio 2015 (81,5%).

Es de destacar, que tanto, el Sp. 3-Py 57-Ruta Nacional N° 52 - Ruta Nacional N°40-Jujuy Convenio 15 y Sp.4-Py 10-Señalamiento Horizontal Zona Sur, pertenecientes al Pg. 16, se encontraron sin información en el estado de obra como en tipo de obra respectivamente.

Cabe señalar, que del total de obras sin ejecución física el 47,05%(158) correspondieron a nuevas obras, respecto al tipo de obra.

Cuadro N°14 y N°15: SAF 604-DNV-Estado y evolución de las obras sin Ejecución Física

Código	Estado	Q	%	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/2017	Devengado 31/12/2017
0	A Licitar	149	44,35%	6.839.443	58.937	85.317
1	Publicada	12	3,57%	275.853	0	0
2	Licitada	18	5,36%	1.351.539	0	0
3	Adjudicada	3	0,89%	165.210	0	0
4	Contratada	4	1,19%	428.650	28.351	3.581
5	Replanteada	0	0,00%	0	0	0
6	En Ejecucion	6	1,79%	314.426	95.448	38.853
7	Finalizada Sin R.P.	57	16,96%	441.468	419.164	415.787
8	Finalizada Con R.P.	68	20,24%	57.317	79.429	102.957
9	Paralizada	4	1,19%	95.337	201.092	6.876
10	Rescindida	3	0,89%	137.686	97	97
11	Desestimada	0	0,00%	0	0	0
12	Eliminada	0	0,00%	0	0	0
13	A Reprogramar	0	0,00%	0	0	0
14	Neutralizada	11	3,27%	451.709	36.920	34.289
15	Preadjudicada	0	0,00%	0	0	0
16	Suspendida	0	0,00%	0	0	0
	Sin Informacion	1	0,30%		17.565	17.565
Total Obras sin Ejecución		336	100,00%	10.558.639	937.004	705.321

Código	Tipo de Obra	Q	%	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/2017	Devengado 31/12/2017
5	Reconstrucciones	35	10,42%	263.770	69.609	69.491
8	Obras Nuevas	158	47,02%	5.878.148	542.524	340.638
11	Mantenimiento	47	13,99%	1.550.773	97.182	97.182
12	Señalamiento	9	2,68%	108.899	76	76
13	Rehabilitación y Mantenimiento	50	14,88%	1.541.501	96.262	90.783
14	Global	1	0,30%	1.725	0	0
17	Obras de Seguridad	21	6,25%	340.084	2.308	2.308
18	Obras en Circuitos Turísticos	0	0,00%	0	0	0
Aumento de Capacidad en						
20	Concesiones Viales	1	0,30%	0	2.807	2.807
21	Seguridad en Concesiones Viales	6	1,79%	193.611	61.616	95.077
Obras Menores en Concesiones						
22	Viales	7	2,08%	680.127	64.302	6.642
23	Sistema de Transporte Inteligente	0	0,00%	0	0	0
	Sin Información	1	0,30%		317	317
Total Obras sin Ejecución		336	100,00%	10.558.639	937.004	705.321

Expresados en miles. Fuente: Cuenta de Inversión 2017 e-SIDIF+Subsistema "e-PEF". Informes de Auditoría Ejercicios anteriores.
DNV: Dirección Nacional de Vialidad RP: Reprogramación

• SAF 623-Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

1- Aspectos formales de exposición y cumplimiento

Los comprobantes electrónicos relativos a la ejecución del primer y tercer trimestre se presentaron fuera de los plazos establecidos por la DA 12/17.



Auditoría General de la Nación

Respecto de la firma digital se observó que dos de los firmantes figura en estado eliminado en el Registro de Firmantes, no constando la fecha en que se produjo el cambio de estado.

2- Ejecución físico-financiero

El SAF 623 contó con un solo proyecto con un Crédito Inicial de \$72 millones, un Crédito Vigente de \$173 millones y un Devengado de \$166 millones, generando una ejecución financiera y física superior al 95%. (Ver Anexo N°32).

El Crédito Presupuestario se incrementó en un 140,06%, conforme el DNU N° 1013/2017, en virtud de que no se contaba con el Aporte Local pertinente para hacer frente a los gastos comprometidos teniendo en cuenta que la obra, Construcción y Equipamiento del Laboratorio Vegetal D., se encontraba con un avance físico superior al 90%.

- **SAF 906-Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán**

1-Aspectos formales de exposición y cumplimiento

Se constató la presentación fuera del plazo establecido por la DA 12/17, los comprobantes electrónicos relativos a la programación y ejecución del primer trimestre y reprogramación del tercer trimestre del ejercicio auditado.

En cuanto a la firma digital los primeros comprobantes fueron firmados por una persona que no figura en el Registro de Firmantes. A su vez, el resto de los comprobantes fueron suscriptos por una persona cuyo estado es eliminado, no pudiéndose constarse cuando se produjo el cambio de estado.

2- Ejecución físico-financiero

Los proyectos bajo la órbita del SAF 906, tuvieron un Crédito Inicial de \$28 millones, con un Crédito Vigente de \$30 millones y un Devengado de \$29 millones, con una ejecución financiera del 95,52%.

Se conformó de 21 proyectos, los cuales tuvieron una ejecución física superior al 59%. (Ver Anexo N°33)

8. OPINIÓN



Auditoría General de la Nación

Sobre la base de la tarea realizada, detallada en el apartado 6. Alcance, consideramos que la información cumple, en todos sus aspectos significativos, con los criterios aplicados a los registros de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión pública que surgen de la Cuenta de Inversión 2017, salvo por lo expresado en el Apartado 7.1.1. Conformación del Plan Nacional de Inversiones Públicas, Apartado 7.1.3. Análisis de Proyectos de Inversión de la Inversión Real Directa y en el Apartado 7.2.4. Programa De Inversiones Prioritarias (PIP), donde se señalan incumplimientos a lo dispuesto en los artículos 5 inciso f), 8 y 10 de la Ley 24.354 de Inversión Pública, y teniendo en cuenta que su incidencia no nos ha impedido alcanzar el objetivo del presente informe, basados en el e SIDIF y en su subsistema e-PEF (Evaluación física de programas y proyectos).

9. PÁRRAFO DE ÉNFASIS SOBRE EL OBJETO DE REVISIÓN

A continuación, se enumeran circunstancias que, si bien no modifican la opinión del apartado 8., se exponen para una más adecuada interpretación de la información objetivo de presente control.

Respecto de la Conformación del Plan Nacional de Inversiones Públicas, el BAPIN no cumple con los objetivos previstos como una herramienta útil de ejecución y control, toda vez que no registra el grado de avance físico de los proyectos de inversión, situación que impide realizar un correcto seguimiento de los proyectos y un adecuado control sobre la información brindada por los organismos. Situación recurrente con relación al ejercicio anterior.

A su vez, con relación a la firma digital se señala la falta de cumplimiento de la Circular 1/2010 ONP y la Resolución 265/17 SH por parte de los SAF incluidos en la muestra de auditoría, respecto a lo detallado en el apartado 7.2.6. Proyectos incluidos en la Muestra de Auditoría.

Del análisis efectuado al Programa Fondo Federal Solidario, no se han llevado a cabo las formalidades expuestas en la Resolución Conjunta 184/5/639, según lo expuesto en el apartado 7.2.3.7.2.2.2.

Con relación a las TC sin Discriminar, cuyo Crédito Vigente ascendió a \$17.125, alcanzaron el 12,97% del total del Crédito Vigente de las TC, de acuerdo al Apartado 7.2.3.5.1.



Auditoría General de la Nación

Respecto a los Adelantos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo, se continuó con la modalidad de ejercicios anteriores, sobre la exposición de los mismos por debajo de la línea presupuestaria, situación que genera una subestimación del Resultado Económico-Financiero del Ejercicio, de acuerdo a lo analizado en el apartado 7.2.4. Programa de Inversiones Prioritarias (PIP).

Las obras que conformaron la Inversión Real Directa no tuvieron ejecución financiera en un 48,22%, que representaron un 2,74% del Crédito Vigente para el ejercicio 2017. La cantidad de obras sin ejecución financiera disminuyó con respecto al ejercicio anterior en un 50,18%, de acuerdo a lo indicado en el apartado 7.2.3.7.1. Ejecución presupuestaria de la Inversión Pública.

Con relación a la ejecución financiera de obras que inciden en ejercicios futuros, el 75,52% del total de obras incluidas en el Art.11 de la Ley de Presupuesto no tuvieron ejecución financiera en el ejercicio 2017.

Por último, respecto al SAF 604- Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el 54,63% de las obras que integran dicho SAF no tuvo ejecución física, y el 43,74% contó con un avance físico inferior al 100%, ejecutando la totalidad de su crédito presupuestario, según al apartado 7.2.6. Proyectos Incluidos en la Muestra De Auditoría – Ejecución Física y Financiera. Situación similar ocurrió con el SAF 325- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018



Auditoría General de la Nación

Anexo N°1: Contratos de Participación Público-Privada (Ley 27.328)

Contratos de Participación Público-Privada (Ley 27.328)

La Comisión estableció su estructura interna y dictó su propio reglamento de funcionamiento, teniendo como misión efectuar el seguimiento de los proyectos desarrollados bajo contratos de participación público-privada, conforme las atribuciones que le otorgan la ley N°27.328 y la ley N°27.437.

La Subsecretaría de Participación Público Privada debe incluir en su informe anual una descripción de los riesgos y obligaciones asumidas por parte de los Entes Contratantes, los fideicomisos y otros órganos y entes del Sector Público Nacional. A su vez, dicha secretaría debe solicitar al Ministerio De Hacienda que emita un informe del impacto fiscal de los compromisos asumidos, respecto a lo emitido por los Entes Contratantes, el cual será presentado ante al Congreso de la Nación por medio de la Subsecretaría de Participación Público Privada.

Cabe señalar que, la subsecretaría tiene competencia para solicitar a las autoridades Convocantes y Contratantes toda la información y documentación que considere necesaria, centralizándola.

- **Autoridad convocante y/o contratante**

Según la normativa vigente, se podrán convocar para presentar proyectos de PPP los órganos y entes de la Administración Nacional, las empresas y sociedades del estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta, entes públicos controlados por el Estado nacional y los fondos fiduciarios del Estado nacional.

- **Oferentes y/o contratistas**

Pueden ser los sujetos privados o públicos, incluidos dentro de éstos últimos, los entes u organismos en los que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los municipios tengan participación.

- **Objeto**

El objeto del régimen de los contratos de PPP es el desarrollo de proyectos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica.

Están excluidos de los posibles proyectos de PPP, los contratos cuyo único objeto sea la provisión de mano de obra, el suministro y provisión de bienes y la construcción o ejecución de obras financiadas sustancialmente con fondos del Tesoro Nacional.



Auditoría General de la Nación

- **Informe ambiental.**

El Ministerio de Ambiente deberá formular las consideraciones que estime pertinentes en relación al proyecto de PPP.

- **Control de la ejecución del contrato**

El cumplimiento de los contratos que se celebren en los términos de la presente ley estará sujeto al control de la contratante o del órgano creado con esa finalidad en la respectiva jurisdicción.

La reglamentación o los pliegos podrán prever la posibilidad de acudir a auditores externos con suficiente idoneidad técnica, independencia e imparcialidad y comprobada trayectoria nacional o internacional para controlar la ejecución de los proyectos.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°2 Demanda Satisfecha

Nro de BAPIN	Denominación	Estado	Apertura Programática	Monto 2017	Monto Trienio	Monto PNP	Diferencia entre PNP-DEMANDA
63352	Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I Provincia del Neuquén	En Ejecución	30.325.73.00.47.00	5.263.565.712	13.943.703.897	6.867.316	- 5.256.698.396
47454	Diseño, construcción y puesta en marcha de un reactor nuclear argentino multipropósito (RA-10) (Prog. 20 - Proy 22 - Obra 51)	En Ejecución	58.105.20.00.22.00	1.682.316.018	2.820.032.677	74.171.383	- 1.608.144.635
53429	Obras de Seguridad en RNN° 34. Corredor Vial IV	En Ejecución	57.604.40.04.01.00	1.207.994.630	2.325.356.557	5.982.388	- 1.202.012.242
63635	CONSTRUCCION SISTEMA DE OMNIBUS DE TRANSITO EN RN3 DE VIRREY DEL PINO (LA MATANZA) A PLAZA DE LOS VIRREYES (CABA)	En Ejecución	57.327.61.00.01.00	1.020.284.415	1.020.284.415	3.000.000	- 1.017.284.415
30865	DISEÑO, CONSTRUCCION, LANZAMIENTO Y OPERACION DE DOS SATELITES DE ORBITA POLAR- MISION SACOM 1 A/B -	En Ejecución	71.106.16.00.02.00	946.745.897	1.659.262.242	2.375.000	- 944.370.897
62808	Rehabilitación y Mejoramiento del Ramal C15 desde Chel Cornejo a Pocitos	En Ejecución	57.327.62.00.17.00	494.483.745	826.722.893	7.660.095	- 486.823.650
44570	ADQUISICION DE EQUIPAMENTOS VARIOS PARA LA MISION SABIAMAR (SAC-E)	En Ejecución	71.106.16.00.02.00	404.319.000	917.123.773	97.428.723	- 306.890.277
62309	Adquisición de 2 buques de investigación oceanográfico-pesquero	En Ejecución	52.607.16.00.00.06	366.401.600	366.401.600	2.038.882	- 364.362.718
48819	Repavimentación de Calzada. RNN° 7. Tramo: Lte. Córdoba-San Luis y Lte. San Luis-Mendoza. Secc.: Acc. a Fraga (km 730,55) San Luis (km 865,58). San Luis.	En Ejecución	57.604.22.09.05.00	327.494.545	327.494.545	8.500.139	- 318.994.406
31157	Construcción de un inyector satelital de cargas útiles livianas	En Ejecución	71.106.17.00.01.00	326.116.473	800.064.405	333.805.725	- 7.689.252
57069	Duplicación de calzada. RNN° 8. Autopista Pilar - Pergamino - Tramo IV: Arroyo Cahuáné (km 143,10) - Arroyo Helves (km 143,10). Provincia de Buenos Aires.	En Ejecución	57.604.22.14.74.00	297.582.002	371.977.502	2.984.812	- 294.597.190
51934	Duplicación de Calzada. RNN° 8. Autopista Pilar - Pergamino - Tramo III: Arroyo Gómez (km 116,99) - Arroyo Cahuáné (km 143,10). Provincia de Buenos Aires.	En Ejecución	57.604.22.14.74.00	287.482.270	359.352.837	56.884.818	- 230.597.452
48855	CONSTRUCCION DE CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL CUYO	En Ejecución	40.332.18.00.44.00	262.026.322	885.224.060	48.623.370	- 213.402.962
60902	Construcción de Redes Colectoras y Planta Depuradora - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán	En Ejecución	30.613.20.03.69.00	261.494.930	715.204.177	2.664.310	- 258.830.620
32064	CONSTRUCCION COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE CONDENA II - AGOTE- MERCEDES- BUENOS AIRES	En Ejecución	40.332.18.00.10.00	254.055.583	254.055.583	120.000.000	- 134.055.583
45815	Ampliación de capacidad y construcción de colectoras en la RNN° 40. Tramo: Mendoza - Mendoza. Secc.: RN N° 2 (calle Azucénaga) - RN N° 7 (Cándor). Mendoza.	En Ejecución	57.604.22.13.67.00	252.767.455	252.767.455	39.436.911	- 213.330.544
48464	Construcción de la RNN° 75. Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauces. Sección: km 10,76 - km 16,82. provincia de La Rioja.	En Ejecución	57.604.22.13.86.00	250.518.308	692.807.500	13.788.172	- 236.730.136
42580	REPARACION PILOTES MACIZOS MUELLE ALMIRANTE STORNI CHUBUT	En Ejecución	57.327.91.00.35.00	250.000.000	400.000.000	68.816.865	- 181.183.135
37309	Rehabilitación y Mantenimiento del Puente Gral. Belgrano en la RNN° 16. Chaco	En Ejecución	57.604.22.09.67.00	247.742.353	247.742.353	3.498.100	- 244.244.253
42176	Construcción de la RNN° A008 - Tramo: Av. Circunvalación de Rosario. (Río Paraná-Emp. Av Belgrano) km 1,310 - km 29,395 - Provincia de Santa Fe	En Ejecución	57.604.22.12.39.00	240.932.400	240.932.400	257.587	- 240.674.813
46803	Construcción de ruta. RNN° 40. Tramo: RN N° 144 (B Sosneado) - RN N° 143 (Pareditas) - Sección I: km 0,00 (B Sosneado) - km 71,90. Provincia Mendoza.	En Ejecución	57.604.22.13.75.00	239.442.141	558.884.075	260.836.170	- 21.394.029
68430	Construcción de un Centro de Transbordo Multimodal en la Estación de la Av. Saenz del ROCC Belgrano Sur - CABA	En Ejecución	57.327.61.00.01.00	236.828.063	631.453.873	591.347	- 236.236.716
71122	Rehabilitación de Planta de Desagües Cloacales - Las Catonas Moreno - Buenos Aires (PAYS II)	En Ejecución	30.613.20.03.80.00	223.074.761	284.138.624	269.465	- 222.805.296
71123	Rehabilitación de Planta de Desagües Cloacales - Ferrari Merlo - Buenos Aires (PAYS II)	En Ejecución	30.613.20.03.81.00	223.074.761	284.138.624	143.126.341	- 79.948.420
71124	Rehabilitación de Planta de Desagües Cloacales - Bella Vista - Buenos Aires (PAYS II)	En Ejecución	30.613.20.03.82.00	223.074.761	284.138.624	24.644.543	- 198.430.218
58675	Obra de mantenimiento modular en las RN N° 12-16 del Corredor Vial N° 6. Provincias de Corrientes, Misiones y Chaco.	En Ejecución	57.604.40.06.03.00	212.366.333	212.366.333	32.326.762	- 180.039.571
47925	Construcción de la RNN° 22. Tramo: Rottier - Arroyito. Neuquén	En Ejecución	57.604.22.13.80.00	192.451.636	192.451.636	129.756.640	- 62.694.996
61619	Captaçión y Acueductos agua cruda y agua potable - Jujuy	En Ejecución	30.613.20.02.33.00	176.376.530	300.967.618	46.601.622	- 129.774.908
51589	Construcción de la RNN° 18. Tramo IV: Arroyo Sandoval (Prog. 166+000) - Inters. RNN° 14 (Prog. 227+882). Provincia de Entre Ríos.	En Ejecución	57.604.22.14.32.00	172.604.727	740.418.909	19.300.000	- 153.304.727
51936	Construcción RNN° 8. Tramo 7. Sección: km 213,76 - km 237,50. Provincia de Buenos Aires.	En Ejecución	57.604.22.14.76.00	170.131.636	773.059.455	101.080.606	- 69.051.030
63980	Construcción del Lanzador Tronador II A	En Ejecución	71.106.17.00.05.00	170.000.000	842.000.000	1.000.000	- 169.000.000
41684	Ampliación de Calzada. RNN° 22. Tramo: Chichinales - Cipolletti. Sección IV: Acc. A. J. J. Gómez - Acc. A. Fernández Oro. Provincia de Río Negro	En Ejecución	57.604.22.10.08.00	167.528.800	367.528.800	116.402.365	- 51.126.435
51597	Readequación urbana en la RNN° 11. Tramo: Autovía Emp. RN N° 89 - Acc. Margarita Belén. Sección: Cementerio Parque Jazmín (km 1000) - Autódromo (km 1010) (Paso por Resistencia). Provincia del Chaco.	En Ejecución	57.604.22.14.60.00	165.011.397	799.221.754	115.212.270	- 49.799.127
58673	Obra de mantenimiento modular en las RN N° 11: A009 - 9Au - Au Ros/Cda - A012 - 193, del Corredor Vial N° 5. Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe	En Ejecución	57.604.40.05.03.00	156.445.333	156.445.333	7.502.180	- 148.943.153
37241	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 308 en la RNN° 150 y 76; Tramo: Malla 308; Sección: Patquiza (km 0,13) - Pique. Provincia Ichigualaño / Emp. RNN° 150 - Emp. RNN° 40. La Rioja y San Juan.	En Ejecución	57.604.26.04.54.00	153.725.474	153.725.474	116.423.908	- 37.301.566
58671	Obras de mantenimiento modular en la RN N° 7 - Corredor Vial N° 3. Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza	En Ejecución	57.604.40.03.03.00	153.042.000	153.042.000	3.774.223	- 149.267.777
53446	Obras de Refuerzo de Infraestructura en RNN° 9- Corredor Vial V	En Ejecución	57.604.40.05.02.00	152.707.720	200.572.028	158.534.865	- 5.827.145
58672	Obras de mantenimiento modular en las RNN° 18-19-34-38 del Corredor Vial N° IV. Provincias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.	En Ejecución	57.604.40.04.03.00	148.912.300	181.984.256	2.214.930	- 146.697.370
51524	Construcción Complejo Federal Penitenciario. Córdoba.	Factibilidad	40.332.18.00.49.00	148.204.227	529.200.809	3.214.988	- 144.989.239
51585	Construcción de la RNN° 18. Tramo: Intersección RNN° 12 - Intersección RNN° 32 - Secc. I. Provincia de Entre Ríos.	En Ejecución	57.604.22.14.29.00	146.167.636	614.670.546	9.489.860	- 136.677.776
63878	COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL PARA JOVENES ADULTOS - MARCOS PAZ - Pcia. de Buenos Aires	Factibilidad	40.332.18.00.83.00	144.180.000	675.000.000	1.949.495	- 142.230.505
71096	Construcción de Sistema de Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires	En Ejecución	30.613.20.02.37.00	139.171.110	610.796.050	21.760.170	- 117.410.940
47726	Pavimentación. RNN° 23. Valcheta-Ricanieyue; Sección: Maquichao-Ing Jacobacci km 341,01 - km 414,50. Provincia Río Negro.	En Ejecución	57.604.22.13.74.00	136.140.667	136.140.667	8.064.760	- 128.075.907
50965	Pavimentación. RNN° 75. Tramo: Anguilán - Emp. RN N° 75. Secc. II: Km 21,600 - km 40,428. Provincia de La Rioja.	En Ejecución	57.604.22.14.36.00	135.362.364	671.449.454	45.000.000	- 90.362.364
48549	Construcción de la RNN° 23. Tramo: Ricanieyue Viejo - Emp. RNN° 40. Sección II. Río Negro.	En Ejecución	57.604.22.10.09.00	134.188.059	134.188.059	21.981.668	- 112.206.391
51367	Rehabilitación y Mantenimiento. Malla 303. RNN° 38. Tramo: Emp. RNN° 79 (Chamical) - Emp. RNN° 75 (La Rioja). Secc.: km 291,45 km 423,63. RNN° 74: Tramo: Emp. RNN° 38 - Prog. km 1120,70. Secc.: km 1085,44 - km 1120,70. Provincia de La Rioja.	En Ejecución	57.604.26.05.26.00	129.842.276	167.326.504	27.537.459	- 102.304.817
62025	Duplicación de calzada. RNN° 12. Tramo: Cerro Cora - San Ignacio. Sección: km 1368 (Cerro Cora) - km 1381 (Santa Ana). Provincia de Misiones.	En Ejecución	57.604.22.15.17.00	128.989.385	373.692.500	2.287.408	- 126.701.977
48915	Construcción de la RN N° 23. Tramo: Corralito - Ricanieyue Viejo. Provincia Río Negro	En Ejecución	57.604.22.03.86.00	127.868.667	127.868.667	20.563.200	- 107.305.467
58679	Obra de mantenimiento modular en las RN N° 8-36-33-A005 en el Corredor Vial N° 8. Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe	En Ejecución	57.604.40.08.03.00	127.052.333	127.052.333	3.574.075	- 123.478.258
55638	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 437 en la RN N° 38. Tramo: Lte. Catamarca/Tucumán - Emp. RN N° 9 (Ciudad de Tucumán). Provincia de Tucumán	Factibilidad	57.604.26.05.53.00	124.670.557	160.661.760	6.555.090	- 118.115.467
58669	Obra de mantenimiento modular en las RN N° 3-205-226-252 del Corredor Vial N° 1. Provincia de Buenos Aires.	En Ejecución	57.604.40.01.03.00	123.649.667	123.649.667	5.000.000	- 118.649.667
72682	Colocación de canchales y cercos perimetrales en pasos de frontera	Factibilidad	41.343.46.00.00.02	120.000.000	120.000.000	281.892	- 119.718.108
71129	Construcción de Sistema Agua Potable - Concordia - Entre Ríos (PAYS II)	En Ejecución	30.613.20.02.36.00	115.694.768	455.876.461	56.500	- 115.638.268

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDF y BAPIN III Respuesta a Nota N°83/2018-AG02



Auditoría General de la Nación

Anexo N°2 Demanda Satisfecha

Nro de BAPIN	Denominación	Estado	Apertura Programática	Monto 2017	Monto Trienio	Monto PNP	Diferencia entre PNP-DEMANDA
63352	Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I, Provincia del Neuquén	En Ejecución	30.325.73.00.47.00	5.263.565.712	13.943.703.897	6.867.316	- 5.256.698.396
47454	Diseño, construcción y puesta en marcha de un reactor nuclear argentino multipropósito (RA-10) (Prog. 20 - Proy 22 - Obra 51)	En Ejecución	58.105.20.00.22.00	1.682.316.018	2.820.032.677	74.171.383	- 1.608.144.635
53429	Obras de Seguridad en RNN° 34, Corredor Vial IV	En Ejecución	57.604.40.04.01.00	1.207.994.630	2.325.356.557	5.982.388	- 1.202.012.242
63635	CONSTRUCCION SISTEMA DE OMNIBUS DE TRANSITO EN RNS DE VIRREY DEL PINO (LA MATANZA) A PLAZA DE LOS VIRREYES (CABA)	En Ejecución	57.327.61.00.01.00	1.020.284.415	1.020.284.415	3.000.000	- 1.017.284.415
30865	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, LANZAMIENTO Y OPERACIÓN DE DOS SATÉLITES DE ÓRBITA POLAR, MISIÓN SAOCOM 1 A/B -	En Ejecución	71.106.16.00.02.00	946.745.897	1.659.262.242	2.375.000	- 944.370.897
62808	Rehabilitación y Mejoramiento del Ramal C15 desde Cnel Cornejo a Pocitos	En Ejecución	57.327.62.00.17.00	494.483.745	826.722.893	7.660.095	- 486.823.650
44570	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTOS VARIOS PARA LA MISIÓN SABIAMAR (SAC-E)	En Ejecución	71.106.16.00.02.00	404.319.000	917.123.773	97.428.723	- 306.890.277
62309	Adquisición de 2 buques de investigación oceanográfico-pesquera.	En Ejecución	52.607.16.00.00.06	366.401.600	366.401.600	2.038.882	- 364.362.718
48819	Repavimentación de Calzada, RNN° 7, Tramo: Lte. Córdoba-San Luis / Lte. San Luis-Mendoza. Secc.: Acc. a Fraga (km 730,55) - San Luis (km 865,58). San Luis.	En Ejecución	57.604.22.09.05.00	327.494.545	327.494.545	8.500.139	- 318.994.406
31157	Construcción de un inyector satelital de cargas útiles livianas	En Ejecución	71.106.17.00.01.00	326.116.473	800.064.405	333.805.725	- 7.689.252
57069	Duplicación de calzada, RNN° 8, Autopista Pilar - Pergamino - Tramo IV: Arroyo Cahuané (km 143,10) - Arroyo Helves (km 168,76). Provincia de Buenos Aires.	En Ejecución	57.604.22.14.74.00	297.582.002	371.977.502	2.984.812	- 294.597.190
51934	Duplicación de Calzada, RNN° 8, Autopista Pilar - Pergamino - Tramo III: Arroyo Gómez (km 116,99) - Arroyo Cahuané (km 143,10) - Provincia de Buenos Aires	En Ejecución	57.604.22.14.74.00	287.482.270	359.352.837	56.884.818	- 230.597.452
48855	CONSTRUCCION DE CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL CUYO	En Ejecución	40.332.18.00.44.00	262.026.322	885.224.060	48.623.370	- 213.402.952
60902	Construcción de Redes Colectoras y Planta Depuradora - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán	En Ejecución	30.613.20.03.69.00	261.494.930	715.204.177	2.664.310	- 258.830.620
32064	CONSTRUCCION COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE CONDENAS III - AGOTE- MERCEDES- BUENOS AIRES	En Ejecución	40.332.18.00.10.00	254.055.583	254.055.583	120.000.000	- 134.055.583
45815	Ampliación de capacidad y construcción de colectoras en la RNN° 40, Tramo: Tunuyán - Mendoza. Secc.: RPN° 2 (calle Azucénaga) - RN N° 7 (Cándor). Mendoza.	En Ejecución	57.604.22.13.67.00	252.767.455	252.767.455	39.436.911	- 213.330.544
48464	Construcción de la RNN° 75, Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauces. Sección: km 10,76 - km 16,82. provincia de La Rioja.	En Ejecución	57.604.22.13.86.00	250.518.308	692.807.500	13.788.172	- 236.730.136
42580	REPARACION PILOTES MACIZOS MUELLE ALMIRANTE STORNI-CHUBUT	En Ejecución	57.327.91.00.35.00	250.000.000	400.000.000	68.816.865	- 181.183.135
37309	Rehabilitación y Mantenimiento del Fuente Gral. Belgrano en la RNN° 16, Chaco	En Ejecución	57.604.22.09.67.00	247.742.353	247.742.353	3.498.100	- 244.244.253
42176	Construcción de la RNN° A008 - Tramo: Av. Circunvalación de Rosario. (Río Paraná-Emp. Av. Belgrano) km 1,310 - km 29,395 - Provincia de Santa Fe	En Ejecución	57.604.22.12.39.00	240.932.400	240.932.400	257.587	- 240.674.813
46803	Construcción de ruta, RNN° 40, Tramo: RN N° 144 (E Sosneado) - RN N° 143 (Pareditas) - Sección t. km 0,00 (E Sosneado) - km 71,90. Provincia Mendoza.	En Ejecución	57.604.22.13.75.00	239.442.141	558.884.075	260.836.170	- 21.394.029
68430	Construcción de un Centro de Transbordo Multimodal en la Estación de la Av. Saenz del FFCC Belgrano Sur - CABA	En Ejecución	57.327.61.00.01.00	236.828.063	631.453.873	591.347	- 236.236.716
71122	Rehabilitación de Planta de Desagües Cloacales - Las Catonas Moreno - Buenos Aires (PAYS II)	En Ejecución	30.613.20.03.80.00	223.074.761	284.138.624	269.465	- 222.805.296
71123	Rehabilitación de Planta de Desagües Cloacales - Ferrari Merlo - Buenos Aires (PAYS II)	En Ejecución	30.613.20.03.81.00	223.074.761	284.138.624	143.126.341	- 79.948.420
71124	Rehabilitación de Planta de Desagües Cloacales - Bella Vista - Buenos Aires (PAYS II)	En Ejecución	30.613.20.03.82.00	223.074.761	284.138.624	24.644.543	- 198.430.218
58675	Obra de mantenimiento modular en las RN N° 12-16 del Corredor Vial N° 6, Provincias de Corrientes, Misiones y Chaco.	En Ejecución	57.604.40.06.03.00	212.366.333	212.366.333	32.326.762	- 180.039.571
47925	Construcción de la RNN° 22, Tramo: Plottier - Arroyito. Neuquén.	En Ejecución	57.604.22.13.80.00	192.451.636	192.451.636	129.756.640	- 62.694.996
61619	Captación y Acueductos agua cruda y agua potable - Jujuy	En Ejecución	30.613.20.02.33.00	176.376.530	300.967.618	46.601.622	- 129.774.908
51589	Construcción de la RNN° 18, Tramo IV: Arroyo Sandoval (Prog. 166+000) - Inters. RNN° 14 (Prog. 227+882). Provincia de Entre Ríos.	En Ejecución	57.604.22.14.32.00	172.604.727	740.418.909	19.300.000	- 153.304.727
51936	Construcción RNN° 8, Tramo 7, Sección: km 213,76 - km 237,50. Provincia de Buenos Aires.	En Ejecución	57.604.22.14.76.00	170.131.636	773.059.455	101.080.606	- 69.051.030
63980	Construcción del Lanzador Tronador II A	En Ejecución	71.106.17.00.05.00	170.000.000	842.000.000	1.000.000	- 169.000.000
41684	Ampliación de Calzada, RNN° 22, Tramo: Chichinales - Cipolletti. Sección IV: Acc. A J. J. Gómez - Acc. A Fernandez Oro. Provincia de Río Negro	En Ejecución	57.604.22.10.08.00	167.528.800	367.528.800	116.402.365	- 51.126.435
51597	Readecuación urbana en la RNN° 11, Tramo: Autovía Emp. RN N° 89 - Acc. Margarita Belen. Sección: Cementerio Parque Jazmín (km 1000) - Autódromo (km 1010) (Paso por Resistencia). Provincia del Chaco.	En Ejecución	57.604.22.14.60.00	165.011.397	799.221.754	115.212.270	- 49.799.127
58673	Obra de mantenimiento modular en las RN N° 11- A009 - 9Au - Au Ros/Cba - A012 - 193, del Corredor Vial N° 5, Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.	En Ejecución	57.604.40.05.03.00	156.445.333	156.445.333	7.502.180	- 148.943.153
37241	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 308 en la RNN° 150 y 76, Tramo: Malla 308; Sección: Patagüa (km 0,13) - Pique. Provincia Ichigualasto / Emp. RNN° 150 - Emp. RNN° 40. La Rioja y San Juan.	En Ejecución	57.604.26.04.54.00	153.725.474	153.725.474	116.423.908	- 37.301.566
58671	Obras de mantenimiento modular en la RN N° 7 - Corredor Vial N° 3, Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.	En Ejecución	57.604.40.03.03.00	153.042.000	153.042.000	3.774.223	- 149.267.777
53446	Obras de Refuerzo de Infraestructura en RNN° 9- Corredor Vial V	En Ejecución	57.604.40.05.02.00	152.707.720	200.572.028	158.534.865	- 5.827.145
58672	Obras de mantenimiento modular en las RNN° 18-19-34-38 del Corredor Vial N° IV, Provincias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.	En Ejecución	57.604.40.04.03.00	148.912.300	181.984.256	2.214.930	- 146.697.370
51524	Construcción Complejo Federal Penitenciario, Córdoba.	Factibilidad	40.332.18.00.49.00	148.204.227	529.200.809	3.214.988	- 144.989.239
51585	Construcción de la RNN° 18, Tramo: Intersección RNN° 12 - Intersección RPN° 32, - Secc.: I, Provincia de Entre Ríos.	En Ejecución	57.604.22.14.29.00	146.167.636	614.670.546	9.489.860	- 136.677.776
63878	COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL PARA JOVENES ADULTOS - MARCOS PAZ - Pcia. de Buenos Aires	Factibilidad	40.332.18.00.83.00	144.180.000	675.000.000	1.949.495	- 142.230.505
71096	Construcción de Sistema de Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires	En Ejecución	30.613.20.02.37.00	139.171.110	610.796.050	21.760.170	- 117.410.940

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF y BAPIN III Respuesta a Nota N°83/2018-AG02



Auditoría General de la Nación

Anexo N°2 Demanda Satisfecha

Nro de BAPIN	Denominación	Estado	Apertura Programática	Monto 2017	Monto Trienio	Monto PNP	Diferencia entre PNP - DEMANDA
47726	Pavimentación. RNN° 23. Valcheta-Picaniyeu; Sección: Maquinchao-Ing Jacobacci km 341,01 - km 414,50. Provincia Río Negro.	En Ejecución	57.604.22.13.74.00	136.140.667	136.140.667	8.064.760	- 128.075.907
50965	Pavimentación. RNN° 73. Tramo: Anguinán - Emp. RN N° 75. Secc.II: Km 21,600 - km 40,428. Provincia de La Rioja.	En Ejecución	57.604.22.14.36.00	135.362.364	671.449.454	45.000.000	- 90.362.364
48549	Construcción de la RNN° 23. Tramo: Picaniyeu Viejo - Emp. RNN° 40. Sección II. Río Negro.	En Ejecución	57.604.22.10.09.00	134.188.059	134.188.059	21.981.668	- 112.206.391
51367	Rehabilitación y Mantenimiento. Malla 303. RNN° 38. Tramo: Emp. RNN° 79 (Chamical) - Emp. RNN° 75 (La Rioja). Secc: km 291,45 - km 423,63. RNN° 74: Tramo: Emp. RNN° 38 - Prog. km 1120,70. Secc: km 1085,44 - km 1120,70. Provincia de La Rioja.	En Ejecución	57.604.26.05.26.00	129.842.276	167.326.504	27.537.459	- 102.304.817
62025	Duplicación de calzada. RNN° 12. Tramo: Cerro Cora - San Ignacio. Sección: km 1368 (Cerro Cora) - km 1381 (Santa Ana). Provincia de Misiones.	En Ejecución	57.604.22.15.17.00	128.989.385	373.692.500	2.287.408	- 126.701.977
48915	Construcción de la RN N° 23. Tramo: Cornallo - Picaniyeu Viejo. Provincia Río Negro.	En Ejecución	57.604.22.03.86.00	127.868.667	127.868.667	20.563.200	- 107.305.467
58679	Obra de mantenimiento modular en las RN N° 8-36-33-A005 en el Corredor Vial N° 8. Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.	En Ejecución	57.604.40.08.03.00	127.052.333	127.052.333	3.574.075	- 123.478.258
55638	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 437 en la RN N° 38. Tramo: Lte. Catamarca/Tucumán - Emp. RN N° 9 (Ciudad de Tucumán). Provincia de Tucumán.	Factibilidad	57.604.26.05.53.00	124.670.557	160.661.760	6.555.090	- 118.115.467
58669	Obra de mantenimiento modular en las RN N° 3-205-226-252 del Corredor Vial N° 1. Provincia de Buenos Aires.	En Ejecución	57.604.40.01.03.00	123.649.667	123.649.667	5.000.000	- 118.649.667
72682	Colocación de caniles y cercos perimetrales en pasos de frontera	Factibilidad	41.343.46.00.00.02	120.000.000	120.000.000	281.892	- 119.718.108
71129	Construcción de Sistema Agua Potable - Concordia - Entre Ríos (PAYS II)	En Ejecución	30.613.20.02.36.00	115.694.768	455.876.461	56.500	- 115.638.268
35953	Construcción de la RNN° 16 (Corredor Bioceánico Norte). Tramo: Roque Sáenz Peña - Metán; Sección I: Fin del Paso por Pcia. Roque Sáenz Peña - Km 220,85. Provincia del Chaco	En Ejecución	57.604.22.09.29.00	110.476.398	110.476.398	7.794.082	- 102.682.316
46898	Rehabilitación y Mantenimiento Malla 103. RN N° 22 y RN N° 151. Tramos: Chimpay (km 1044,98) - Acc. a Gral. Godoy (km 1137,35) / Emp. RNN° 22 (km 0,00) - Lte. c/La Pampa (km 150,00). Provincia de Río Negro.	En Ejecución	57.604.26.04.92.00	110.092.390	346.056.610	23.219.248	- 86.873.142
32393	Construcción de la RNN° 40: Tramo: Barrancas - Malargüe- Sección II: Km 2823,90 - Intersec. RPN° 181 (Km 2887,25). Provincia de Mendoza.	En Ejecución	57.604.22.04.87.00	108.692.333	233.326.972	189.570.649	- 80.878.316
51935	Construcción Variante Arrecifes, Autopista Pilar - Pergamino. RNN° 8. Tramo V: A° Helves - Todd. Prov. Bs As	En Ejecución	57.604.22.14.75.00	108.273.333	260.911.111	44.430.782	- 63.842.551
51929	Construcción RNN° 8 - Autopista Pilar - Pergamino. Tramo 1 B: RPN° 39 (Acc. a Capilla del Señor) - Parada Robles. Prov. de Buenos Aires	En Ejecución	57.604.22.14.72.00	107.662.958	107.662.958	14.000.000	- 93.662.958
58670	Obra de mantenimiento modular en las RN N° 5 y 188 del Corredor Vial N° 2. Provincias de Buenos Aires y La Pampa.	En Ejecución	57.604.40.02.03.00	105.852.000	105.852.000	10.000	- 105.842.000
71106	Ampliación de planta de tratamiento de Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche - Río Negro (PAYS II)	En Ejecución	30.613.20.03.72.00	105.123.590	285.838.370	90.693.659	- 14.429.931
46958	Rehabilitación y Mantenimiento. Malla C.Re.Ma 408 C. RNN° 60. Tramo: Emp. RNN° 157 - Emp. RNN° 38 (Princ. de Sup). Secc: km 940,36 - km 1113,87. Prov. de Catamarca.	Factibilidad	57.604.26.05.13.00	104.082.085	138.407.184	19.589.360	- 84.492.725
51931	Construcción de autopista en la RNN° 8. Tramo IIa: Arroyo Grivas - Arroyo de Giles. Prog. 78,13 - Prog. 104,37. Provincia de Buenos Aires.	En Ejecución	57.604.22.14.73.00	103.117.967	425.285.541	93.563.308	- 9.554.659
60897	Optimización del Sistema Acueducto Regional Lago Musters - Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Caleta Olivia - Provincias de Chubut y Santa Cruz	En Ejecución	30.613.20.02.28.00	103.030.818	103.030.818	2.938.404	- 100.092.414
Inferiores a \$100 millones				7.246.648.654	374.395.771.008	21.695.557.402	- 14.448.908.748
Monto total				28.275.356.273	418.083.240.736	24.537.066.292	- 3.738.289.981
RESTO	VARIOS PROYECTOS QUE CONFORMAN UNA LINEA PRESUPUESTARIA					11.676.921.435	
TOTAL PROYECTOS INGRESADO EN EL PNP A						36.213.987.727	
TOTAL PROYECTOS NO INGRESADOS EN EL PNP C						90.133.699.690	
TOTAL DEMANDA A+C						126.347.687.417	
PNIP-SOLO IRD B						65.474.583.517	
DEMANDA SATISFECHA (A/A+C)						29%	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL D						215.082.060.554	
TOTAL DE PROYECTOS INGRESADOS EN EL PNP /GASTOS DE CAPITAL A/D						17%	

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF y BAPIN III Respuesta a Nota N°83/2018-AG02



Auditoría General de la Nación

Anexo N°3: Demanda de Inversión Satisfecha 2017 por SAF

SAF	Monto	%Monto
604 - Dirección Nacional de Vialidad	16.285.388.738	44,97%
106 - Comisión Nacional de Actividades Espaciales	1.195.119.559	3,30%
379 - Estado Mayor General de la Armada	1.193.432.954	3,30%
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	1.014.130.140	2,80%
613 - Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	706.936.103	1,95%
606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria	673.623.404	1,86%
375 - Gendarmería Nacional	548.319.416	1,51%
107 - Administración de Parques Nacionales	511.154.973	1,41%
372 - Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas	436.519.855	1,21%
332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)	288.262.089	0,80%
Resto SAF	1.684.179.061	4,65%
Total Proyectos	24.537.066.292	67,76%
VARIOS PROYECTOS QUE CONFORMAN UNA LINEA PRESUPUESTARIA	11.676.921.435	
Total Demanda satisfecha	36.213.987.727	

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF y BAPIN III Respuesta a Nota N°83/2018-AG02



Auditoría General de la Nación

Anexo N°4: Estado de los proyectos

A) Estado de los proyectos con crédito asignados.

ESTADO DE LOS PROYECTOS	CREDITO INICIAL	CREDITO VIGENTE	DEVENGADO
Cancelado	185.314.483	0	0
En Ejecución	48.696.678.263	52.883.209.524	46.500.359.812
Factibilidad	5.375.412.590	57.596.380	0
Idea	908.964.243	31.876.295	0
Postergado	7.000.000	0	0
PreFactibilidad	1.200.556.475	29.434.590	0
Sin datos	8.980.531.589	1.274.391.338	0
Suspendido	125.874	125.874	0
Terminado	120.000.000	0	0
Total general IRD	65.474.583.517	54.276.634.001	46.500.359.812

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF y BAPIN III Respuesta a Nota N°83/2018-AG02

B) Proyectos cancelados con Crédito asignado

Nro de BAPIN	Denominación	Jur	SAF	Apertura Programática	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Estado al 31/12/17
39091	REPARACION DE MUELLE EN DELEGACION RIO URUGUAY DE LA DIRRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES - ENTRE RIOS	57	327	57.327.91.00.25.00.51	14.000.000	0	0	Cancelado
74227	Implementación de Actualizaciones y Capacitaciones de RRHH 2017	70	330	70.330.19.00.00.04.00	2.000.000	0	0	Cancelado
74228	implementación de Programas Deportivos Educativos 2017	70	330	70.330.19.00.00.06.00	200.000	0	0	Cancelado
67620	I6: Centro de Logística y Administrativo del PPI	53	322	53.322.22.02.34.00.51	30.000.000	0	0	Cancelado
73351	Construcción Jardín Luna y Orma - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	70	330	70.330.46.01.39.00.51	12.482.162	0	0	Cancelado
58696	Sendero Interpretativo e Infraestructura Edilicia "Paseo La Catarata". El Hoyo, Provincia de Chubut	53	322	53.322.22.02.44.00.51	69.472.082	0	0	Cancelado
58697	Embarcadero para desarrollo de actividades náuticas - Puerto Patriada. El Hoyo, Provincia de Chubut	53	322	53.322.22.02.45.00.51	57.160.239	0	0	Cancelado
total PY cancelados					185.314.483			

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF y BAPIN III Respuesta a Nota N°83/2018-AG02



Auditoría General de la Nación

Anexo N°5: Proyectos en ejecución financiera cuyo Devengado mayor a \$148 millones sin Dictamen, conforme lo establecido por Resolución 24/2016, del 31 de agosto de 2016, se fijó el monto máximo, en \$148 millones

Nro de BAPIN	Denominación	Jur	SAF	Apertura Programática	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Estado al 31/12/17	Ubicación Geog.	Respuesta a observaciones dictamen
62094	Obras de Refuerzo de Infraestructura en RN N° A005 (Corredor Vial H5)	57	604	57.604.40.10.02.00.51	227.062.538	182.237.794	182.237.793	En Ejecución	Provincia de Buenos Aires	
62095	RNN° 5. Obras de operación, mantenimiento y servicios de apoyo en el Corredor Vial H5	57	604	57.604.40.10.03.00.51	117.284.684	172.239.744	172.239.743	En Ejecución	Provincia de Buenos Aires	
72868	Desarrollo Centro de Datos	26	366	26.366.21.00.01.00.51	281.435.487	291.435.487	165.258.420	En Ejecución	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	
68737	Adquisición de equipamiento básico para el MINISTERIO DE INDUSTRIA - Año 2016	51	362	51.362.01.00.00.01.00	31.866.777	209.192.417	163.403.946	En Ejecución	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	
72994	Modernización	26	366	26.366.25.00.01.00.51	220.398.515	210.398.515	176.319.436	En Ejecución	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	
74242	Autopista. RPN° 7 / RPN° 51. Tramo: (ruta del Petroleo) Centenario - Añelo/ Emp. RPN°7 - Emp. RPN° 17. Secc: Centenario - Emp. RPN°51 / Emp RPN° 7 - Inters. RPN°8. Provincia Neuquen.	57	604	57.604.42.08.01.00.51	102.888.005	170.192.369	169.253.392	En Ejecución	Provincia del Neuquén	
30070	Obras menores de rehabilitación. Nacional.	57	604	57.604.22.04.01.00.51	3.740.133	186.492.084	184.572.421	En Ejecución	Provincia de Córdoba	
NR		30	201	30.201.16.00.00.01.00	48.072.000	182.092.690	174.225.304	En Ejecución	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	
Total					1.032.748.139	1.604.281.100	1.387.510.456			

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF y BAPIN III Respuesta a Nota N°83/2018-AG02



Auditoría General de la Nación

Anexo N°5: Proyectos en ejecución financiera cuyo Devengado mayor a \$200 millones sin Dictamen, respecto a lo establecido por Disposición SSEPIP 1-E/2017, de 20 de octubre de

2017

Nro de BAPIN	Denominación	Jur	SAF	Apertura Programática	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Estado al 31/12/17	Ubicación Geog.
58671	Obras de mantenimiento modular en la RN N° 7 - Corredor Vial N° 3. Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.	57	604	57.604.40.03.0 3.00.51	120.717.163	358.662.834	358.662.833	En Ejecución	Interprovincial
53429	Obras de Seguridad en RNN° 34. Corredor Vial IV	57	604	57.604.40.04.0 1.00.53	94.082.836	605.157.773	538.524.851	En Ejecución	Provincia de Santa Fe
58672	Obras de mantenimiento modular en las RNN° 18-19-34-38 del Corredor Vial N° IV. Provincias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.	57	604	57.604.40.04.0 3.00.51	118.225.397	378.928.108	378.928.107	En Ejecución	Interprovincial
31157	Construcción de un inyector satelital de cargas útiles livianas	71	106	71.106.17.00.0 1.00.52	40.100.000	263.152.895	261.747.895	En Ejecución	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
74233	Implementación del Plan Nacional de Educación Digital - 2017	70	330	70.330.47.00.0 0.02.00	6.142.721.935	857.096.214	618.063.498	En Ejecución	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
42176	Construcción de la RNN° A008. Tramo: Av. Circunvalación de Rosario. (Río Paraná-Emp. Av. Belgrano) km 1,310 - km 29,395 - Provincia de Santa Fe	57	604	57.604.22.12.3 9.00.51	289.970.692	425.967.105	425.967.105	En Ejecución	Provincia de Santa Fe
48819	Repavimentación de Calzada. RNN° 7. Tramo: Lte. Córdoba-San Luis / Lte. San Luis-Mendoza. Secc.: Acc. a Fraga (km 700,55) - San Luis (km 865,58) - San Luis.	57	604	57.604.22.09.0 5.00.52	177.732.494	475.131.714	499.305.429	En Ejecución	Provincia de San Luis
35921	Construcción de la RNN° 50 - Tramo: Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán-Salta.	57	604	57.604.22.09.0 7.00.51	146.539.001	279.561.387	252.873.701	En Ejecución	Provincia de Salta
58675	Obra de mantenimiento modular en las RN N° 12-16 del Corredor Vial N° 6. Provincias de Corrientes, Misiones y Chaco.	57	604	57.604.40.06.0 3.00.51	118.770.637	290.698.746	290.698.746	En Ejecución	Interprovincial
58678	Obra de mantenimiento modular en las RN N° 9 y 34 en el Corredor Vial N° 7. Provincias de Santiago del Estero, Salta y Tucumán.	57	604	57.604.40.07.0 3.00.51	119.117.395	774.129.308	774.129.307	En Ejec. & Oper.	Interprovincial
45815	Ampliación de capacidad y construcción de colectoras en la RNN° 40. Tramo: Tunuyán - Mendoza. Secc.: RP N° 2 (calle Azcuénaga) - RN N° 7 (Cóndor). Mendoza.	57	604	57.604.22.13.6 7.00.51	197.727.486	282.507.634	266.412.044	En Ejecución	Provincia de Mendoza
63635	CONSTRUCCION SISTEMA DE OMNIBUS DE TRANSITO EN RNS DE VIRREY DEL PINO (LA MATANZA) A PLAZA DE LOS VIRREYES (CABA)	57	327	57.327.61.00.0 1.00.56	379.486.313	1.085.381.313	1.296.152.721	En Ejecución	Provincia de Buenos Aires
58679	Obra de mantenimiento modular en las RN N° 9-36-33-A005 en el Corredor Vial N° 8. Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.	57	604	57.604.40.08.0 3.00.51	116.423.908	286.391.249	286.391.248	En Ejecución	Interprovincial
58669	Obra de mantenimiento modular en las RN N° 3-205-226-252 del Corredor Vial N° 1. Provincia de Buenos Aires.	57	604	57.604.40.01.0 3.00.51	117.116.876	479.499.650	479.499.649	En Ejecución	Provincia de Buenos Aires
58670	Obra de mantenimiento modular en las RN N° 5 y 188 del Corredor Vial N° 2. Provincias de Buenos Aires y La Pampa.	57	604	57.604.40.02.0 3.00.51	122.117.064	414.077.700	414.077.699	En Ejecución	Interprovincial
45212	Obras menores de conservación mejorativa. Nacional	57	604	57.604.16.08.0 1.00.51	50.258.462	247.200.818	240.868.211	En Ejecución	Provincia de Jujuy
30865	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, LANZAMIENTO Y OPERACIÓN DE DOS SATELITES DE ÓRBITA POLAR. MISIÓN SAGCOM 1 A/B	71	106	71.106.16.00.0 2.00.52	846.745.897	1.328.910.247	1.027.936.503	En Ejecución	Provincia de Buenos Aires
74243	Autopista Metropolitana. Tramo: Acc. Richieri - Pte La Noria. Secc: Puente La Noria (Vinculación de la RN° A003 con Camino Negro). Prov Buenos Aires.	57	604	57.604.44.07.0 2.00.51	203.339.885	522.717.024	493.010.004	En Ejecución	Provincia de Buenos Aires
NR		57	327	57.327.61.00.0 2.00.60	1.023.000.000	2.231.185.349	2.645.575.817	En Ejecución	Interprovincial
NR		57	604	57.604.40.05.0 6.00.51	395.080.340	439.511.495	439.511.495	En Ejecución	Interprovincial
NR		71	336	71.336.44.00.0 1.00.51	70.412.724	213.397.419	202.938.517	En Ejecución	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
61925 64812 64813 64823 64824 64825 64831 64833 64834 64835 64837 64838 65660 66578 66579 67138 67173 67950 67954 67968 69041 69375 70646 70694 70695 70696 51105 55871 58550 58636 70698 71148 71150 71181 71185 71186 71187 71192 71193 71308 74053 74054 74056 74057 74058 74059 74060		41	343	41.343.38.00.0 0.01.00	692.615.659	759.105.709	536.340.201	En Ejecución	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
72547 72549 72550 72552 72558		41	343	41.343.48.00.0 0.01.00	165.600.054	1.111.805.933	460.075.857	En Ejecución	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
30057 68571		57	604	57.604.16.01.0 1.00.51	702.000.000	1.550.463.454	1.397.872.877	En Ejecución	Provincia de Buenos Aires
64156 67966		71	336	71.336.43.00.0 0.05.00	111.752.574	394.681.845	392.410.808	En Ejecución	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
57138 57390 58611 58666 62389 62390 68762 68766 74070		75	850	75.850.01.00.0 0.11.00	87.757.423	446.710.741	230.268.197	En Ejecución	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
61633 64290		71	106	71.106.16.00.0 2.01.00	119.500.000	84.790.681	384.214.205	En Ejecución	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
30610 50103 51721 52301 52266 53208 56624 62871 63236 65455 65458 65468 65472 65476 66082 66974 69190 69193 69198 69199 69349 69350 69353 69548 72712 74140 100391		45	374	45.374.16.00.0 0.05.00	270.438.640	831.278.907	496.646.841	En Ejecución	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
48004 48005 53461 55735 55736		57	604	57.604.40.08.0 2.00.52	556.600.023	423.011.032	444.356.795	En Ejecución	Provincia de Buenos Aires
TOTAL					13.595.950.878	17.841.114.284	16.533.461.161		

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF y BAPIN III Respuesta a Nota N°83/2018-AG02



Auditoría General de la Nación

Anexo N°5: Proyectos en ejecución financiera cuyo Devengado mayor a \$148 millones sin Dictamen, de acuerdo a lo establecido por Resolución 24/2016, del 31 de agosto de 2016, se fijó el monto máximo, en \$148 millones

Nro de BAPIN	Denominación	Jur	SAF	Apertura Programática	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Estado al 31/12/17	Ubicación Geog.	Respuesta a observaciones dictamen
62094	Obras de Refuerzo de Infraestructura en RN N° A005 (Corredor Vial H5)	57	604	57.604.40.10.02.00.51	227.062.538	182.237.794	182.237.793	En Ejecución	Provincia de Buenos Aires	
62095	RNN° 5. Obras de operación, mantenimiento y servicios de apoyo en el Corredor Vial H5	57	604	57.604.40.10.03.00.51	117.284.684	172.239.744	172.239.743	En Ejecución	Provincia de Buenos Aires	
72868	Desarrollo Centro de Datos	26	366	26.366.21.00.01.00.51	281.435.487	291.435.487	165.258.420	En Ejecución	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	
68737	Adquisición de equipamiento básico para el MINISTERIO DE INDUSTRIA - Año 2016	51	362	51.362.01.00.00.01.00	31.866.777	209.192.417	163.403.946	En Ejecución	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	
72994	Modernización	26	366	26.366.25.00.01.00.51	220.398.515	210.398.515	176.319.436	En Ejecución	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	
74242	Autopista. RPN° 7 / RPN° 51. Tramo: (ruta del Petroleo) Centenario - Añelo/ Emp. RPN°7 - Emp. RPN° 17. Secc: Centenario - Emp. RPN°51 / Emp RPN° 7 - Inters. RPN°8. Provincia Neuquen.	57	604	57.604.42.08.01.00.51	102.888.005	170.192.369	169.253.392	En Ejecución	Provincia del Neuquén	
30070	Obras menores de rehabilitación. Nacional.	57	604	57.604.22.04.01.00.51	3.740.133	186.492.084	184.572.421	En Ejecución	Provincia de Córdoba	
NR		30	201	30.201.16.00.00.01.00	48.072.000	182.092.690	174.225.304	En Ejecución	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	
Total					1.032.748.139	1.604.281.100	1.387.510.456			

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF y BAPIN III Respuesta a Nota N°83/2018-AG02



Auditoría General de la Nación

Anexo N°6: Proyectos en ejecución financiera cuyo Dictamen se encuentra pendiente

Nro de BAPIN	Denominación	Apertura Programática	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Estado al 31/12/17	Dictamen	Estado de situación	Ubicación Geog.
48679	Construcción de Autopista en la Ruta: Camino del Buen Ayre. Tramo: Continuación de la Autopista Camino del Buen Ayre, Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra (Prog. 25,55) - Sección: km 0,00 - km 25,55 Provincia de Buenos Aires	57.604.22.14.0 2.00.51	348.727.706	626.165.683	449.004.055	En Ejecución	si	7 - Estudios reenviados al Organismo Iniciador para completar información	Provincia de Buenos Aires
48680	Construcción de Autopista en la Ruta: Camino del Buen Ayre. Tramo: II. Secc.: Acc. Barrio 20 de Junio - RPN° 58 - (Prog. 53,98). Bs. As.	57.604.22.14.0 2.00.52	615.639.598	507.490.380	391.834.716	En Ejecución	si	7 - Estudios reenviados al Organismo Iniciador para completar información	Provincia de Buenos Aires
48681	Construcción de Autopista en la Ruta: Camino del Buen Ayre. Tramo: III. Secc.: RPN° 58 - RPN° 53 (Prog 72,60). Bs. As.	57.604.22.14.0 2.00.53	299.451.898	117.945.032	604.978.820	En Ejecución	si	7 - Estudios reenviados al Organismo Iniciador para completar información	Provincia de Buenos Aires
71118	Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza	30.613.20.03.7 7.00.51	3.250.000	34.000	34.000	En Ejecución	si	7 - Estudios reenviados al Organismo Iniciador para completar información	Provincia de Mendoza
64347	Relleno Sanitario de San fernando del Valle de Catamarca	81.317.62.00.3 0.00.51	23.902.673	71.335.917	65.124.909	En Ejecución	si	7 - Estudios reenviados al Organismo Iniciador para completar información	Provincia de Catamarca
55430	Construcción edificio Imprenta del Congreso	01.315.19.00.0 1.00.51	21.857.120	21.857.120	21.857.120	En Ejecución	si	7 - Estudios reenviados al Organismo Iniciador para completar información	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
62309	Adquisición de 2 buques de investigación oceanográfico-pesquera.	52.607.16.00.0 0.06.00	151.103.669	171.337.493	166.381.542	En Ejecución	si	7 - Estudios reenviados al Organismo Iniciador para completar información	Provincia de Buenos Aires
70098	Construcción del Laboratorio Vegetal	52.623.22.00.0 7.00.51	72.296.413	173.560.470	166.724.622	En Ejecución	si	2 - A la espera de información ampliatoria	Provincia de Buenos Aires
71112	Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura - Neuquén	30.613.20.03.7 3.00.51	3.250.000	40.988.217	40.988.217	En Ejecución	si	8 - Estudios archivados por información incompleta	Provincia del Neuquén
TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS SIN DICTAMEN			1.539.479.077	1.730.714.312	1.906.928.001				

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF y BAPIN III Respuesta a Nota N°83/2018-AG02 fecha corte informe: 12 de diciembre 2018.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°7: Proyectos con Dictamen aprobados con observaciones, sin contestación a las mismas-en Ejecución

Nro de BAPIN	Denominación	Apertura Programática	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Número dictamen	Fecha dictamen	Calificación	Ubicación Geog.	Respuesta a observaciones dictamen
34266	Rehabilitación y Mantenimiento. Malla 506. RN N° 127. Tramo: Emp. RN N° 12 - Emp. RN N° 14 y RN N° 119. Secc: Km 64,11 - Km 324,25. Prov.Coriolantes/Entre Ríos.	57.604.26.04.1 2.00.51	88.705.363	45.920.086	45.920.085	45/2014	30/12/2014	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Entre Ríos	no
32064	Construcción COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE CONDENAS III - AGOTE- MERCEDES- BUENOS AIRES	40.332.18.00.1 0.00.51	423.091.138	302.305.414	84.404.935	30/2004	09/12/2004	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Buenos Aires	no hay registro
51931	Construcción de autopista en la RNN° 8. Tramo IIa: Arroyo Grivas - Arroyo de Giles. Prog. 78,13 - Prog. 104,37. Provincia de Buenos Aires.	57.604.22.14.7 3.00.51	433.233.922	526.676.831	471.696.727	38/2012	14/09/2012	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Buenos Aires	no
57068	Construcción de autopista. RNN° 8. Tramo II B: Pilar - Pergamino. Secc: A de Giles - Puente s/Arroyo Gómez. Provincia Buenos Aires	57.604.22.14.7 3.00.52	29.614.993	75.539.221	129.592.133	35/2014	31/10/2014	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Buenos Aires	no
51934	Duplicación de Calzada. RNN° 8. Autopista Pilar - Pergamino - Tramo III: Arroyo Gómez (km 116,99) - Arroyo Cahuáné (km 143,10)- Provincia de Buenos Aires	57.604.22.14.7 4.00.51	135.536.516	58.416.173	120.570.020	2/2016	21/03/2016	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Buenos Aires	no
57069	Duplicación de calzada. RNN° 8. Autopista Pilar - Pergamino - Tramo IV: Arroyo Cahuáné (km 143,10) - Arroyo Helves (km 168,76). Provincia de Buenos Aires.	57.604.22.14.7 4.00.52	135.536.516	191.385.592	129.231.744	3/2016	21/03/2016	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Buenos Aires	no
51935	Construcción Variante Arrecifes. Autopista Pilar - Pergamino. RNN° 8. Tramo V: A° Helves - Todd. Prov. Bs As	57.604.22.14.7 5.00.51	152.911.759	181.321.703	156.883.516	30/2014	06/08/2014	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Buenos Aires	no
57070	Construcción RNN° 8. Autopista Pilar - Pergamino. Tramo 6 A: Todd - Magüire. Prov. Bs. As	57.604.22.14.7 5.00.52	5.677.819	58.616.611	111.465.250	31/2014	06/08/2014	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Buenos Aires	no
57071	Construcción Nuevo trazado RN N° 8. Autopista Pilar - Pergamino. Tramo 6 B: Sección: Magüire Pr. (30+000) - Fontezuela Pr. (45+000.00). Provincia de Buenos Aires.	57.604.22.14.7 5.00.53	5.459.933	48.088.605	17.504.552	36/2014	31/10/2014	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Buenos Aires	no
69224	Obra de reacondicionamiento de infraestructura C4R1 en la RN N° 38, Tramo: (Km 12,32 - km 93,50), (102,60 - 109,40) y (112,60 - km 122,60) Pcia de Córdoba.	57.604.40.04.0 4.00.51	11.029.946	272.040.194	272.040.193	63/2015	16/11/2015	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Córdoba	no
69225	Obra de Rehabilitación de calzada existente. C4.R.2. RN N° 19, Tramo: (km 78,40 - km 105,00), (km 105 - km 154), (km 188 - km 193) y (km 230 - km 280). Prov. Santa Fe y Córdoba.	57.604.40.04.0 5.00.51	155.945.198	243.018.741	243.018.740	11/2016	20/04/2016	APROBADO CON OBSERVACIONES	Interprovincial	no
51367	Rehabilitación y Mantenimiento. Malla 303. RNN° 38. Tramo: Emp. RNN° 79 (Chemical) - Emp. RNN° 75 (La Rioja) Secc: km 291,45 - km 423,63. RNN° 74: Tramo: Emp. RNN° 38 - Prog. km 1120,70. Secc: km 1085,44 - km 1120,70. Provincia de La Rioja.	57.604.26.05.2 6.00.51	73.845.696	62.751.222	62.751.222	16/2016	11/05/2016	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Buenos Aires	no
55605	Recuperación y Mantenimiento de la Malla 107 B RN N° 26. Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 3 - Acceso Colonia Sarmiento. Provincia del Chubut.	57.604.26.05.3 0.00.51	61.930.307	41.148.320	41.148.319	8/2016	18/04/2016	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia del Chubut	no
58488	Repavimentación. RNN3. Tramo: Kosovo - La Herradura. Secc: km 2974,42 - km 3006,00. Prov. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.	57.604.16.09.2 5.00.51	4.935.730	83.247.840	83.247.839	8/2014	11/03/2014	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	no
34272	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 208 en la RNN° 3. Tramo: Acc. a Colonia Los Alamos - Losa aprox.Pte.Piloto Basilio Villarino. Provincia de Buenos Aires.	57.604.26.04.2 5.00.51	2.663.919	17.398.533	17.398.532	10/2005	03/02/2005	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Buenos Aires	no hay registro
39413	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 339. RN N° 40. Tramo: Emp. RNN° 150 - Acc. Jachal - San Roque - Lte. La Rioja/ San Juan. Prov. San Juan	57.604.26.04.7 0.00.51	44.430.782	49.158.798	49.158.797	9/2016	18/04/2016	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de San Juan	no
39071	AMPLIACION COMPLEJO PORTUARIO BAHIA USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO.	57.327.91.00.2 0.00.51	100.000.000	42.237.842	39.542.440	38/2016		APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	no
60897	Optimización del Sistema Acueducto Regional Lago Musters - Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Caleta Olivia - Provincias de Chubut y Santa Cruz	30.613.20.02.2 8.00.51	258.208.488	107.731.354	107.666.433	30/2013	08/08/2013	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia del Chubut	no
32410	Obra Básica. Intersecc. y paso Urbano. RNN° 51. Tramo: Estación - Muñano - San Antonio de los Cobres. Provincia de Salta.	57.604.22.02.5 0.00.51	88.053.220	4.886.778	4.886.777	17/2012	24/05/2012	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Salta	no
41549	Construcción de Autovía sobre la RNN° 9. Tramo: RP N° 2 - Yala. Sección: Puente Paraguay - Yala. Provincia de Jujuy.	57.604.22.12.3 0.00.51	102.143.963	150.929.365	150.929.364	18/2010	27/04/2010	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Jujuy	no
56152	Proyecto, restauración y puesta en valor del Transbordador Nicolás Avellaneda. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Avellaneda (provincia de Bs. As.)	57.604.22.06.9 2.00.51	13.237.706	55.508.396	55.508.393	5/2014	05/03/2014	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Buenos Aires	no
51591	Pavimentación. RNN° 145. Tramo: Bardas Blancas - Hito Pehuenche. Secc.: Las Loicas - Hito Pehuenche. Prov. Mendoza	57.604.22.14.4 3.00.51	18.794.564	51.529.986	51.529.985	9/2014	11/03/2014	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Mendoza	no
51594	Repavimentación. RNN° 158. Tramo: San Francisco - Las Varillas. Secc.: km 0,00 - km 34,11. Provincia de Córdoba.	57.604.22.14.5 6.00.51	24.332.059	709.586	709.586	08/2015	23/02/2015	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Córdoba	no
55613	Rehabilitación y Mantenimiento. RNN° 14. Malla C.Re.Ma 534. Tramo: Emp. RPN° 155 (D) - A° Cuay Grande (Pte) + 2,39. Secc: km 559,62 - km 663,32. Provincia de Corrientes.	57.604.26.05.3 3.00.51	55.741.201	60.275.927	60.275.927	58/2015	09/10/2015	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Corrientes	no

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF y BAPIN III Respuesta a Nota N°83/2018-AG02 fecha corte informe: 12 de diciembre 2018.



Nro de A.P.N.	Denominación	Apertura Programática	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Número dictamen	Fecha dictamen	Calificación	Ubicación Geog.	Respuesta a observaciones dictamen
41549	Construcción de Autovía sobre la RNN 9 - Tramo: RN 2 - Yala. Sección: Puente Paraguay - Yala. Provincia de Jujuy.	57.604.22.12.3 0.00.51	102.143.963	150.929.365	150.929.364	18/10/10	27/04/2010	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Jujuy	no
56152	Proyecto, restauración y puesta en valor del Transportador Bolidos Avelledana. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Avelledana (Provincia de Bs. As.)	57.604.22.06.9 2.00.51	13.237.706	55.508.396	55.508.393	5/2014	05/03/2014	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Buenos Aires	no
51591	Pavimentación. RNN 145. Tramo: Bardas Blancas - Hito Pehuenche. Secc: Las Loicas - Hito Pehuenche. Prov. Mendoza	57.604.22.14.4 3.00.51	18.794.564	51.529.986	51.529.985	9/2014	11/03/2014	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Mendoza	no
51594	Reparavimentación. RNN 158. Tramo: San Francisco - Las Varillas. Secc: km 0,00 - km 34,11. Provincia de Córdoba	57.604.22.14.5 6.00.51	24.332.059	709.586	709.586	08/2015	23/02/2015	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Córdoba	no
55613	Rehabilitación y Mantenimiento. RNN 14 - Malla C de Ma 534. Tramo: Emp. RNN 155 (B) - A/C. Cuyabeno (Pte) + 2,39. Secc: km 559,62 - km 663,32. Provincia de Corrientes	57.604.26.05.3 3.00.51	55.741.201	60.275.927	60.275.927	58/2015	09/10/2015	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Corrientes	no
65314	Construcción de Autovía Multirrua en la RNN 11. Tramo: Limite Prov. del Chaco (km 1103,16) - Emp. RN 81 (km 1184,38). Sección 2 - km 1140,55 - km 1170,20. Provincia de Formosa.	57.604.22.15.9 8.00.51	82.370.656	123.667.014	123.667.013	21/2015	29/05/2015	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Formosa	no
46114	MODERNIZACIÓN DEL ROMPEHIELOS ARA LITE. IZARZ MEDIANTE LA INCORPORACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SUBCAPACIDAD DE OPERACIONES ANTARTICAS DE APOYO.	45.379.16.00.0 7.00.51	19.300.000	15.306.980	10.825.295	53/2009	11/11/2009	APROBADO CON OBSERVACIONES	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	no hay registro
37280	Construcción de la RNN 22. Tramo: Urbano - Zapala. Sección: Intersección Rionda av. Fortes - Emp. RNN 13. Provincia de Neuquén	57.604.22.10.3 9.00.51	102.183	1.689.481	1.689.481	45/2006	04/10/2006	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Neuquén	no hay registro
39668	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 135. RN 40. Tramo: Rio Mayo (km 1366,95) - Emplazamiento Nacional NP 26 (km 1416,54) - Cta. Sarmiento (km 136,24) - Emplazamiento Nacional NP 40 (km 209,92). Provincia de Chubut.	57.604.26.04.7 1.00.51	58.619.218	95.149.485	95.149.485	39-2014	28/11/2014	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Chubut	no
46906	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 116A en la RNN 25. Tramo: Bahía Blanca (Sa) - Lte. C/la Pampa. Secc: km 7,84 - km 125,00. Prov. de Buenos Aires	57.604.26.04.9 9.00.51	57.150.147	42.476.857	42.476.856	55/2015	09/10/2015	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Buenos Aires	no
34161	Mantenimiento por sistema modular. RNN 3 - Tramo: Emp. RNN 21 - Emp. RNN 6. Sección: km 29,20 - km 61,38. Buenos Aires	57.604.16.06.1 9.00.51	8.064.760	95.166.344	94.308.027	53/2014	30/12/2014	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Buenos Aires	no
65072	Señalamiento Horizontal, Señalamiento Vertical y elementos de Seguridad/RN Varias, Etapa III/ Buenos Aires (+19°). Neuquén, Chubut, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego	57.604.16.04.1 6.00.51	80.303.959	248.503.125	248.503.124	07/2015	13/02/2015	APROBADO CON OBSERVACIONES	Interprovincial	no
65122	Señalamiento horizontal con material termoplástico reflectante y bandpas pinta sonora en Rutas varias de Zona Urbana, Etapa I, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formosa	57.604.16.04.1 7.00.51	32.277.002	225.347.968	225.347.967	03/2015	13/02/2015	APROBADO CON OBSERVACIONES	Interprovincial	no
69213	Obra de recondicionamiento de infraestructura C1R1 en la RNN 205. Sección: km 103,24 - km 111,21 / km 111,66 - km 136 / RN 3, Sección: km 61,87 - km 67,07 - km 105. Pcia de Buenos Aires	57.604.40.01.0 4.00.51	115.261.947	231.085.416	231.085.415	64/2015	16/11/2015	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Buenos Aires	no
69215	Obra de recondicionamiento de infraestructura C1R3. RN 3, Tramo: km 248 - km 307 / RN 226. Sección: km 19,93 - km 254 y km 273 - km 302. Prov. Buenos Aires	57.604.40.01.0 6.00.51	260.836.170	249.538.035	249.538.034	59/2015	09/10/2015	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Buenos Aires	no
30145	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 313 A en la RNN 143. Tramo: Lte. C/la Pampa - Emp. RNN 144 (B). Sección: Prog. 550 - Prog. 65,04 (Salto de las Rocas) - Mendoza	57.604.26.04.0 4.00.51	1.127.212	24.490.796	17.832.243	79/2005	23/09/2005	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Mendoza	no hay registro
47726	Pavimentación. RNN 23. Valcheta-Pitaciney. Sección: Maquichuey (Acceso) km 343,03 - km 414,50. Provincia Rio Negro	57.604.22.13.7 4.00.52	23.594.059	119.925.532	11.034.098	1/2013	29/01/2013	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de Rio Negro	no
48464	Construcción de la RNN 79. Tramo: Las Padecitas - Dique Los Sauces. Sección: km 10,76 - km 16,82. Provincia de La Rioja	57.604.22.13.8 6.00.51	333.805.725	112.228.729	112.164.500	24/2013	31/05/2013	APROBADO CON OBSERVACIONES	Provincia de La Rioja	no
48538	Construcción de RNN 40. Tramo: Villa Unión - Safoagata. Secc: km 3814 (Ekm 520) - km 3836 (Ekm 139) (Cuesta del Marañal). Provincia de La Rioja	57.604.22.13.8 8.00.51	41.833.103	6.984.747	6.984.747	70/2011	1			

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF y BAPIN III Respuesta a Nota N°83/2018-AG02



Auditoría General de la Nación

Anexo N°8 : Gastos de Capital

A) Valores Nominales

CONCEPTO	2017								2016					
	CREDITO INICIAL	%CI	MP	%var	CREDITO VIGENTE	%CV	DEVENGADO	%EJECUCIÓN	CREDITO INICIAL	var (2017/2016)	CREDITO VIGENTE	var (2017/2016)	DEVENGADO	var (2017/2016)
INVERSION REAL DIRECTA	65.474.583.517	30,44%	323.274.470	0,49%	65.797.857.987	31,17%	59.450.466.810	90,35%	46.543.690.080	-28,91%	52.570.283.679	25,16%	43.213.436.993	37,57%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	133.842.896.516	62,23%	-1.857.212.784	-1,39%	131.985.683.732	62,53%	126.389.214.921	95,76%	114.125.826.700	-14,73%	122.780.397.970	7,50%	110.109.809.945	14,78%
TOTAL INVERSION PUBLICA	199.317.480.033	92,67%	-1.533.938.314	-0,77%	197.783.541.719	93,71%	185.839.681.731	93,96%	160.669.516.780	-19,39%	175.350.681.649	12,79%	153.323.246.939	21,21%
INVERSION FINANCIERA	15.764.580.521	7,33%	-2.481.254.066	-15,74%	13.283.326.455	6,29%	12.713.153.664	95,71%	13.177.935.000	-16,41%	20.583.997.475	-35,47%	19.209.127.028	-33,82%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	215.082.060.554	100,00%	-4.015.192.380	-1,87%	211.066.868.174	100,00%	198.552.835.395	94,07%	173.847.451.780	-19,17%	195.934.679.124	7,72%	172.532.373.967	15,08%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Anexo N°8: Gastos de Capital:

B) Variación Real

CONCEPTO	2017								2017/2016 VAR REAL	2017/2016 VAR NOMINAL	DEVENGADO/PIB 2017
	CREDITO INICIAL	%CI	MP	%var	CREDITO VIGENTE	%CV	DEVENGADO	%EJECUCIÓN			
INVERSION REAL DIRECTA	65.474.583.517	30,44%	323.274.470	0,49%	65.797.857.987	31,17%	59.450.466.810	90,35%	10,24%	37,57%	0,56%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	133.842.896.516	62,23%	-1.857.212.784	-1,39%	131.985.683.732	62,53%	126.389.214.921	95,76%	-8,03%	14,78%	1,20%
TOTAL INVERSION PUBLICA	199.317.480.033	92,67%	-1.533.938.314	-0,77%	197.783.541.719	93,71%	185.839.681.731	93,96%	-2,88%	21,21%	1,76%
INVERSION FINANCIERA	15.764.580.521	7,33%	-2.481.254.066	-15,74%	13.283.326.455	6,29%	12.713.153.664	95,71%	-46,97%	-33,82%	0,12%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	215.082.060.554	100,00%	-4.015.192.380	-1,87%	211.066.868.174	100,00%	198.552.835.395	94,07%	-7,79%	15,08%	1,88%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Para hacer una comparación en términos reales entre los datos al cierre de los últimos dos ejercicios, se ajustaron los datos al 31/12/2017 con el índice de precios al Consumidor de alcance nacional, nivel general, base diciembre 2016=100, elaborado por INDEC, que en diciembre 2017 fue del 124,8, es decir que el aumento del IPC entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 fue del 24,8%.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°9: Inversión Financiera

Cod. y Desc. Principal	Cod. y Desc. Parcial	Cod. y Desc. Subparcial	\$ Cred. Inicial	\$ Cred. Vigente	%CV	\$ Devengado
1- Aportes de Capital y Compra de Acciones	1- Aportes de Capital a Empresas Privadas Nacionales	09999 - Sin Discriminar	1.150.000	1.150.000	0,03%	0
	Total 1 - Aportes de Capital a Empresas Privadas Nacionales		1.150.000	1.150.000	0,03%	1.150.000
	2 - Aportes de Capital a Empresas Públicas No Financieras	00523 - Corredores Viales S.A.	0	200.000	0,00%	200.000
		00570 - Contenidos Públicos S.E.	0	100.000	0,00%	0
		00727 - Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.			0,00%	
		00766 - Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado	0	5.000.000	0,04%	5.000.000
	Total 2 - Aportes de Capital a Empresas Públicas No Financieras		0	5.300.000	0,04%	5.200.000
	4 - Aportes de Capital a Organismos Internacionales	01376 - Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	0	0	0,00%	85.991500
		01744 - Corporación Interamericana de Inversiones	0	0	0,00%	1.105.948.756
		01793 - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)			0,00%	
		01800 - Banco Centroamericano de Integración Económica			0,00%	
		03120 - Asociación Internacional de Fomento.	403.917.000	403.917.000	3,04%	347.402.258
		03935 - Fondo Monetario Internacional (FMI)			0,00%	
		03985 - FONPLATA	418.145.000	418.145.000	3,35%	400.093.036
		03989 - Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRE)	342.828.000	342.828.000	2,58%	297.204.488
		06032 - Corporación Andina de Fomento	716.585.000	716.585.000	5,39%	1.387.455.020
		06013 - Fondo Para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM)	483.840.000	483.840.000	3,64%	0
		09999 - Sin discriminar	1.433.600.000	1.433.600.000	10,79%	0
	Total 4 - Aportes de Capital a Organismos Internacionales		3.798.915.000	3.798.915.000	28,60%	3.624.095.058
	5 - Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios	00593 - Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Unica Familiar	10.500.000.000	8.750.000.000	65,87%	8.750.000.000
	Total 5 - Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios		10.500.000.000	8.750.000.000	65,87%	8.750.000.000
	Total 1 - Aportes de Capital y Compra de Acciones		14.300.065.000	12.555.365.000	94,52%	12.380.445.058
2 - Préstamos a Corto Plazo	1- Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado	02002 - Préstamos Personales para Inspectores del SENASA	0	0	0,00%	1837
		09999 - Sin discriminar	7.488.705	17.254.859	0,13%	17.095.771
	Total 1 - Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado		7.488.705	17.254.859	0,13%	17.097.607
	3 - Préstamos a Corto Plazo a Organismos Descentralizados	09999 - Sin discriminar	99.987	0	0,00%	0
	Total 3 - Préstamos a Corto Plazo a Organismos Descentralizados		99.987	0	0,00%	0
	5 - Préstamos a Corto Plazo a Provincias y Municipalidades	00097 - Provincias	99.987	0	0,00%	0
	Total 5 - Préstamos a Corto Plazo a Provincias y Municipalidades		99.987	0	0,00%	0
	6 - Préstamos a Corto Plazo a Instituciones Públicas Financieras	00000 - Préstamos a Corto Plazo a Instituciones Públicas Financieras	200.099.955	0	0,00%	0
	Total 6 - Préstamos a Corto Plazo a Instituciones Públicas Financieras		200.099.955	0	0,00%	0
	Total 2 - Préstamos a Corto Plazo		207.788.634	17.254.859	0,13%	17.097.607
	1- Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado	02020 - Pequeña y Mediana Empresa	0	325.000.000	2,45%	0
		02050 - Cooperativas Agropecuarias	1.449.811	1.449.811	0,03%	10.000.000
		02051 - Cooperativas de Consumo	506.955	506.955	0,00%	0
		02052 - Cooperativas de Servicios Públicos	501842	501842	0,00%	0
		02053 - Cooperativas de Servicios Públicos	7.316.925	37.621.425	0,28%	18.440.000
		02054 - Cooperativa de Trabajo	6.568.126	6.568.126	0,05%	0
		09999 - Sin discriminar	1040.082.642	339.058.437	2,55%	287.170.998
	Total 1 - Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado		1.056.426.301	710.706.596	5,35%	315.610.998
3 - Préstamos a Largo Plazo	3 - Préstamos a Largo Plazo a Organismos Descentralizados	09999 - Sin discriminar	99.987	0	0,00%	0
	Total 3 - Préstamos a Largo Plazo a Organismos Descentralizados		99.987	0	0,00%	0
	5 - Préstamos a Largo Plazo a Provincias y Municipalidades	03001 - Administración Central Provincial	99.987	0	0,00%	0
	Total 5 - Préstamos a Largo Plazo a Provincias y Municipalidades		99.987	0	0,00%	0
	6 - Préstamos a Largo Plazo a Instituciones Públicas Financieras	00000 - Préstamos a Largo Plazo a Instituciones Públicas Financieras	200.100.612	0	0,00%	0
	Total 6 - Préstamos a Largo Plazo a Instituciones Públicas Financieras		200.100.612	0	0,00%	0
	Total 3 - Préstamos a Largo Plazo		1.256.726.887	710.706.596	5,35%	315.610.998
	Total IF		15.764.580.521	13.283.326.455	100,00%	12.713.153.664

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°10: Inversión Pública por Nivel Institucional

DETALLE	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				INVERSION REAL DIRECTA				INVERSION PUBLICA					
	\$ Cred. Inicial	\$ Cred. Vigente	%cv	\$ Devengado	\$ Cred. Inicial	\$ Cred. Vigente	%cv	\$ Devengado	\$ Cred. Inicial	\$ Cred. Vigente	%cv	\$ Devengado	\$ Devengado 2016	Devengado VAR 2017/2016
1 - Administración Central	127.691.857.639	123.776.171.275	93,78%	118.318.938.046	28.822.446.388	26.622.006.449	40,46%	21.951.466.119	156.514.304.027	150.398.177.724	76,04%	140.270.404.165	115.229.124.706	21,73%
2 - Organismos Descentralizados	6.151.038.877	8.209.512.457	6,22%	8.070.276.875	35.684.704.598	38.211.457.343	58,07%	36.926.982.612	41.835.743.475	46.420.969.800	23,47%	44.997.259.487	35.829.101.399	25,59%
3 - Instituciones de Seguridad Social					967.432.531	964.394.195	1,47%	572.018.078	967.432.531	964.394.195	0,49%	572.018.078	2.265.020.834	-74,75%
Total	133.842.896.516	131.985.683.732	100,00%	126.389.214.921	65.474.583.517	65.797.857.987	100,00%	59.450.466.809	199.317.480.033	197.783.541.719	100,00%	185.839.681.731	153.323.246.939	21,21%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°11: Inversión Pública por Jurisdicción

Cod. y Desc. Jurisdicción	INVERSION REAL DIRECTA						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						INVERSION PUBLICA									
	\$ Cred. Inicial		\$ Cred. Vigente		\$ Devengado		\$ Cred. Inicial		\$ Cred. Vigente		\$ Devengado		\$ Cred. Inicial			\$ Cred. Vigente			\$ Devengado			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	var 2017/2016	2016	2017	%CV	var 2017/2016	2016	2017	var 2017/2016
01 - Poder Legislativo Nacional	127.506.500	187.606.910	463.194.727	228.737.590	442.369.824	170.583.892							127.506.500	187.606.910	47.14%	463.194.727	228.737.590	0.12%	-50.62%	442.369.824	170.583.892	-61.44%
05 - Poder Judicial de la Nación	206.906.681	226.402.118	432.122.381	303.568.933	141.796.104	168.737.619							206.906.681	226.402.118	9.42%	432.122.381	303.568.933	0.15%	-29.75%	141.796.104	168.737.619	19.00%
10 - Ministerio Público	91.346.985	193.773.000	86.839.185	174.860.168	67.533.745	112.636.191							91.346.985	193.773.000	112.13%	86.839.185	174.860.168	0.09%	101.36%	67.533.745	112.636.191	66.79%
20 - Presidencia de la Nación	129.897.000	501.371.345	105.645.150	337.622.581	51.731.501	224.941.509	186.971.200	168.296.000	283.124.969	411.342.040	238.580.497	314.377.517	316.868.200	669.667.345	111.34%	388.770.119	748.964.621	0.38%	92.65%	290.311.998	539.319.027	85.77%
25 - Jefatura de Gabinete de Ministros	909.867.695	489.638.493	221.174.168	250.471.592	167.140.296	133.351.985	1.111.893.965	76.495.256	107.845.154	173.156.063	48.435.594	152.115.373	2.021.761.660	566.133.749	-72.00%	329.019.322	423.627.655	0.21%	28.75%	215.575.890	285.467.358	32.42%
26 - Ministerio de Modernización	34.737.136	1.000.475.231	217.200.008	987.475.231	195.958.961	739.580.401	0		382.800.000		367.000.000		34.737.136	1.000.475.231	2780.13%	600.000.008	987.475.231	0.50%	64.58%	562.958.961	739.580.401	31.37%
30 - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	2.693.670.834	2.801.961.933	2.086.756.889	2.179.555.967	1.309.789.109	2.039.148.602	39.997.466.802	32.975.187.634	33.339.870.689	36.095.894.313	30.517.551.145	35.812.234.970	42.691.137.636	35.777.149.567	-16.20%	35.426.627.578	38.275.450.280	19.35%	8.04%	31.827.340.254	37.851.383.573	18.93%
35 - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	181.288.802	65.228.444	187.038.802	70.574.382	42.902.279	41.096.477	0		2.750.000		2.730.062		181.288.802	65.228.444	-64.02%	189.788.802	70.574.382	0.04%	-62.81%	45.632.341	41.096.477	-9.94%
40 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	1.114.836.649	2.528.280.867	1.006.227.787	765.113.541	162.907.381	401.761.919	0	10.790.400	58.924.470	538.002.854	58.000.000	485.397.651	1.114.836.649	2.539.071.267	127.75%	1.065.152.257	1.303.116.395	0.66%	22.34%	220.907.381	887.159.570	301.60%
41 - Ministerio de Seguridad	1.785.625.000	1.851.940.813	3.648.722.282	2.852.408.370	2.467.199.477	1.824.882.851	126.724.000	97.244.319	334.651.792	229.866.559	152.551.817	123.048.160	1.912.349.000	1.949.185.132	1.93%	3.983.374.074	3.082.274.929	1.56%	-22.62%	2.619.751.294	1.947.931.011	-25.64%
45 - Ministerio de Defensa	1.637.235.709	1.623.645.602	1.681.277.128	2.278.219.539	1.138.143.296	1.466.385.052	7.945.301	11.414.596	31.245.913	57.814.596	31.245.913	57.364.409	1.645.181.010	1.635.060.198	-0.62%	1.712.523.041	2.336.034.135	1.18%	36.41%	1.169.389.209	1.523.749.461	30.30%
50 - Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	278.096.124	372.526.666	252.449.634	455.818.885	73.847.246	259.914.223	171.837.250	6.827.332	144.475.250	6.800.000	7.827.960	6.800.000	449.933.374	379.353.998	-15.69%	396.924.884	462.618.885	0.23%	16.55%	81.675.206	266.714.223	226.55%
51 - Ministerio de Producción	42.598.000	246.412.815	209.379.702	323.430.494	144.197.668	207.546.580	2.443.102.370	854.537.707	1.473.581.612	1.165.035.221	1.452.421.359	1.086.479.058	2.485.700.370	1.100.950.522	-55.71%	1.682.961.314	1.488.465.715	0.75%	-11.56%	1.596.619.027	1.294.025.638	-18.95%
52 - Ministerio de Agroindustria	1.041.364.000	631.303.624	1.268.638.953	1.083.146.483	1.028.946.637	911.187.771	349.747.000	633.166.427	569.088.885	1.002.985.870	481.146.043	885.363.430	1.391.111.000	1.264.470.051	-9.10%	1.837.727.838	2.086.132.353	1.05%	13.52%	1.510.082.680	1.796.551.201	18.97%
53 - Ministerio de Turismo	214.207.822	634.964.103	300.291.456	683.357.928	182.719.292	507.534.836	6.000.000	22.195.682	50.945.207	33.708.644	50.518.551	22.194.010	220.207.822	657.159.785	198.43%	351.236.663	717.066.572	0.36%	104.15%	233.237.843	529.728.846	127.12%
57 - Ministerio de Transporte	26.312.902.424	37.665.125.183	30.584.395.909	42.270.894.519	27.690.001.043	41.965.841.691	4.242.959.000	8.402.514.819	8.733.597.276	9.290.738.251	6.897.385.728	9.129.155.508	30.555.861.424	46.067.640.002	50.77%	39.317.993.185	51.561.632.770	26.07%	31.14%	34.587.386.770	51.094.997.199	47.73%
58 - Ministerio de Energía y Minería	1.327.262.599	1.883.851.097	1.565.644.960	2.846.324.101	1.093.053.227	2.198.429.388	11.029.327.250	19.656.322.827	13.182.264.130	11.245.011.960	9.201.882.101	9.116.247.659	12.356.589.849	21.540.173.924	74.32%	14.747.909.090	14.091.336.061	7.12%	-4.45%	10.294.935.328	11.314.677.047	9.91%
59 - Ministerio de Comunicaciones	46.866.099	69.517.767	68.898.662	41.275.732	28.554.899	36.862.114	754.196.000	839.229.453	664.626.262	696.076.593	250.399.266	687.071.445	801.062.099	908.747.220	13.44%	733.524.924	737.352.325	0.37%	0.52%	278.954.165	723.933.559	159.52%
70 - Ministerio de Educación y Deportes	1.515.247.362	8.419.311.834	1.603.633.379	2.540.505.413	1.566.152.060	1.836.132.872	5.052.351.001	8.815.273.270	4.772.374.144	9.284.332.984	4.288.468.693	8.784.106.483	6.567.598.363	17.234.585.104	162.42%	6.376.007.523	11.824.838.397	5.98%	85.46%	5.855.620.753	10.620.239.355	81.37%
71 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	2.117.331.436	1.564.390.817	2.348.429.186	2.643.033.761	2.225.805.494	2.621.293.841	174.016.000	54.921.059	277.118.000	118.906.865	172.675.444	118.906.865	2.291.347.436	1.619.311.876	-29.33%	2.625.547.186	2.761.940.626	1.40%	5.19%	2.398.480.938	2.740.200.706	14.25%
72 - Ministerio de Cultura	102.167.085	41.006.973	116.905.623	71.745.773	25.745.474	60.164.259	51.311.000	16.558.000	103.572.462	95.807.535	87.684.910	92.357.882	153.478.085	57.564.973	-62.49%	220.478.085	167.553.308	0.08%	-24.00%	113.430.384	152.522.141	34.46%
75 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	2.974.659.500	1.039.179.833	2.693.241.800	1.047.617.001	2.329.459.505	636.014.437	210.596.000	177.442.854	180.658.700	204.581.854	54.290.299	164.826.314	3.185.255.500	1.216.622.687	-61.80%	2.873.900.500	1.252.198.855	0.63%	-56.43%	2.383.749.804	800.840.751	-66.40%
80 - Ministerio de Salud	863.032.299	564.854.979	753.968.073	496.268.120	251.269.620	363.083.329	931.424.399	470.145.021	1.295.825.134	457.283.098	1.238.850.998	373.672.237	1.794.456.698	1.035.000.000	-42.32%	2.049.793.207	953.551.218	0.48%	-53.48%	1.490.120.617	736.755.566	-50.56%
81 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable		832.154.963		631.918.776				1.794.154.308		2.536.149.560		2.528.401.331	0	2.626.309.271	SIN CI	0	3.168.068.336	1.60%	SIN CI	0	2.528.401.331	SIN CI
81 - Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	764.009.074		613.160.570		375.667.738	431.279.913	833.930.879		1.405.867.395		1.399.074.125		1.597.939.953	0	-100.00%	2.019.027.965	0	0.00%	-100.00%	1.774.741.863	431.279.913	-75.70%
85 - Ministerio de Desarrollo Social	31.027.265	39.658.107	55.047.265	233.913.107	10.545.117	92.075.059	148.874.520	90.136.577	169.263.322	382.714.499	127.790.508	347.896.473	179.901.785	129.794.684	-27.85%	224.310.587	616.627.606	0.31%	174.90%	138.335.625	439.971.532	218.05%
91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro							46.295.152.763	58.670.042.975	55.215.927.204	57.959.474.373	52.982.298.936	56.101.198.145	46.295.152.763	58.670.042.975	26.73%	55.215.927.204	57.959.474.373	29.30%	4.97%	52.982.298.936	56.101.198.145	5.89%
Total	46.543.690.080	65.474.583.517	52.570.283.679	65.797.857.987	43.213.436.993	59.450.466.810	114.125.826.700	133.842.896.516	122.780.397.970	131.985.683.732	110.109.809.945	126.389.214.921	160.669.516.780	199.317.480.033	24.05%	175.350.681.649	197.783.541.719	100.00%	12.79%	153.323.246.939	185.838.681.731	21.21%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°12: Inversión Pública por SAF

Cod. y Desc. Servicio	IRD						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						INVERSION PUBLICA						
	\$ Cred. Inicial		\$ Cred. Vigente		\$ Devengado		\$ Cred. Inicial		\$ Cred. Vigente		\$ Devengado		\$ Cred. Inicial		\$ Cred. Vigente		\$ Devengado		
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	%Ejecución
207 - Ente Nacional de Comunicaciones	44.848.662	7.525.235	50.848.662	32.503.200	25.233.284	28.235.724	20.000.000	0	20.000.000	40.000.000	8.338.266	31.047.393	64.848.662	7.525.235	70.848.662	72.503.200	33.551.550	59.282.917	82%
208 - Agencia Nacional de Materiales Controlados		280.550		2.380.550		1243.545							0	280.550	0	2.380.550	0	1243.545	52%
250 - Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina	3.660.000	4.400.000	3.660.000	5.666.664	1.765.933	882.127							3.660.000	4.400.000	3.660.000	5.666.664	1.765.933	882.127	15%
301 - Secretaría General de la Presidencia de la Nación	54.451.000	428.076.015	35.277.650	235.325.836	25.940.711	154.386.205	860.200		260.200		0		55.311.200	428.076.015	35.537.850	235.325.836	25.940.711	154.386.205	70%
303 - Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR)		3.840.000		13.651.436		2.325.173		41.400.000	26.339.238		23.189.860		0	45.240.000	0	39.970.652	0	25.445.033	64%
303 - Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico	1.900.000		2.700.000		542.273		64.635.000		13.282.740		10.980.922		66.535.000	0	15.982.740	0	11.523.395	0	#DIV/0!
305 - Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete	896.867.695	25.338.493	55.448.524	28.903.393	31.296.946	12.487.463	111.093.965	21.495.256	0	0	0	0	2.008.761.660	46.833.749	55.448.524	28.903.393	31.296.946	12.487.463	43%
307 - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	81.288.802	65.228.444	87.038.802	70.574.382	42.902.279	41.096.477	0		2.750.000		2.730.062		81.288.802	65.228.444	89.788.802	70.574.382	45.632.341	41.096.477	58%
310 - Ministerio de Salud	590.342.000	331.890.462	116.064.036	208.309.953	88.970.383	136.398.369	931.424.399	468.269.484	1.292.043.362	440.403.717	1.235.371.766	357.652.856	15.217.66.399	800.159.946	1408.107.398	648.713.670	1.324.342.148	494.051.225	76%
311 - Ministerio de Desarrollo Social	11.682.000	8.777.113	25.482.000	193.532.113	4.015.909	62.135.864	103.384.000	2.343.420	25.334.000	12.669.684	0	11.077.600	15.066.000	11.120.533	50.836.000	206.201.797	4.015.909	73.394.464	36%
312 - Senado de la Nación	9.965.000	12.013.790	257.668.000	62.013.790	247.712.584	22.754.906							9.965.000	12.013.790	257.668.000	62.013.790	247.712.584	22.754.906	37%
313 - Cámara de Diputados	33.500.000	33.500.000	25.000.000	33.000.000	21.018.549	25.888.833							33.500.000	33.500.000	25.000.000	33.000.000	21.018.549	25.888.833	78%
314 - Biblioteca del Congreso	19.000.000	31.550.000	11.590.621	22.007.402	9.285.349	21.620.958							19.000.000	31.550.000	11.590.621	22.007.402	9.285.349	21.620.958	98%
315 - Imprenta del Congreso	22.392.200	23.249.120	23.403.107	26.680.398	22.392.200	26.625.955							22.392.200	23.249.120	23.403.107	26.680.398	22.392.200	26.625.955	100%
316 - Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación	9.000.000	50.000.000	19.000.000	47.100.000	19.000.000	47.100.000							9.000.000	50.000.000	19.000.000	47.100.000	19.000.000	47.100.000	100%
317 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios)	357.792.772	338.584.072	311.077.248	322.202.392	193.687.572	253.775.358	136.037.879	59.992.568	8.492.270	11.542.826	1.700.000	4.065.102	493.830.651	398.576.640	319.569.518	333.745.018	195.387.572	257.840.460	77%
319 - Defensoría del Pueblo	2.873.000	3.570.000	2.873.000	7.127.000	238.495	387.117							2.873.000	3.570.000	2.873.000	7.127.000	238.495	387.117	5%
320 - Consejo de la Magistratura	153.194.000	153.194.000	210.596.292	131.409.115	59.153.531	126.932.300							153.194.000	153.194.000	210.596.292	131.409.115	59.153.531	126.932.300	97%
321 - Instituto Nacional de Estadística y Censos	7.350.000	117.891.324	18.451.000	162.161.725	10.009.210	56.492.661							7.350.000	117.891.324	18.451.000	162.161.725	10.009.210	56.492.661	35%
322 - Ministerio de Turismo	213.207.822	633.764.103	299.291.456	682.157.928	182.664.394	507.154.885	6.000.000	22.195.682	50.945.207	33.708.644	50.518.551	22.194.010	213.207.822	655.959.785	350.236.663	715.866.572	233.182.945	529.348.895	74%
323 - Comisión Nacional de Comercio Exterior	408.000	836.144	1.092.000	2.516.144	3.049	1.731.252							408.000	836.144	1.092.000	2.516.144	3.049	1.731.252	69%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°12: Inversión Pública por SAF

Cod. y Desc. Servicio	IRD						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						INVERSION PUBLICA					
	\$ Cred. Inicial		\$ Cred. Vigente		\$ Devengado		\$ Cred. Inicial		\$ Cred. Vigente		\$ Devengado		\$ Cred. Inicial		\$ Cred. Vigente		\$ Devengado	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
207 - Ente Nacional de Comunicaciones	44.848.662	7.525.235	50.848.662	32.503.200	25.233.284	25.235.724	20.000.000	0	20.000.000	40.000.000	8.381.266	3.0247.303	64.848.662	7.525.235	70.848.662	72.503.200	33.561.560	59.282.937
208 - Agencia Nacional de Materiales Controlados		280.550		2.380.550		1243.545							0	280.550	0	2.380.550	0	1.243.545
250 - Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina	3.660.000	4.400.000	3.660.000	5.666.664	1.765.933	882.327							3.660.000	4.400.000	3.660.000	5.666.664	1.765.933	882.327
301 - Secretaría General de la Presidencia de la Nación	54.451.000	428.076.036	35.277.650	235.325.836	25.940.711	364.386.205	860.200		260.200		0		55.311.200	428.076.036	35.537.850	235.325.836	25.940.711	364.386.205
303 - Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR)		3.840.000		15.651.436		2.325.173	41.400.000		25.392.816		23.189.860		0	45.240.000	0	39.970.652	0	25.445.033
303 - Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico	1.900.000		2.700.000		542.273		64.635.000		13.282.740		10.980.922		66.535.000	0	5.982.740	0	11.523.395	0
306 - Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete	896.867.695	25.338.493	55.448.524	28.903.893	31.296.946	12.487.463	111.893.965	21.495.296	0	0	0	0	2.006.761.660	46.833.749	55.448.524	28.903.893	31.296.946	12.487.463
307 - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	811.288.802	65.228.444	817.038.802	70.574.382	42.902.279	41.096.477	0		2.750.000		2.730.062		811.288.802	65.228.444	819.788.802	70.574.382	45.632.341	41.096.477
310 - Ministerio de Salud	590.342.000	331.890.462	18.064.036	208.309.953	88.970.383	18.398.369	93.142.399	468.269.484	1292.043.962	440.403.717	1.235.371.766	357.652.856	152.176.399	800.899.946	1408.307.398	648.732.670	1324.342.381	494.051.225
311 - Ministerio de Desarrollo Social	16.682.000	8.777.181	25.482.000	893.532.112	4.035.909	62.336.864	103.384.000	2.343.420	25.334.000	12.669.684	0	10.077.600	16.066.000	11.020.533	50.838.000	206.201.797	4.035.909	73.394.464
312 - Senado de la Nación	9.965.000	12.033.790	257.669.000	247.72.584	247.72.584	22.754.906			9.965.000		12.033.790		9.965.000	12.033.790	257.669.000	62.035.790	247.72.584	22.754.906
313 - Cámara de Diputados	33.500.000	33.500.000	25.000.000	33.000.000	210.83.549	25.888.833							33.500.000	33.500.000	25.000.000	33.000.000	210.83.549	25.888.833
314 - Biblioteca del Congreso	9.000.000	31.550.000	11.590.621	22.007.402	9.285.349	21.620.958							9.000.000	31.550.000	11.590.621	22.007.402	9.285.349	21.620.958
315 - Imprenta del Congreso	22.392.200	23.249.120	23.403.107	26.680.398	22.392.200	26.625.955			22.392.200		23.249.120		22.392.200	23.249.120	23.403.107	26.680.398	22.392.200	26.625.955
316 - Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación	9.000.000	50.000.000	18.000.000	47.100.000	18.000.000	47.100.000							9.000.000	50.000.000	18.000.000	47.100.000	18.000.000	47.100.000
317 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios)	357.792.772	338.584.072	311.077.248	322.202.812	303.687.572	253.775.358	16.037.879	59.992.568	8.492.270	11.542.826	1.700.000	4.065.832	493.830.651	398.576.640	338.569.538	333.745.038	395.387.572	257.840.460
319 - Defensoría del Pueblo	2.873.000	3.570.000	2.873.000	7.327.000	238.495	387.117							2.873.000	3.570.000	2.873.000	7.327.000	238.495	387.117
320 - Consejo de la Magistratura	363.894.000	363.894.000	2.10.596.292	131.409.125	59.833.531	126.932.300							363.894.000	363.894.000	2.10.596.292	131.409.125	59.833.531	126.932.300
321 - Instituto Nacional de Estadística y Censos	7.360.000	147.891.324	10.451.000	102.161.725	10.009.232	56.492.661							7.360.000	147.891.324	10.451.000	102.161.725	10.009.232	56.492.661
322 - Ministerio de Turismo	218.207.822	633.764.103	299.291.456	682.857.928	102.664.394	507.54.885	6.000.000	22.395.682	50.945.207	33.708.644	50.538.551	22.394.030	218.207.822	655.959.785	350.236.663	75.866.572	233.822.455	529.348.895
323 - Comisión Nacional de Comercio Exterior	408.000	836.344	1.092.000	2.536.344	3.049	1.731.252							408.000	836.344	1.092.000	2.536.344	3.049	1.731.252
325 - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	1741.404.261	1841.000.573	1132.859.957	651.305.624	548.976.336	537.853.485	36.345.568.875	32.329.147.776	32.039.881.233	34.952.001.294	29.281.069.707	34.694.047.552	38.086.973.196	34.170.348.349	33.82.741.810	35.603.306.938	29.830.046.043	35.231.901.039
325 - Policía Federal Argentina	372.250.000	224.588.238	340.124.096	238.962.238	397.790.302	132.639.957							372.250.000	224.588.238	340.124.096	238.962.238	397.790.302	132.639.957
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	5.764.645.681	7.433.570.841	4.601.712.463	11.710.332.968	3.992.987.259	11.709.729.767	1.254.974.000	3.077.934.767	2.435.327.468	2.878.905.790	1.858.711.740	2.763.533.248	7.509.839.681	10.514.685.708	7.017.039.931	14.599.938.758	5.851.698.999	14.473.353.034
328 - Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios)	83.764.959	29.041.858	39.754.089	78.378.073	3.938.858	565.346.629	10.524.635.250	19.654.237.020	12.774.633.903	1.896.306.833	8.873.054.600	9.073.741.852	10.608.380.209	19.683.258.878	12.834.387.992	11.905.684.226	8.876.974.459	9.638.888.482
329 - Ministerio de Comunicaciones (Gastos Propios)	2.027.437	61.992.532	10.050.000	8.772.532	3.321.636	8.626.390	734.396.000	839.229.453	644.626.262	656.076.593	242.081.000	656.024.252	736.231.437	901.221.985	662.676.262	664.849.125	245.402.635	664.650.642
330 - Ministerio de Educación y Deportes	1496.326.362	8.435.849.334	1582.712.379	2.530.872.138	1.560.079.872	1826.734.058	5.052.351.001	8.835.273.270	4.772.374.344	9.284.332.984	4.289.468.693	8.794.126.483	6.548.677.363	17.231.823.124	6.355.086.523	11.835.205.332	5.849.548.564	10.610.820.541
331 - Servicio Penitenciario Federal	80.858.000	76.342.890	17.534.928	76.342.890	12.763.210	24.947.317							80.858.000	76.342.890	17.534.928	76.342.890	12.763.210	24.947.317
332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)	1012.088.535	2.440.454.162	961.671.615	671.736.836	133.538.880	367.599.478	0	10.790.400	58.436.920	538.002.854	58.000.000	485.397.651	1012.088.535	2.445.124.562	1020.088.535	1.209.739.690	1015.83.880	852.997.130
334 - Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal	112.819	8.332.565	11.707.794	8.332.565	6.707.361	6.453.587							112.819	8.332.565	11.707.794	8.332.565	6.707.361	6.453.587
335 - Corte Suprema de Justicia de la Nación	43.712.681	63.208.181	221.526.089	172.859.838	82.642.573	41.805.339							43.712.681	63.208.181	221.526.089	172.859.838	82.642.573	41.805.339
336 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	549.601.436	259.605.123	645.667.394	622.484.394	546.032.252	603.751.796	0		85.000.000		0		549.601.436	259.605.123	730.667.394	622.484.394	546.032.252	603.751.796
337 - Ministerio de Cultura	58.288.000	32.723.719	72.602.000	50.836.663	9.486.984	40.751.987	34.221.000	3.745.000	37.507.000	5.225.000	22.741.033	5.048.540	92.509.000	36.468.719	101.309.000	56.063.663	32.228.017	45.800.527
338 - Secretaría Legal y Técnica	8.808.000	10.656.329	8.808.000	10.656.329	7.565.953	10.940.173							8.808.000	10.656.329	8.808.000	10.656.329	7.565.953	10.940.173

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°12: Inversión Pública por SAF

Cod y Desc. Servicio	IRD						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						INVERSION PUBLICA						
	\$ Cred. Inicial		\$ Cred. Vigente		\$ Devengado		\$ Cred. Inicial		\$ Cred. Vigente		\$ Devengado		\$ Cred. Inicial		\$ Cred. Vigente		\$ Devengado		
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
340 - Procuración Penitenciaria	14.200.000	8.500.000	4.10.000	11.665.000	4.109.981	11.537.718							14.200.000	8.500.000	4.10.000	11.665.000	4.109.981	11.537.718	100%
341 - Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	11.045.265	8.631.947	17.265.265	10.760.947	6.048.476	11.529.903	11.425.000	8.243.834	8.246.640	57.366.697	2.803.116	46.940.264	24.470.265	35.854.783	32.93.905	75.927.634	8.8516.12	57.670.287	75%
342 - SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Materna Riachuelo (ACUMAR)	817.792.000	270.759.479	77.796.533	44.148.479	60.399.019	42.469.387	697.893.000	173.891.740	1.397.375.425	2.524.336.734	1.397.374.425	2.524.336.229	865.685.000	2.004.651.218	1475.17.1658	2.568.485.210	1457.774.044	2.566.805.417	100%
343 - Ministerio de Seguridad	659.344.000	1026.300.522	2.306.550.218	2.010.561.269	1548.644.212	1.864.664.479	126.724.000	97.244.310	334.651.792	229.866.559	82.5518.97	123.048.460	785.868.000	1.123.344.841	2.640.802.030	2.240.427.828	1701.96.029	1287.712.639	57%
345 - Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	41602.000	35.500.000	34.573.500	43.800.000	2.714.646	32.865.607	121496.000	18.896.000	269.582.029	385.022.824	227.559.574	291257.857	83.098.000	82.396.000	304.85.529	428.822.824	230.334.220	324.123.264	76%
346 - Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual	2.596.300	3.567.000	2.719.999	3.567.000	2.499.418	79.497							2.596.300	3.567.000	2.719.999	3.567.000	2.499.418	79.497	2%
347 - Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos	0	454.000.000	82.725.644	97.602.000	128.369.581	108.065.855	0	55.000.000	107.845.814	173.56.063	48.435.594	82.116.373	0	509.000.000	260.570.798	370.758.063	176.805.075	260.101.128	70%
350 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	98.701500	84.649.302	119.583.800	97.391270	63.252.570	68.136.490	204.496.000	17.442.854	174.558.700	204.581854	54.290.299	164.826.134	303.87.500	262.091956	324.142.500	301973.824	117.542.868	232.962.804	77%
356 - Obligaciones a Cargo del Tesoro							46.296.82.783	58.670.042.976	55.2.8.597.304	57.959.474.373	52.982.298.936	56.101.988.345	46.295.82.783	58.670.042.975	55.2.8.597.304	57.959.474.373	52.982.298.936	56.101.988.345	97%
357 - Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	256.796.124	286.886.354	2.81.648.634	286.882.172	55.399.294	107.84.584	17.1837.250	6.827.332	144.475.250	6.800.000	7.827.960	6.800.000	428.633.374	205.718.696	363.323.884	895.682.172	63.027.254	181.954.584	63%
360 - Procuración General de la Nación	25.553.985	60.862.600	11.803.985	48.009.768	12.174.398	21583.779							25.553.985	60.862.600	11.803.985	48.009.768	12.174.398	21583.779	49%
361 - Defensoría General de la Nación	62.793.000	112.930.400	73.735.200	126.850.400	55.359.348	91052.412							62.793.000	112.930.400	73.735.200	126.850.400	55.359.348	91052.412	72%
362 - Ministerio de Producción	1.094.7000	212.273.528	99.282.364	252.745.733	75.955.766	169.030.648	2.390.82.370	817.873.486	1.324.416.812	1.399.470.890	1.303.369.425	1086.479.058	2.401999.370	1029.945.995	1423.698.976	1402.238.718	1379.234.891	1256.499.706	80%
363 - Ministerio de Agricultura	357.525.000	100.393.595	287.364.520	296.87.072	255.775.257	251.136.435	349.747.000	633.86.427	569.086.885	1002.985.870	481.146.043	885.363.430	707.272.000	793.560.022	856.473.205	1301.82.942	736.921.900	1.87.81.065	67%
366 - Ministerio de Modernización	34.737.516	1000.475.231	217.200.008	987.475.231	85.958.961	739.580.401	0		382.800.000	367.000.000			34.737.516	1000.475.231	600.000.008	987.475.231	562.958.961	739.580.401	75%
370 - Ministerio de Defensa (Gastos Propios)	24.078.555	222.802.234	29.991018	236.823.132	22.146.555	6.052.627	4.350.000	6.964.409	4.350.000	6.964.409	4.350.000	6.964.409	245.428.555	229.124.623	34.341018	223.087.541	26.496.555	13.07.036	6%
371 - Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas	150.472.614	501.227.046	18.798.286	365.404.083	54.802.852	51.87.316							150.472.614	501.227.046	18.798.286	365.404.083	54.802.852	51.87.316	14%
372 - Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas	26.380.473	8.602.851	26.380.473	8.602.851	3.829.940	1883.147	1600.000		1600.000		1600.000		27.980.473	8.602.851	27.980.473	8.602.851	5.429.940	1883.147	30%
374 - Estado Mayor General del Ejército	462.248.925	390.185.323	654.029.388	962.359.286	537.900.721	837.419.209	399.301	450.317	399.301	450.317	399.301	0	462.248.925	390.185.308	654.028.689	962.109.473	538.300.022	837.419.209	87%
375 - Subsecretaría del Servicio Logístico de la Defensa	245.595.000	218.565.140	231504.891	218.344.623	175.266.699	160.356.224							245.595.000	218.565.140	231504.891	218.344.623	175.266.699	160.356.224	87%
376 - Subsecretaría del Servicio Logístico de la Defensa	630.000	900.000	630.000	900.000	313.240	126.641							630.000	900.000	630.000	900.000	313.240	126.641	14%
379 - Estado Mayor General de la Armada	125.384.456	177.452.395	142.082.288	234.772.918	113.94.006	210.527.391							125.384.456	177.452.395	142.082.288	234.772.918	113.94.006	210.527.391	90%
380 - Prefectura Naval Argentina	332.568.000	269.826.830	604.669.440	321.925.501	467.904.428	298.691521							332.568.000	269.826.830	604.669.440	321.925.501	467.904.428	298.691521	93%
381 - Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	12.481.406	33.709.482	10.992.347	57.532.705	146.390.450	126.690.084	1596.000	4.000.000	24.896.612	50.400.000	24.896.612	50.400.000	114.077.406	37.709.482	206.768.959	207.932.705	17.177.062	57.090.084	76%
382 - Policía de Seguridad Aeroportuaria	172.408.000	108.558.075	172.618.637	75.518.075	75.827.902	17.848.543							172.408.000	108.558.075	172.618.637	75.518.075	75.827.902	17.848.543	50%
383 - Instituto Geográfico Nacional	25.706.625	25.473.611	32.677.917	27.669.887	25.027.591	20.060.808							25.706.625	25.473.611	32.677.917	27.669.887	25.027.591	20.060.808	73%
451 - Dirección General de Fabricaciones Militares	438.432.000	209.597.075	438.432.000	250.517.075	170.242.253	209.260.059							438.432.000	209.597.075	438.432.000	250.517.075	170.242.253	209.260.059	84%
452 - Servicio Meteorológico Nacional	48.842.658	33.836.503	50.596.418	33.836.503	41045.298	10.088.790							48.842.658	33.836.503	50.596.418	33.836.503	41045.298	10.088.790	56%
470 - Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares	6.787.000	9.501.800	6.787.000	9.501.800	5.060.589	4.309.300							6.787.000	9.501.800	6.787.000	9.501.800	5.060.589	4.309.300	43%
502 - Comisión Nacional de Valores	5.000.000	1.555.901	6.000.000	20.705.901	5.505.576	10.036.006							5.000.000	1.555.901	6.000.000	20.705.901	5.505.576	10.036.006	92%
503 - Superintendencia de Seguros de la Nación	8.000.000	5.689.442	8.000.000	5.689.442	5.222.236	5.688.964							8.000.000	5.689.442	8.000.000	5.689.442	5.222.236	5.688.964	100%
604 - Dirección Nacional de Vialidad	19.996.773.000	30.022.926.539	25.744.889.727	30.272.726.974	23.554.305.978	29.987.892.815	2.965.085.000	5.38.273.461	5.990.896.122	6.262.650.299	4.767.699.584	6.238.440.099	22.963.858.000	35.341.000.000	31735.705.839	36.555.377.273	28.322.005.563	36.226.332.914	99%
606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria	384.299.000	231068.88	410.140.769	344.844.86	327.693.413	274.731091							384.299.000	231068.88	410.140.769	344.844.86	327.693.413	274.731091	80%
607 - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero	107.446.000	163.427.490	218.625.299	187.763.87	293.206.856	186.957.367	0	0	0	0	0	0	107.446.000	163.427.490	218.625.299	187.763.87	293.206.856	186.957.367	95%
608 - Instituto Nacional de Tecnología Industrial	17.113.000	28.055.532	92.140.338	52.518.518	59.387.600	24.11017	52.950.000	36.884.242	149.105.000	16.564.241	149.822.134	0	17.013.000	28.055.532	92.140.338	68.079.754	208.539.834	24.11017	36%
609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura	17.245.000	3.751086	17.245.000	7.969.766	9.936.235	5.938.883							17.245.000	3.751086	17.245.000	7.969.766	9.936.235	5.938.883	75%
612 - Tribunal de Asesorías de la Nación	800.000	1550.000	800.000	1550.000	144.171	718.909							800.000	1550.000	800.000	1550.000	144.171	718.909	48%
613 - Entes Nacional de Obras Hidricas de Saneamiento	87182.573	875.609.360	834.676.442	1.815.295.988	678.487.655	1.87.884.881	3.651.897.937	646.039.898	1317.259.901	1.83.983.018	1233.751.083	1.808.317.418	4.523.718.500	1521649.118	2.161.936.343	2.338.088.007	1.892.239.538	2.276.072.299	98%
614 - Instituto Nacional de Semillas	489.000	366.852	3.489.000	11.756.852	333.172	3.021503							489.000	366.852	3.489.000	11.756.852	333.172	3.021503	26%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°12: Inversión Pública por SAF

Cod. y Desc. Servicio	IRD						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						INVERSION PUBLICA							
	\$ Cred. Inicial		\$ Cred. Vigente		\$ Devengado		\$ Cred. Inicial		\$ Cred. Vigente		\$ Devengado		\$ Cred. Inicial		\$ Cred. Vigente		\$ Devengado			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	%Ejecución	
620 - Tribunal Fiscal de la Nación	1.80.000	1.777.950	1.80.000	1.777.950	630.929	923.446							1.80.000	1.777.950	1.80.000	1.777.950	630.929	923.446	52%	
622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial	33.230.000	5.248.632	30.866.000	8.663.304	8.861.253	32.623.662							33.230.000	5.248.632	30.866.000	8.663.304	8.861.253	32.623.662	83%	
623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	84.360.000	72.296.433	230.754.565	222.645.470	342.001.704	388.800.492							84.360.000	72.296.433	230.754.565	222.645.470	342.001.704	388.800.492	85%	
624 - Servicio Geológico Minero Argentino	35.091.366	347.576.099	35.284.230	342.576.099	9.303.893	76.800.687	77.1000	2.305.807	77.1000	7.505.807	77.1000	7.505.807	35.091.366	349.681.906	30.056.230	349.681.906	30.074.893	83.666.464	56%	
651 - Ente Nacional Regulador del Gas	32.774.000	30.700.235	33.624.000	30.700.235	8.678.506	7.992.650							32.774.000	30.700.235	33.624.000	30.700.235	8.678.506	7.992.650	48%	
652 - Ente Nacional Regulador de la Electricidad	3.480.000	5.366.907	3.480.000	5.366.907	2.481.303	1543.888							3.480.000	5.366.907	3.480.000	5.366.907	2.481.303	1543.888	29%	
656 - Organismo Regulador de Seguridad de Precios	3.990.000	3.990.000	3.990.000	4.030.000	834.721	1621.350							3.990.000	3.990.000	3.990.000	4.030.000	834.721	1621.350	40%	
661 - Comisión Nacional de Regulación del Transporte	7.477.000	4.782.774	7.477.000	4.498.072	5.248.802	4.448.240							7.477.000	4.782.774	7.477.000	4.498.072	5.248.802	4.448.240	99%	
664 - Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	2.028.000	1200.000	4.578.000	1200.000	3.535.869	1074.608							2.028.000	1200.000	4.578.000	1200.000	3.535.869	1074.608	90%	
669 - Administración Nacional de Aviación Civil	52.1474.000	35.385.294	202.908.976	34.698.696	25.237.263	26.043.345	17.800.000	0	307.748.946	33.334.392	25.134.653	33.334.392	539.374.000	35.385.294	530.657.922	278.031.088	376.566.935	267.357.737	96%	
670 - Unidad de Información Financiera	7.937.000		33.087.000		8.708.826								7.937.000		33.087.000	0	8.708.826	0	0	0
670 - Unidad de Información Financiera		34.725.695		76.601.695		65.631.562							0	34.725.695	0	76.601.695	0	65.631.562	86%	
671 - Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil	1504.743	7.786.226	1504.743	2.475.000	1042.112	2.438.541							1504.743	7.786.226	1504.743	2.475.000	1042.112	2.438.541	99%	
802 - Fondo Nacional de las Artes	605.085	908.558	1505.085	2.229.406	775.324	1532.348	2.461.000	1451.000	5.951.000	6.851.000	4.912.415	5.951.178	3.056.085	2.359.558	7.456.085	9.080.406	5.687.739	7.483.526	82%	
804 - Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria	3.262.000	3.262.000	5.262.000	9.083.295	1528.766	8.956.906							3.262.000	3.262.000	5.262.000	9.083.295	1528.766	8.956.906	99%	
850 - Administración Nacional de la Seguridad Social	2.847.231.000	953.530.731	2.534.931.000	949.225.731	2.257.806.547	567.026.852							2.847.231.000	953.530.731	2.534.931.000	949.225.731	2.257.806.547	567.026.852	60%	
852 - Superintendencia de Riesgos del Trabajo	8.250.000	1000.000	8.250.000	1000.000	8.032.624	851.096							8.250.000	1000.000	8.250.000	1000.000	8.032.624	851.096	85%	
881 - Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATSA)	20.477.000		20.477.000		387.764		6.300.000		6.300.000	0	26.577.000		20.477.000		20.477.000	0	387.764	0	0	0
902 - Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"	27.446.008	21.755.808	33.446.008	28.255.808	21528.062	27.454.386							27.446.008	21.755.808	33.446.008	28.255.808	21528.062	27.454.386	97%	
903 - Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommariva	25.431.000	27.787.230	58.649.938	43.031.753	22.083.774	30.987.635							25.431.000	27.787.230	58.649.938	43.031.753	22.083.774	30.987.635	44%	
904 - Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica	34.738.500	33.503.868	34.738.500	24.373.768	34.286.873	30.834.357							34.738.500	33.503.868	34.738.500	24.373.768	34.286.873	30.834.357	83%	
905 - Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante	2.624.000	5.365.979	6.667.360	5.365.979	4.885.886	2.795.500	0	3570.101	3.730.101	2.624.000	5.365.979	6.667.360	5.365.979	6.667.360	5.365.979	4.885.886	3.505.601	3.505.601	83%	
906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán	49.695.348	49.253.809	65.778.250	50.833.609	50.039.467	42.439.742							49.695.348	49.253.809	65.778.250	50.833.609	50.039.467	42.439.742	85%	
908 - Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas	57.535.000	48.780.472	57.535.000	55.780.472	32.261.945	53.090.069							57.535.000	48.780.472	57.535.000	55.780.472	32.261.945	53.090.069	96%	
909 - Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	30.300.000	35.576.820	22.541.735	30.486.820	30.532.771	9.659.454							30.300.000	35.576.820	22.541.735	30.486.820	30.532.771	9.659.454	92%	
930 - Instituto Nacional de Rehabilitación Psico-física del Sur Dr. Juan Olimio Tesone	8.409.443	7.609.429	30.409.443	9.372.396	2.236.434	7.209.487							8.409.443	7.609.429	30.409.443	9.372.396	2.236.434	7.209.487	77%	
932 - Servicio Nacional de Rehabilitación	2.400.000	7.970.282	2.826.823	5.993.699	1.779.473	4.324.386	0	1875.537	3.781.772	5.309.280	3.479.232	5.309.280	2.400.000	9.845.839	6.608.595	11.302.979	5.258.705	9.633.666	85%	
934 - Superintendencia de Servicios de Salud	65.331.000	22.561.540	365.331.000	55.301.540	2.684.553	40.889.964							65.331.000	22.561.540	365.331.000	55.301.540	2.684.553	40.889.964	74%	
938 - Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP)		0		250.523		0							0	0		0	250.523	0	0	0
Suma Total	46.543.696.328	65.474.589.568	52.570.289.727	65.797.864.038	43.233.436.993	59.450.472.861	114.325.832.748	133.842.902.567	122.780.404.038	131.985.689.783	130.309.815.993	126.389.220.972	160.669.522.828	109.337.486.084	175.350.687.697	107.783.547.770	153.323.252.987	105.839.687.782		94%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°13: Programas más significativos

INVERSION REAL DIRECTA:

Cod. y Desc. Programa	\$ Cred. Inicial	\$ Cred. Vigente	%CV	\$ Devengado
SAF 604-PG. 22 - Construcciones	9.846.389.789	12.809.469.854	19,47%	12.785.123.962
SAF 604-PG. 40 - Obras en Corredores Viales	5.383.668.377	7.090.460.249	10,78%	7.090.851.022
SAF 327-PG.62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario	3.372.824.316	6.927.951.514	10,53%	6.925.116.438
SAF 327-PG. 61 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	3.212.467.919	4.668.181.417	7,09%	4.667.727.141
SAF 604-PG. 16 - Mantenimiento	4.069.128.327	4.426.571.594	6,73%	4.349.454.591
SAF 604-PG. 26 - Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento	5.085.689.172	4.421.289.768	6,72%	4.338.811.761
Inferiores al 3%	34.504.415.617	25.453.933.591	38,69%	19.293.381.895
TOTAL PROGRAMAS MAS SIGNIFICATIVOS	65.474.583.517	65.797.857.987	100,00%	59.450.466.810

Fuente: Base de datos e-SIDIF

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

Cod. y Desc. Programa	Crédito Inicial	Crédito Vigente	%CV	Devengado Consumido
356-Obligaciones a Cargo del Tesoro PG93-Fondo Federal Solidario	30.386.000.000	25.727.000.000	19,49%	23.968.088.063
325-Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios) PG38-Acciones de	15.211.879.928	15.163.361.483	11,49%	15.089.748.037
356-Obligaciones a Cargo del Tesoro PG88-Asistencia Financiera a Empresas Públicas y	4.238.770.000	12.333.645.466	9,34%	12.319.228.976
356-Obligaciones a Cargo del Tesoro PG95-Otras Asistencias Financieras a Empresas	10.729.884.000	9.613.120.000	7,28%	9.535.230.000
356-Obligaciones a Cargo del Tesoro PG87-Asistencia Financiera a Empresas Públicas y	8.127.360.000	7.631.296.255	5,78%	7.631.296.254
325-Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios) PG37-Acciones	6.864.499.431	7.153.622.726	5,42%	7.153.622.726
Inferiores al 5%	58.284.503.157	54.363.637.802	41,19%	50.692.000.865
TOTAL PROGRAMAS MAS SIGNIFICATIVOS	133.842.896.516	131.985.683.732	100,00%	126.389.214.921

Fuente: Base de datos e-SIDIF



Auditoría General de la Nación

Anexo N°14: Inversión Pública por ubicación geográfica

Cod. y Desc. Ubicación Geográfica	INVERSIÓN PÚBLICA													
	\$Cred. Inicial	\$Cred. Vigente							\$Devengado				\$Devengado per cápita	
		2017	2017	RD/INV P.B.	TC/INV P.B.	%CV 2017	%CV 2016	var %CV Interanual	2016	2017	%Ejecución	var 2017/2016	POBLACION Censo 2010	Devengado/ POBLACION
02 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	27.997.113.137	31.660.489.549	37,33%	62,67%	16,01%	18,95%	-2,94%	41.006.893.002	42.358.476.329	133,79%	3,30%	2.890.151	14.656	
06 - Provincia de Buenos Aires	43.605.063.570	33.574.522.269	41,82%	58,18%	16,98%	14,30%	2,67%	22.066.127.913	27.900.759.281	83,10%	26,44%	15.625.084	1.786	
10 - Provincia de Catamarca	2.582.560.109	2.282.340.433	8,28%	91,72%	1,15%	1,50%	-0,35%	1.785.101.231	2.635.757.280	115,48%	47,65%	367.828	7.166	
14 - Provincia de Córdoba	7.433.471.336	7.714.928.613	23,55%	76,45%	3,90%	3,86%	0,04%	5.929.096.971	8.783.160.134	113,85%	48,14%	3.308.876	2.654	
18 - Provincia de Corrientes	3.443.033.284	3.276.203.770	24,25%	75,75%	1,66%	1,20%	0,45%	2.371.142.697	3.011.848.516	91,93%	27,02%	992.595	3.034	
22 - Provincia del Chaco	5.357.072.989	5.296.961.020	17,60%	82,40%	2,68%	2,62%	0,05%	4.909.177.963	5.738.726.833	108,34%	16,90%	1.055.259	5.438	
26 - Provincia del Chubut	3.023.309.357	2.149.559.663	47,42%	52,58%	1,09%	1,14%	-0,05%	1.919.893.654	2.274.451.624	105,81%	18,47%	509.108	4.468	
30 - Provincia de Entre Ríos	4.314.960.645	3.704.076.581	29,27%	70,73%	1,87%	2,26%	-0,39%	3.913.649.140	4.557.450.931	123,04%	16,45%	1.235.994	3.687	
34 - Provincia de Formosa	3.626.273.248	3.808.632.320	19,67%	80,33%	1,93%	1,87%	0,06%	3.803.938.768	4.016.831.620	105,47%	5,60%	530.162	7.577	
38 - Provincia de Jujuy	5.340.061.962	3.513.830.036	25,53%	74,47%	1,78%	1,86%	-0,09%	2.417.608.573	3.503.200.883	99,70%	44,90%	673.307	5.203	
42 - Provincia de La Pampa	1.696.208.170	1.421.337.684	27,44%	72,56%	0,72%	0,68%	0,04%	1.411.564.158	1.532.882.626	107,85%	8,59%	318.951	4.806	
46 - Provincia de La Rioja	3.944.655.813	4.158.925.414	17,19%	82,81%	2,10%	1,72%	0,38%	3.472.121.315	4.320.437.507	103,88%	24,43%	333.642	12.949	
50 - Provincia de Mendoza	4.397.853.069	4.608.720.623	38,99%	61,01%	2,33%	2,01%	0,32%	3.641.232.263	4.987.822.347	108,23%	36,98%	1.738.929	2.868	
54 - Provincia de Misiones	2.738.548.605	2.820.082.554	20,75%	79,25%	1,43%	1,85%	-0,42%	3.207.887.753	3.980.502.057	141,15%	24,08%	1.101.593	3.613	
58 - Provincia del Neuquén	3.471.520.027	2.773.002.915	44,41%	55,59%	1,40%	1,32%	0,09%	1.977.288.402	3.148.939.642	113,56%	59,26%	551.266	5.712	
62 - Provincia de Río Negro	4.798.967.463	4.944.399.564	71,88%	28,12%	2,50%	2,62%	-0,12%	4.030.727.725	4.916.227.210	99,43%	21,97%	638.645	7.698	
66 - Provincia de Salta	4.968.641.553	3.419.118.851	30,76%	69,24%	1,73%	2,12%	-0,39%	4.479.588.556	4.431.979.168	129,62%	-1,06%	1.214.441	3.649	
70 - Provincia de San Juan	3.364.158.165	4.446.224.937	15,49%	84,51%	2,25%	1,50%	0,75%	3.756.054.554	4.044.124.576	90,96%	7,67%	681.055	5.930	
74 - Provincia de San Luis	1.702.410.009	2.093.237.300	52,94%	47,06%	1,06%	0,63%	0,43%	1.014.802.564	1.822.690.573	87,08%	79,61%	432.310	4.216	
78 - Provincia de Santa Cruz	1.465.416.284	1.619.621.477	15,09%	84,91%	0,82%	1,89%	-1,07%	1.799.352.126	1.678.665.318	103,65%	-6,71%	273.964	6.127	
82 - Provincia de Santa Fe	7.352.631.259	5.343.421.592	27,79%	72,21%	2,70%	2,47%	0,23%	4.699.265.810	6.339.147.544	118,63%	34,90%	3.194.537	1.984	
86 - Provincia de Santiago del Estero	3.419.055.228	3.212.808.273	7,03%	92,97%	1,62%	2,98%	-1,36%	4.101.090.800	3.764.948.101	117,19%	-8,20%	874.006	4.308	
90 - Provincia de Tucumán	4.070.903.591	3.879.757.829	20,46%	79,54%	1,96%	1,51%	0,45%	2.553.491.014	3.623.532.145	93,40%	41,91%	1.448.188	2.502	
94 - Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	1.475.567.653	1.330.277.554	46,12%	53,88%	0,67%	0,79%	-0,12%	1.428.292.397	1.733.619.500	130,32%	21,38%	127.205	13.629	
96 - Interprovincial	21.716.407.448	27.664.805.249	53,33%	46,67%	13,99%	10,40%	3,59%	11.903.210.027	16.890.035.414	61,05%	41,89%			
97 - Nacional	21.544.253.169	26.851.006.489	11,29%	88,71%	13,58%	15,15%	-1,57%	9.227.861.840	13.429.081.180	50,01%	45,53%			
98 - Binacional	334.693.025	46.323.816	100,00%	0,00%	0,02%	0,03%	-0,01%	48.354	2.238	0,00%	-95,37%			
99 - No Clasificado	132.669.865	168.925.344	83,74%	16,26%	0,09%	0,76%	-0,68%	496.737.368	414.379.138	245,30%	-16,58%			
TOTAL	199.317.480.033	197.783.541.719	33,27%	66,73%	100,00%	100,00%	0,00%	153.323.246.939	185.839.681.731	93,96%	21,21%	40.117.096	4.632	

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

PROVINCIAS PLAN BELGRANO	TOTAL OBRAS					TOTAL OBRAS SIN EJECUCIÓN		
	Q	CREDITO INICIAL	CREDITO VIGENTE	%CV	DEVENGADO	QSE	%QSE	CREDITO VIGENTE
Provincia de Corrientes	47	784.084.783	790.668.769	9,69%	769.374.384	24	51,06%	161.694.573
Provincia de Formosa	31	680.281.356	737.301.869	9,04%	740.470.026	21	67,74%	14.804.364
Provincia de Jujuy	48	1.901.070.034	895.826.063	10,98%	894.151.571	19	39,58%	9.049.733
Provincia de La Rioja	29	827.126.855	714.047.596	8,75%	708.384.009	13	44,83%	41.226.382
Provincia de Misiones	54	543.165.921	575.563.456	7,06%	665.119.400	27	50,00%	23.376.863
Provincia de Salta	64	739.485.567	1.048.023.144	12,85%	1.175.386.917	29	45,31%	31.440.076
Provincia de Santa Fe	59	1.716.076.711	1.479.443.249	18,14%	1.888.619.238	24	40,68%	18.153.528
Provincia de Santiago del Estero	27	245.096.672	221.222.195	2,71%	233.727.795	12	44,44%	179.957
Provincia de Tucumán	67	867.471.493	785.220.829	9,63%	635.381.376	34	50,75%	132.048.348
Provincia del Chaco	45	1.204.159.049	909.899.297	11,15%	792.052.719	16	35,56%	27.228.940
TOTAL	471	9.508.018.441	8.157.216.467	17,04%	8.502.667.435	219	46,50%	459.202.764
IRD-Obras	1742	51.181.396.156	47.866.499.962		45.098.470.602	840		

Q: Cantidad de obras/QSE: Cantidad de obras sin Ejecución Financiera Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°15: Inversión Pública por Fuente de financiamiento

Cod. y Desc. Fuente Financiamiento	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						INVERSION REAL DIRECTA						INVERSION PUBLICA									
	\$Cred. Inicial		\$Cred. Vigente		\$Devengado		\$Cred. Inicial		\$Cred. Vigente		\$Devengado		\$Cred. Inicial		\$Cred. Vigente			\$Devengado				
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	%cv	2017	%cv	2016	2017	%Ejecución	VAR 2017-2016
11- Tesoro Nacional	90.805.397.946	92.470.873.760	87.745.531.498	89.806.855.384	81.805.411.455	87.351.270.799	35.621.876.971	51.290.347.715	316.827.047	44.436.99.943	27.327.045.402	40.778.545.971	26.427.274.917	43.761.221.475	19.361.805.545	68,07%	34.243.055.127	67,87%	19.132.456.857	27.929.816.770	95,30%	17,22%
12- Recursos Propios	25.722.000	103.659.995	663.082.277	508.751.763	536.710.422	463.881.041	1.903.471.403	1.288.353.873	1.994.006.23	1.863.491.593	988.830.774	1.301.472.597	2.029.193.403	1.392.018.868	2.657.088.400	152%	2.372.243.356	120%	1525.541.96	1.765.353.639	74,42%	15,72%
13- Recursos con Afectación Específica	1462.233.927	1507.100.179	1.878.421.107	2.561.793.388	1.354.464.177	1.779.090.262	880.689.319	3.036.723.962	1.114.697.394	1.814.098.261	329.679.116	1.204.994.885	2.342.923.246	4.543.824.141	2.993.118.501	171%	4.375.891.459	2,21%	1.684.143.293	2.984.085.148	68,19%	77,19%
14 - Transferencias Internas	554.225.000	839.229.453	464.645.262	1.242.503.548	242.081.000	1.127.258.026	2.012.377.437	3.432.271.106	4.030.410.000	4.839.908.068	2.841.120.179	4.818.546.649	2.566.592.437	4.271.500.559	4.495.055.262	2,56%	6.082.411.616	3,08%	3.083.201.179	5.945.804.676	97,75%	92,85%
15- Crédito Interno	7.818.973.581	16.312.289.079	17.470.224.929	20.692.726.938	14.452.254.829	19.687.806.019	0	100.000	6.441.475.078	3.911.188.333	6.016.565.108	3.485.334.767	7.818.973.581	16.312.289.079	23.911.700.007	13,64%	24.602.915.271	12,44%	20.468.819.937	23.173.140.786	94,19%	13,21%
TOTAL FUENTE INTERNA	100.766.542.454	111.233.152.466	108.221.905.073	114.812.630.631	98.390.921.884	110.209.306.148	40.418.415.130	59.047.796.656	45.196.862.642	56.863.886.198	37.503.240.579	51.588.894.871	111.184.957.584	170.280.949.122	153.419.767.715	87,49%	171.676.516.829	86,80%	135.894.162.463	161.798.201.018	94,25%	19,06%
2.1- Transferencias Externas	12.800.000	59.267.082	12.800.000	120.457.960	2.996.373	18.849.390	28.131.372	87.584.827	166.156.995	97.315.732	120.943.457	26.577.561	140.931.372	146.851.909	178.956.995	0,10%	217.773.692	0,11%	123.939.830	145.426.951	66,78%	17,34%
2.2 - Crédito Externo	13.346.484.246	22.550.476.968	14.545.682.897	17.052.595.141	11.715.891.689	16.061.059.383	5.997.143.578	6.339.202.034	7.207.264.042	8.836.656.057	5.589.252.958	7.834.994.378	19.343.627.824	28.889.679.002	21.752.956.939	12,41%	25.889.251.198	13,09%	17.305.144.646	23.886.053.761	92,30%	38,09%
TOTAL FUENTE EXTERNA	13.359.284.246	22.609.744.050	14.558.492.897	17.173.053.101	11.718.888.061	16.179.908.773	6.125.274.950	6.426.786.861	7.373.421.037	8.933.971.789	5.710.196.415	7.861.571.939	19.484.559.196	29.036.530.911	21.931.919.934	12,51%	26.107.024.890	13,20%	17.429.084.476	24.041.480.712	92,09%	37,94%
Suma Total	114.125.826.700	133.842.896.516	122.780.397.970	131.985.683.732	110.109.809.945	126.389.214.921	46.543.690.080	65.474.583.517	52.570.283.679	65.797.857.987	43.213.436.993	59.450.466.810	130.669.516.780	199.317.480.033	175.350.681.649	100,00%	197.783.541.718	100,00%	153.323.246.939	185.839.681.731	93,96%	212,1%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°16: Inversión Pública por Finalidad y Función

Cod. y Desc. Finalidad		Cod. y Desc. Función	INVERSION REAL DIRECTA						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						INVERSION PUBLICA									
			S Cred. Inicial		S Cred. Vigente		S Devengado		S Cred. Inicial		S Cred. Vigente		S Devengado		S Cred. Inicial		S Cred. Vigente		S Devengado					
			2.017	2.017	VAR 2017/2016	%CV	2.017	VAR 2017/2016	%Devengado	2.017	2.017	VAR 2017/2016	%CV	2.017	VAR 2017/2016	%Devengado	2.017	%CI	2.017	%CV2017	VAR PARTICIPACION	2.017	VAR 2017/2016	%Devengado
1- ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	1- Legislativa	75.899.910	102.388.888	-57,52%	0,20%	75.736.307	-74,23%	0,0%						75.899.910	0,04%	102.388.888	0,07%	-0,11			75.736.307	-74,23%	0,04%	57,23%
	2- Judicial	485.708.833	606.036.346	-140%	0,92%	372.413.777	54,30%	0,63%	10.790.400	0	-100,00%	0,00%	0		0,00%	496.498.563	0,25%	606.036.346	0,33%	-0,04	372.413.777	54,30%	0,20%	61,45%
	3 - Dirección Superior Electoral	1638.101.561	1400.200.365	268,08%	2,1%	1004.430.067	260,02%	1,69%	7.327.332	4.400.000	-99,07%	0,00%	4.400.000	-98,83%	0,00%	1625.440.893	0,82%	1404.600.365	0,73%	0,8	1008.830.067	53,84%	0,54%	71,82%
	4 - Relaciones Exteriores	55.228.444	55.574.382	-66,20%	0,08%	38.712.924	-7,95%	0,07%					-100,00%	0,00%		55.228.444	0,03%	55.574.382	0,03%	-0,07	38.712.924	-13,56%	0,02%	69,66%
	5 - Relaciones Interiores	10.350.946	420.583.301	4,86%	0,64%	363.287.962	213%	0,63%	32.505.781.000	28.474.810.500	23,58%	2157%	26.707.346.10	20,69%	21,0%	32.619.1946	16,37%	28.895.396.801	14,63%	123	27.070.634.072	20,70%	14,57%	93,68%
	6 - Administración Fiscal	80.270.233	107.436.632	-37,49%	0,36%	59.765.097	28,32%	0,1%	0	3.400.000		0,00%	3.400.000		0,00%	80.270.233	0,04%	100.836.632	0,06%	-0,04	61.855.097	35,62%	0,03%	56,99%
	7 - Control de la Gestión Pública	22.758.000	22.258.000	-17,50%	0,03%	16.776.654	-25,8%	0,03%					0,00%		0,00%	22.758.000	0,03%	22.258.000	0,03%	0,00	16.776.654	-25,8%	0,03%	75,37%
	8 - Información y Estadística Básicas	107.891.324	264.531.725	156,1%	0,40%	158.121.593	260,39%	0,27%					0,00%		0,00%	107.891.324	0,08%	264.531.725	0,13%	0,07	158.121.593	260,39%	0,09%	59,77%
Total 1- ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL		2.639.220.581	3.009.098.739	38,35%	4,57%	2.089.242.383	64,68%	3,53%	32.523.898.732	28.482.613.500	20,78%	21,58%	26.715.346.110	18,69%	21,34%	35.343.310.313	17,63%	31.491.622.239	15,92%	123	28.804.388.493	21,15%	15,50%	91,47%
2- SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1- Defensa	134.971.124	1690.797.508	81,22%	2,57%	1030.941.930	32,04%	1,70%	4.450.817	50.850.317	10,02%	0,04%	50.400.000	99,24%	0,04%	134.971.124	0,58%	1741647.695	0,88%	0,33	1061341.930	34,81%	0,57%	60,94%
	2- Seguridad Interior	1735.480.657	2.887.069.849	-20,88%	4,39%	1883.202.521	-23,49%	3,17%	103.070.910	245.734.329	-30,64%	0,8%	188.915.930	-19,32%	0,18%	1839.051.067	0,92%	3.122.804.078	1,58%	-0,70	2.022.138.451	-23,22%	1,09%	64,55%
	3 - Sistema Penal	2.486.838.965	708.156.639	-218,7%	1,08%	379.322.582	815,2%	0,64%	0	538.002.854	820,97%	0,4%	485.397.651	736,89%	0,38%	2.486.838.965	1,25%	1246.159.493	0,63%	0,08	864.720.233	348,65%	0,47%	69,39%
	4 - Inteligencia	22.005.285	22.739.335	100,48%	0,03%	10.316.525	-6,39%	0,02%				0,00%			0,00%	22.005.285	0,01%	22.739.335	0,01%	0,01	10.316.525	-6,39%	0,01%	45,37%
Total 2- SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		5.389.295.531	5.308.763.331	-3,48%	8,07%	3.283.783.538	-2,64%	5,52%	108.021.097	834.587.370	90,55%	0,82%	674.712.581	104,10%	0,53%	5.497.336.628	2,76%	6.343.350.701	3,12%	-0,28	3.958.497.129	9,10%	2,13%	64,44%
3- SERVICIOS SOCIALES	1- Salud	720.823.934	597.012.394	-35,54%	0,9%	463.763.655	28,17%	0,78%	945.145.021	834.945.747	-38,27%	0,63%	792.299.617	-38,48%	0,63%	1665.968.935	0,84%	1431959.141	0,72%	-0,58	1256.063.272	-23,87%	0,68%	87,72%
	2- Promoción y Asistencia Social	157.296.873	295.988.494	133,20%	0,45%	128.748.867	264,24%	0,22%	6.635.860.311	10.257.380.692	63,20%	7,77%	9.974.710.390	73,62%	7,89%	6.793.857.814	4,43%	10.553.369.386	5,34%	168	10.103.462.057	74,79%	5,44%	95,74%
	3- Seguridad Social	967.785.063	964.746.727	105,85%	1,47%	572.310.076	54,22%	0,96%				0,00%			0,00%	967.785.063	0,49%	964.746.727	0,49%	0,22	572.310.076	54,22%	0,33%	59,32%
	4- Educación y Cultura	8.880.317.741	2.839.882.733	-28,79%	4,32%	2.098.092.057	-41,58%	3,53%	12.350.886.317	10.948.737.607	21,1%	8,30%	10.296.772.980	41,90%	8,15%	21231203.938	10,65%	13.788.620.340	6,97%	-0,46	12.394.865.037	14,26%	6,67%	89,89%
	5 - Ciencia y Técnica	3.801.829.305	5.333.524.652	18,33%	8,18%	4.662.563.389	23,62%	7,84%	95.091.107	483.776.893	-42,12%	0,37%	467.012.652	-28,40%	0,37%	3.896.920.412	1,96%	5.817.301.545	2,94%	-0,11	5.129.575.841	15,95%	2,76%	88,38%
	6 - Trabajo	85.649.102	98.391.270	-37,87%	0,8%	68.987.586	-3,20%	0,12%	17.442.854	204.581.954	17,20%	0,8%	154.826.314	203,60%	0,1%	263.019.195	0,1%	302.973.124	0,15%	-0,04	233.810.899	86,22%	0,12%	77,17%
	7 - Vivienda y Urbanismo	440.100.679	3.228.859	398,42%	0,00%	2.969.831	447,83%	0,00%	8.121.909.815	17.554.006.019	11,5%	13,30%	17.481.889.961	19,86%	13,83%	10.564.091.494	9,38%	17.484.034.878	8,88%	-0,10	17.484.89.793	19,87%	9,43%	99,58%
	8 - Agua Potable y Alcantarillado	1095.872.592	1433.062.987	36,80%	2,88%	1413.526.650	718,9%	2,38%	15.087.522.018	14.965.962.239	132%	11,34%	14.932.800.059	5,33%	11,8%	16.183.394.605	8,12%	16.999.025.226	8,29%	-0,73	16.346.326.709	8,96%	8,80%	99,68%
Total 3 - SERVICIOS SOCIALES		16.149.675.269	11.565.838.116	3,04%	17,58%	9.410.962.911	4,27%	15,83%	55.415.938.338	55.249.992.051	14,63%	41,86%	54.109.634.773	23,65%	42,81%	71.565.613.587	35,91%	66.815.830.387	33,78%	-0,11	63.520.577.684	20,34%	34,18%	95,07%
4- SERVICIOS ECONOMICOS	1- Energía, Combustibles y Minería	66.896.980	770.83.85	900,42%	1,0%	588.541.122	2296,04%	0,99%	23.933.638.711	23.520.583.110	-8,52%	17,82%	21.392.970.828	-0,34%	16,93%	24.002.535.691	12,04%	24.290.746.505	12,28%	-2,42	21.981.115.951	2,29%	11,83%	90,49%
	2 - Comunicaciones	623.517.767	238.877.732	-32,52%	0,36%	144.927.969	-35,58%	0,24%	1296.161.453	1396.064.656	-11,48%	1,06%	1366.018.838	43,33%	1,08%	1919.679.220	0,96%	1634.942.388	0,83%	-0,27	1510.946.787	28,24%	0,83%	92,42%
	3 - Transporte	37.670.988.277	42.202.368.213	37,82%	64,34%	41.882.345.137	51,06%	70,45%	8.655.898.109	17.214.469.357	-11,33%	13,04%	17.052.886.410	-2,42%	13,49%	54.324.886.386	27,26%	59.436.637.370	30,04%	151	58.935.231.529	30,38%	31,73%	99,39%
	4 - Ecología y Medio Ambiente	840.238.963	631.878.776	3,19%	0,96%	431.258.888	14,88%	0,73%	2.236.897.539	2.921.781.212	63,49%	2,23%	2.914.032.983	63,68%	2,33%	3.077.137.502	15,4%	3.553.659.988	18,0%	0,43	3.345.291.871	55,38%	1,80%	94,14%
	5 - Agricultura	393.483.479	725.131.680	-12,56%	1,10%	626.793.001	-8,24%	1,05%	804.693.409	1152.512.852	78,04%	0,87%	1025.258.347	96,23%	0,83%	1.188.176.888	0,60%	1.178.344.532	0,95%	0,11	1.652.015.148	37,04%	0,89%	87,95%
	6 - Industria	266.935.510	496.943.666	-22,03%	0,76%	391.54.165	52,34%	0,66%	810.083.105	1045.380.649	-22,93%	0,79%	982.388.727	-26,43%	0,78%	1077.018.645	0,54%	1542.324.335	0,78%	-0,31	1373.902.891	-13,73%	0,74%	89,08%
	7 - Comercio, Turismo y Otros Servicios	1443.124.817	821.999.346	35,14%	1,25%	576.372.746	103,57%	0,97%	59.686.101	167.698.975	147,65%	0,12%	156.184.341	186,14%	0,12%	1502.790.830	0,75%	989.688.171	0,50%	0,11	732.557.087	143,09%	0,39%	74,02%
	8 - Seguros y Finanzas	9.245.343	26.395.343	88,54%	0,04%	24.724.970	207,99%	0,04%				0,00%			0,00%			26.395.343	0,03%	0,01	24.724.970	207,99%	0,03%	93,67%
Total 4 - SERVICIOS ECONOMICOS		41.316.392.136	45.934.247.801	36,36%	69,78%	44.666.477.978	51,17%	75,13%	45.795.038.369	47.418.490.811	-6,23%	35,93%	44.889.740.457	2,99%	35,52%	87.111.430.505	43,70%	93.332.738.612	47,19%	-0,84	89.556.218.435	22,46%	48,19%	95,95%
Total		65.474.583.517	65.797.957.987	25,18%	100,00%	59.450.466.830	37,57%	100,00%	133.842.896.536	131.985.683.732	7,50%	100,00%	126.389.214.921	14,78%	100,00%	199.317.480.033	100,00%	197.783.541.739	100,00%	0,00	185.839.681.731	21,21%	100,00%	93,96%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°17: Transferencias de Capital por Beneficiario

Cod. y Desc. Principal	Cod. y Desc. Parcial	Cod. y Desc. Subparcial	\$ Cred. Inicial	\$ Cred. Vigente	%cv	\$ Devengado	%Ejecución
2 - Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital	1 - Transferencias a Personas	00000 - Transferencias a Personas	27.581.177	11.273.655	0,01%	6.797.840	60,30%
	2 - Transferencias a Instituciones de Enseñanza	09999 - Sin Discriminar	1.021.094	0	0,00%	0	sin CV SIN CI
	3 - Transferencias para Actividades Científicas o Académicas	02001 - Centros de Investigación del Sistema INTI	36.864.241	49.355.466	0,04%	270.890	0,55%
		02009 - ARGENTINA	0	0	0,00%	38.557.431	sin CV SIN CI
		02147 - Fundación Universidad Nacional de Cuyo	0	0	0,00%	750.000	sin CV SIN CI
		02158 - Fundación EMPREMIN	2.105.807	7.505.807	0,01%	7.505.807	100,00%
		02245 - Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear	0	3.000.000	0,00%	0	0,00%
		02369 - Fundación p/la Interacción de los Sistemas Productivo, Educativo, Científico Tecnológico	4.000.000	4.000.000	0,00%	4.000.000	100,00%
		02395 - INNOVA-T	2.500.000	1.755.000	0,00%	0	0,00%
		02401 - Laboratorios de Investig. Genética y Biología Molecular	16.996.175	16.996.175	0,01%	10.935.650	64,34%
		02404 - Laboratorios del Instituto de Física de La Plata	4.856.050	4.856.050	0,00%	6.500.000	133,85%
		02406 - Instituto de Investigaciones Ciencias Tecnológicas y Materiales	0	0	0,00%	1.900.000	sin CV SIN CI
		02409 - Laboratorio de Petrología Facultad Cs. Nat. de Salta	0	0	0,00%	5.000.000	sin CV SIN CI
		02412 - Centro Científico Tecnológico de Rosario	0	0	0,00%	300.000	sin CV SIN CI
		02434 - Fundación AHUEKNA	0	3.200.000	0,00%	0	0,00%
		02462 - Fundación Jorge E. KITTL	0	0	0,00%	1.755.000	sin CV SIN CI
		02474 - Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores	0	46.400.000	0,04%	46.400.000	100,00%
		09999 - Sin discriminar	59.086.047	150.611.888	0,11%	97.579.388	64,79%
	4 - Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro	02140 - Caritas Argentina	0	0	0,00%	3.731.372	sin CV SIN CI
		02143 - Salas de Teatro	11.216.440	83.106.440	0,06%	78.505.987	94,46%
		02144 - Grupo de Teatro Independiente	145.560	145.560	0,00%	2.742.177	1883,88%
		02237 - Entidades Mutuales	4.983.400	66.332.370	0,05%	63.401.271	95,58%
		02493 - Fundación Catedral de la Fe	0	0	0,00%	14.366.205	sin CV SIN CI
		02494 - Sindicato de Conductores de Taxis de la Capital Federal	0	0	0,00%	13.467.659	sin CV SIN CI
		02495 - Hogar de Ancianos de Iglesias Evangélicas	0	0	0,00%	72.016	sin CV SIN CI
		02496 - Asociación Cooperadora del Instituto Saturnino Enrique Unzué	0	0	0,00%	7.359.785	sin CV SIN CI
		02497 - Centro de Análisis y Elaboración de Políticas Públicas	0	0	0,00%	1.975.185	sin CV SIN CI
		02504 - Asociación Raleña Por un Futuro en Marcha	0	0	0,00%	8.708.087	sin CV SIN CI
		02506 - Asociación Civil Habitat	0	0	0,00%	21.491.636	sin CV SIN CI
		02508 - Fundación Espartanos	0	0	0,00%	767.500	sin CV SIN CI
		02510 - Asociaciones Deportivas de Primer Grado - Ley 27.202 art. 20	0	9.016.000	0,01%	12.185.790	135,16%
		02511 - Asociaciones Deportivas de Segundo Grado - Ley 27.202 art. 20	0	0	0,00%	19.400.000	sin CV SIN CI
		02526 - Asociación Civil de los Trabajadores de la Economía Popular	0	0	0,00%	654.579	sin CV SIN CI
		02527 - Fundación Pro Vivienda Social	0	0	0,00%	6.680.515	sin CV SIN CI
		02528 - Asociación Cooperadora San Francisco de Asís	0	0	0,00%	925.457	sin CV SIN CI
		02529 - Fundación SOLYDAR	0	0	0,00%	274.471	sin CV SIN CI
		02530 - Centro de Investigación Libre y Solidario - CILSA	0	0	0,00%	1.464.100	sin CV SIN CI
		02531 - Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado - Todo para Ellos	0	0	0,00%	990.950	sin CV SIN CI
		02532 - Asociación Civil CHECAR	0	0	0,00%	1.002.715	sin CV SIN CI
		02533 - Asociación Civil Alegría	0	0	0,00%	551.933	sin CV SIN CI
		02535 - Taller Protegido "Villa Gobernador Gálvez"	0	0	0,00%	703.696	sin CV SIN CI
		02536 - Centro de Ayuda Integral al Discapacitado del Norte	0	0	0,00%	1.500.000	sin CV SIN CI
		02537 - Asociación Juefa de Deportistas Ciegos "Los Linces"	0	0	0,00%	182.050	sin CV SIN CI

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°17: Transferencias de Capital por Beneficiario

Cod. y Desc. Principal	Cod. y Desc. Parcial	Cod. y Desc. Subparcial	\$ Cred. Inicial	\$ Cred. Vigente	%cv	\$ Devengado	%Ejecución
2 - Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital	4 - Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro	02538 - Asociación Civil Pequeña Obra de la Divina Providencia	0	0	0,00%	300.842	sin CV SIN CI
		02539 - Biblioteca Bernardino Rivadavia	0	0	0,00%	491.810	sin CV SIN CI
		02540 - Asociación Talleres Productivos Ángeles de Chachi	0	0	0,00%	949.107	sin CV SIN CI
		02541 - Ovispado de San Isidro	0	0	0,00%	1.499.895	sin CV SIN CI
		02563 - Fundación Argentina de Afasia	0	0	0,00%	425.276	sin CV SIN CI
		02564 - Asociación Argentina de Padres Autistas APADEA	0	0	0,00%	1.109.000	sin CV SIN CI
		02569 - Asociación Civil de Personas con Capacidades Diferentes Sol Naciente	0	0	0,00%	492.800	sin CV SIN CI
		02571 - Asociación de Mujeres para Ayuda Solidaria	0	0	0,00%	3.851.470	sin CV SIN CI
		02572 - Centro de Día Hermandad	0	0	0,00%	1.038.975	sin CV SIN CI
		02573 - Fundación IPNA (Instituto Psicopedagógico de Nivelación Aranguren)	0	0	0,00%	803.915	sin CV SIN CI
		02575 - Centro de Terapia Integral para el Discapacitado Mental CETIDIM	0	0	0,00%	1.187.546	sin CV SIN CI
		02576 - Fundación Lesionado Medular	0	0	0,00%	1.062.600	sin CV SIN CI
		02578 - Asociación Civil Betania "Encuentro de Niños Especiales en Jesús	0	0	0,00%	749.582	sin CV SIN CI
		02581 - Centro Urdinarraín de Ayuda al Discapacitado	0	0	0,00%	601.641	sin CV SIN CI
		02582 - Fundación La Estación	0	0	0,00%	162.863	sin CV SIN CI
		02583 - Fundación Sagrada Familia	0	0	0,00%	1.568.223	sin CV SIN CI
		02591 - Centro para el Discapacitado Talita Kum	0	0	0,00%	1.175.522	sin CV SIN CI
		02593 - Fundación Cachypum	0	0	0,00%	1.190.045	sin CV SIN CI
		02595 - Parroquia San Juan Bautista	0	0	0,00%	0	sin CV SIN CI
		02596 - Asociación Cooperadora Dr. Pedro Radio del Hogar de Ancianos Dr. Domingo Cuneo	0	0	0,00%	885.159	sin CV SIN CI
		02603 - Asociación Pro Cultura Femenina-Colegios de Jesús María	0	0	0,00%	1.493.934	sin CV SIN CI
		02605 - Los Tilos Asociación Civil	0	0	0,00%	1.450.000	sin CV SIN CI
		02615 - Asociación Juvenil Araucana	0	0	0,00%	1.328.270	sin CV SIN CI
		02616 - Asociación la Rañatela	0	0	0,00%	0	sin CV SIN CI
		02617 - Fundación APADIM	0	0	0,00%	1.100.385	sin CV SIN CI
		02619 - Asociación de Apoyo para Personas Especiales	0	0	0,00%	1.287.901	sin CV SIN CI
		02621 - Asociación Síndrome de Down de Mar del Plata ADESMAR	0	0	0,00%	1.717.938	sin CV SIN CI
		02622 - Parroquia Espíritu Santo - Obispado de Quilmes	0	0	0,00%	339.659	sin CV SIN CI
		02624 - Fundación Catuaa en Crecimiento	0	0	0,00%	649.300	sin CV SIN CI
		02625 - Asociación para la Integración de Personas Especiales	0	0	0,00%	1.499.288	sin CV SIN CI
		02626 - Centro de Atención al Discapacitado FADyM	0	0	0,00%	1.497.000	sin CV SIN CI
		02627 - Asociación Civil NEU.DEDIS	0	0	0,00%	1.107.420	sin CV SIN CI
		02630 - Institución Privada para Multi-impedidos Sensoriales FATIMA	0	0	0,00%	1.500.000	sin CV SIN CI
		02632 - Asociación Civil Centro de Día Mimos	0	0	0,00%	1.498.209	sin CV SIN CI
		02633 - Congregación Religiosa Siervas de la Divina Providencia	0	0	0,00%	1.421.000	sin CV SIN CI
		02638 - Fundación David Nalbandian	0	0	0,00%	949.130	sin CV SIN CI
		02639 - Asociación de Padres y Amigos de Niños, Adolescentes Amnoriados	0	0	0,00%	878.895	sin CV SIN CI
		09999 - Sin discriminar	886.271.822	424.930.971	0,32%	212.921.542	50,11%
	5 - Transferencias a Cooperativas	02050 - Cooperativas Agropecuarias	7.260.826	43.305.001	0,03%	36.991.502	85,42%
		02053 - Cooperativas de Servicios Públicos	11.194.162	67.709.110	0,05%	95.407.378	140,91%
		02054 - Cooperativas de Trabajo	773.606.824	101.410.593	0,09%	54.043.658	53,29%
		02130 - Cooperativas de Crédito, Consumo y Vivienda	0	0	0,00%	1.600.000	sin CV SIN CI
		02238 - Federaciones y Confederaciones de Cooperativas	44.115.849	44.115.849	0,03%	31.734.799	71,94%
		09999 - Otras	6.635.401	59.448.718	0,05%	57.449.582	96,64%
	6 - Transferencias a Empresas Privadas	02507 - Fondo Concursable de Comunicación Audiovisual	0	0	0,00%	28.307.359	sin CV SIN CI
		02519 - Empresas Adjudicatarias Proyecto PERMER II	0	0	0,00%	47.965.216	sin CV SIN CI
		02525 - Empresas Adjudicatarias Proyectos Líneas Alta y Media Tensión	0	0	0,00%	424.822.664	sin CV SIN CI
		02565 - National Shipping S.A.	0	0	0,00%	111.069	sin CV SIN CI
		02566 - Flota Litoral S.R.L	0	0	0,00%	44.231	sin CV SIN CI
		09999 - Sin discriminar	5.100.723.349	3.790.229.501	2,87%	2.394.788.222	63,18%
Total 2 - Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital			7.001.164.224	4.988.704.154	3,78%	3.916.808.961	78,51%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°17: Transferencias de Capital por Beneficiario

Cod. y Desc. Principal	Cod. y Desc. Parcial	Cod. y Desc. Subparcial	\$ Cred. Inicial	\$ Cred. Vigente	%cv	\$ Devengado	%Ejecución
5 - Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional	6 - Transf.a Inst.Pub. Finan. para Financiar Gastos de Capital	00719 - Nación Servicios S.A.	200.000.000	51.101.125	0,04%	46.101.124	90,22%
		09999 - Sin discriminar	20.039.972	0	0,00%	0	sin CV SIN CI
	7 - Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital	00153 - Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de	4.000.000	4.000.000	0,00%	4.000.000	100,00%
		00181 - DIOXITEK S.A.	983.170.000	748.170.000	0,57%	748.170.000	100,00%
		00510 - Energía Argentina S.A.	1.862.000.000	4.691.875.466	3,55%	4.677.458.977	99,69%
		00557 - TANDANOR S.A.	29.900.000	29.900.000	0,02%	29.900.000	100,00%
		00570 - Contenidos Públicos S.E.	0	110.000.000	0,08%	110.000.000	100,00%
		00727 - Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.	45.000.000	45.000.000	0,03%	45.000.000	100,00%
		00735 - Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	398.000.000	398.000.000	0,30%	397.999.999	100,00%
		00752 - Correo Argentino	0	613.256.052	0,46%	613.256.052	100,00%
		00753 - Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.)	13.249.893.022	12.444.242.489	9,43%	12.442.402.487	99,99%
		00754 - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT)	737.802.112	41.893.200	0,03%	41.893.200	100,00%
		00755 - VENG S.A.	336.732.000	336.732.000	0,26%	336.732.000	100,00%
		00775 - Belgrano Cargas y Logística	1.020.000.000	917.898.000	0,70%	917.898.000	100,00%
		00776 - Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.)	60.000.000	74.900.000	0,06%	74.900.000	100,00%
		00777 - Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.	3.739.814.767	3.882.272.220	2,94%	3.773.202.293	97,19%
		00778 - Operador Ferroviario S.E.	3.556.560.000	2.993.293.889	2,27%	2.993.293.889	100,00%
		00794 - Nucleoeléctrica Argentina S.A.	5.556.000.000	7.439.600.000	5,64%	7.420.525.125	99,74%
		00799 - EDUCAR S.E.	94.200.000	159.200.000	0,12%	159.200.000	100,00%
		00860 - Radio Universidad Nacional del Litoral	1.200.000	1.200.000	0,00%	1.200.000	100,00%
	9 - Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNoF p/ Gs.de Capital	09999 - Sin discriminar	42.796.054	756.082	0,00%	0	0,00%
		00511 - Corporación del Mercado Central de Buenos Aires	37.490.331	133.990.331	0,10%	133.990.331	100,00%
		00556 - Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo	421.247.975	385.631.652	0,29%	385.631.652	100,00%
		00569 - Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria	0	113.314.392	0,09%	111.314.392	98,23%
		00764 - Cumplimiento Ley 26.078 - Artículo 69º	0	292.215.660	0,22%	0	0,00%
		00765 - Fondo para el Desarrollo Económico Argentino	400.000.000	292.065.752	0,22%	292.065.752	100,00%
		00801 - Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales	103.852.000	103.852.000	0,08%	25.962.000	25,00%
		00956 - Fondo Fiduciario de Capital Social	6.827.332	6.800.000	0,01%	6.800.000	100,00%
		00960 - Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal	2.000.000.000	2.800.000.000	2,12%	2.800.000.000	100,00%
		00965 - Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	199.894.500	240.544.500	0,18%	239.557.500	99,59%
		00967 - Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas (Ley N° 25.565)	5.111.231	65.349.311	0,05%	107.209.264	164,06%
		00969 - Fondo de Infraestructura Hídrica	156.874.299	1.031.285	0,00%	49.588	4,81%
		00981 - Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar	0	2.000.000.000	1,52%	2.000.000.000	100,00%
		00985 - Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor	0	0	0,00%	400.000.000	sin CV SIN CI
		09999 - Otros Fondos Fiduciarios	0	400.000.000	0,30%	981.697	0,25%
	Total 5 - Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional		35.268.405.595	41.818.085.406	31,68%	41.336.695.322	98,85%
6 - Transferencias a Universidades Nacionales	2 - Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital	00806 - Universidad de Buenos Aires	0	161.233.252	0,12%	325.729.410	202,02%
		00807 - Universidad Nacional de Catamarca	0	6.199.599	0,00%	12.943.614	208,78%
		00808 - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs. As.	0	7.120.718	0,01%	60.536.308	850,14%
		00809 - Universidad Nacional del Comahue	0	5.293.110	0,00%	27.371.958	517,12%
		00810 - Universidad Nacional de Córdoba	0	20.167.010	0,02%	102.925.805	510,37%
		00811 - Universidad Nacional de Cuyo	0	77.509.910	0,06%	100.206.502	129,28%
		00812 - Universidad Nacional de Entre Ríos	0	3.907.296	0,00%	34.202.607	875,35%
		00813 - Universidad Nacional de Formosa	0	4.048.429	0,00%	26.396.883	652,03%
		00814 - Universidad Nacional de General San Martín	0	48.855.941	0,04%	59.402.536	121,59%
		00815 - Universidad Nacional de General Sarmiento	0	4.228.766	0,00%	48.219.375	1140,27%
		00816 - Universidad Nacional de Jujuy	0	8.341.514	0,01%	28.565.024	342,44%
		00817 - Universidad Nacional de La Matanza	0	3.957.123	0,00%	4.643.323	117,34%
		00818 - Universidad Nacional de La Pampa	0	7.879.062	0,01%	13.545.218	171,91%
		00819 - Universidad Nacional de La Plata	0	19.935.956	0,02%	134.029.540	672,30%
		00820 - Universidad Nacional del Litoral	0	17.845.525	0,01%	39.436.463	220,99%
		00821 - Universidad Nacional de Lomas de Zamora	0	4.041.132	0,00%	31.185.903	771,71%
		00822 - Universidad Nacional de Luján	0	3.907.296	0,00%	23.118.336	591,67%
		00823 - Universidad Nacional de Mar del Plata	0	6.178.150	0,00%	10.205.153	165,18%
		00824 - Universidad Nacional de Misiones	0	5.052.076	0,00%	21.872.380	432,94%
		00825 - Universidad Nacional del Nordeste	0	4.581.168	0,00%	52.271.154	1141,00%
		00826 - Universidad Nacional de la Patagonia	0	4.291.403	0,00%	29.110.047	678,33%
		00827 - Universidad Nacional de Quilmes	0	3.873.132	0,00%	34.922.385	901,66%
		00828 - Universidad Nacional de Río Cuarto	0	7.087.089	0,01%	17.111.825	241,45%
		00829 - Universidad Nacional de Rosario	0	8.346.796	0,01%	29.710.531	355,95%
		00830 - Universidad Nacional de Salta	0	5.600.383	0,00%	27.067.203	483,31%
		00831 - Universidad Nacional de San Juan	0	6.641.079	0,01%	37.438.700	563,74%
		00832 - Universidad Nacional de San Luis	0	6.295.506	0,00%	30.430.054	483,36%
		00833 - Universidad Nacional de Santiago del Estero	0	5.773.616	0,00%	22.520.174	390,05%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°17: Transferencias de Capital por Beneficiario

Cod. y Desc. Principal	Cod. y Desc. Parcial	Cod. y Desc. Subparcial	\$ Cred. Inicial	\$ Cred. Vigente	%cv	\$ Devengado	%Ejecución
6 - Transferencias a Universidades Nacionales	2 - Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital	00834 - Universidad Nacional del Sur	0	6.980.392	0,01%	53.564.300	767,35%
		00835 - Universidad Tecnologica Nacional	0	8.208.113	0,01%	120.164.118	1463,97%
		00836 - Universidad Nacional de Tucumán	0	8.554.120	0,01%	34.062.653	398,20%
		00837 - Universidad Nacional de La Rioja	0	4.136.199	0,00%	5.229.109	126,42%
		00839 - Universidad Nacional de Lanús	0	3.593.438	0,00%	20.008.295	556,80%
		00840 - Universidad Nacional de Tres de Febrero	0	3.699.207	0,00%	57.636.710	1558,08%
		00841 - Universidad Nacional de Villa Maria	0	10.287.322	0,01%	23.384.109	227,31%
		00842 - Universidad Nacional de la Patagonia Austral	0	3.656.901	0,00%	8.079.556	220,94%
		00843 - Universidad Nacional de las Artes	0	3.584.207	0,00%	23.996.142	669,50%
		00845 - Universidad Nacional de Chilecito	0	6.758.207	0,01%	25.895.104	383,17%
		00846 - Universidad Nacional del Noroeste de la Pcia.de Buenos Aires	0	28.437.459	0,02%	45.343.164	159,45%
		00847 - Universidad Nacional de Rio Negro	0	32.155.135	0,02%	62.878.750	195,55%
		00848 - Universidades sin Discriminar	433.677.365	1.834.671.265	1,39%	1.500.000	0,08%
		00855 - Universidad Nacional de Chaco Austral	0	3.784.207	0,00%	3.901.807	103,11%
		00861 - Universidad Nacional de Villa Mercedes	0	291.703	0,00%	17.992.801	6168,19%
		00862 - Universidad Nacional de Avelaneda	0	3.338.114	0,00%	43.243.449	1295,45%
		00863 - Universidad Nacional del Oeste	0	3.415.374	0,00%	3.455.374	101,17%
		00864 - Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	0	3.175.114	0,00%	3.582.854	112,84%
		00865 - Universidad Nacional de Moreno	0	3.165.114	0,00%	20.910.677	660,66%
		00866 - Universidad Nacional Arturo Jauretche	0	3.417.635	0,00%	36.731.898	1074,78%
		00867 - Universidad Nacional José Clemente Paz	0	3.365.114	0,00%	25.461.618	756,63%
		00869 - Universidad Nacional de Hurlingham	0	3.416.464	0,00%	21.547.176	630,69%
		00871 - Universidad de Rafaela	0	538.704	0,00%	660.104	122,54%
		00872 - Universidad de la Defensa Nacional	6.964.409	8.398.568	0,01%	9.869.247	117,51%
		00873 - Universidad Nacional de San Antonio de Areco	0	12.641.703	0,01%	13.142.767	103,96%
		00875 - Universidad Pedagógica Nacional	0	21.359.614	0,02%	21.423.614	100,30%
		Total 6 - Transferencias a Universidades Nacionales			440.641.774	2.493.221.420	1,89%
8 - Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	1 - Transferencias a Gobiernos Provinciales	02391 - Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario	30.742.071	5.696.464	0,00%	5.696.464	100,00%
		03001 - Administración central provincial	57.882.037.002	59.809.439.841	45,32%	56.434.319.099	94,36%
		03002 - Organismos descentralizados provinciales	0	18.000.000	0,01%	18.000.000	100,00%
		03003 - Instituciones de seguridad social provinciales	0	0	0,00%	45.583.128	sin CV SIN C
		03009 - Otros organismos provinciales	8.636.265.916	6.662.742.089	5,05%	7.009.126.673	105,20%
	2 - Transferencias a Instituciones Púb. Financieras Provinciales	03308 - Corporación para el Desarrollo de la Cuenta de Pozuelos	0	0	0,00%	1.454.897	sin CV SIN C
		09999 - Sin discriminar	247.029.963	0	0,00%	0	sin CV SIN C
	3 - Transferencias a Empresas Púb. no Financieras Provinciales	03311 - Mercado Concentrador de Neuquén	0	28.580.126	0,02%	0	0,00%
		09999 - Sin discriminar	5.730.751.365	351.953.986	0,27%	332.448.549	94,46%
	4 - Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales	03112 - Educación secundaria	0	0	0,00%	972.850	sin CV SIN C
		03115 - Educación general básica	10.029.965	0	0,00%	0	sin CV SIN C
		03119 - Educación sin discriminar	891.000.000	3.114.465.609	2,36%	3.074.101.680	98,70%
		02391 - Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario	190.068.482	103.094.622	0,08%	103.094.621	100,00%
		03313 - Programa de Desarrollo de Recursos Fisicos Educativos	0	0	0,00%	21.359.365	sin CV SIN C
	6 - Transferencias a Gobiernos Municipales	04051 - Municipio de Campana	0	0	0,00%	39.633.710	sin CV SIN C
		04084 - Coronel Suárez	0	0	0,00%	0	sin CV SIN C
		04105 - Municipio de Escobar	0	1	0,00%	0	0,00%
		04156 - General Pueyrredón	0	0	0,00%	0	sin CV SIN C
		04162 - General San Martín	0	0	0,00%	50.491.499	sin CV SIN C
		04201 - La Plata	0	0	0,00%	3.399.991	sin CV SIN C
		04258 - Morón	0	0	0,00%	31.451.743	sin CV SIN C
		04288 - Municipio de Pilar	0	0	0,00%	61.095.000	sin CV SIN C
		04393 - Municipaldad de Vicente Lopez	0	0	0,00%	35.400.000	sin CV SIN C
		04541 - Municipalidad de Corrientes	0	0	0,00%	0	sin CV SIN C
	7 - Transferencias a Instituciones Púb. Financieras Municipales	05537 - San Miguel de Tucumán	0	0	0,00%	0	sin CV SIN C
		09999 - Sin discriminar	15.963.112.942	11.905.603.939	9,02%	11.126.106.167	93,45%
		00000 - Transferencias a Instituciones Púb. Financieras Municipales	80.019.913	0	0,00%	0	sin CV SIN C
		00000 - Transferencias a Empresas Púb. No Financieras Municipales	1.243.889.970	0	0,00%	0	sin CV SIN C
		Total 8 - Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	90.904.947.589	81.999.576.677	62,13%	78.393.735.436	95,60%
9 - Transferencias al Exterior	7 - Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de Capital	01445 - Programa Nacional Unidas para el Desarrollo - PNUD	60.000.000	85.800.000	0,07%	65.488.351	76,33%
		01534 - Org. de Estados Iberoam. para la Educ., la Cienc. y la Cult.	35.000.000	109.656.063	0,08%	99.181.063	90,45%
		01581 - Comité Internacional de la Cruz Roja	0	0	0,00%	0	sin CV SIN C
		01822 - Organizacion Internacional de Migraciones	0	10.000.000	0,01%	10.000.000	100,00%
		06000 - Organizacion de Estados Iberoamericanos	0	17.000.000	0,01%	22.988.310	135,23%
		06001 - Organizacion Internacional para las Migraciones (OIM)	0	8.000.000	0,01%	8.000.000	100,00%
		06054 - Proyecto UNOPS - ARG/08/R54	0	0	0,00%	1.200.000	sin CV SIN C
		06057 - Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas	0	413.512.671	0,31%	194.809.916	47,11%
		09999 - Sin discriminar	132.737.334	42.127.341	0,03%	251.523.755	597,06%
		Total 9 - Transferencias al Exterior	227.737.334	686.096.075	0,52%	653.191.395	95,20%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			133.842.896.516	131.985.683.732	100,00%	126.389.214.921	95,76%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°18 Transferencias de Capital Sin Discriminar

Por Beneficiarios:

Descripción	\$Cred. Inicial	\$Cred. Vigente	%CV	\$Devengado	%Ejecución
Transferencias a Gobiernos Municipales	15.963.112.942	11.905.603.939	69,52%	11.126.106.167	93,45%
Transferencias a Empresas Privadas	5.100.723.349	3.790.229.501	22,13%	2.394.788.222	63,18%
Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro	886.271.822	424.930.971	2,48%	212.921.542	50,11%
Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital	0	400.000.000	2,34%	981.697	0,25%
Transferencias a Empresas Púb. no Financieras Provinciales	5.730.751.365	351.953.986	2,06%	332.448.549	94,46%
Transferencias para Actividades Científicas o Académicas	59.086.047	150.611.888	0,88%	97.579.388	64,79%
Transferencias a Cooperativas	6.635.401	59.448.718	0,35%	57.449.582	96,64%
Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de Capital	132.737.334	42.127.341	0,25%	251.523.755	597,06%
Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital	42.796.054	756.082	0,00%	0	
Transferencias a Instituciones de Enseñanza	1.021.094	0	0,00%	0	
Transf.a Inst.Pub. Finan. para Financiar Gastos de Capital	20.039.972	0	0,00%	0	
Transferencias a Instituciones Púb. Financieras Provinciales	247.029.963	0	0,00%	0	
Total TC SIN DISCRIMINAR 2017	28.190.205.343	17.125.662.426	100,00%	14.473.798.901	84,52%
Total TC 2017	133.842.896.516	131.985.683.732	12,97%	126.389.214.921	95,76%
TC SIN DISCRIMINAR 2016	20.009.365.177	17.853.012.961		12.385.038.196	69,37%
Total TC 2016	114.125.826.700	122.780.397.970	14,54%	110.109.809.945	89,68%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

Por Programas:

SAF	Servicio Administrativo Financiero Desc.	Pg	Programa Desc.	\$Crédito Inicial	\$Crédito Vigente	%CV	\$Devengado	%Ejecución
325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	37	Acciones del Programa "Habitat Nación"	1.549.603.882	4.650.919.243	27,16%	4.650.919.243	100,00%
328	Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios)	74	Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica	3.947.435.032	2.769.215.632	16,17%	2.216.366.828	80,04%
325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	38	Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano	11.980.890.189	1.676.554.796	9,79%	1.609.224.108	95,98%
328	Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios)	77	Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (BID N° 1764 y N° 2514 y CAF N° 8517 y N° 6566)	2.365.221.952	1.480.837.091	8,65%	475.065.217	32,08%
325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	72	Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas	810.415.520	1.166.900.255	6,81%	1.110.771.366	95,19%
327	Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	61	Coordinación de Políticas de Transporte Vial	391.000.000	914.038.255	5,34%	697.780.687	76,34%
604	Dirección Nacional de Vialidad	22	Construcciones	518.593.964	598.384.089	3,49%	598.384.088	100,00%
325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	17	Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios	430.000.000	530.000.000	3,09%	524.893.404	99,04%
613	Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	20	Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento	163.482.448	425.356.906	2,48%	414.351.469	97,41%
362	Ministerio de Producción	46	Acciones para el Desarrollo de Emprendedores	0	400.000.000	2,34%	0	0,00%
325	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	86	Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Munic	192.452.569	330.773.926	1,93%	214.246.923	64,77%
330	Ministerio de Educación y Deportes	37	Infraestructura y Equipamiento	242.009.872	322.074.260	1,88%	322.074.259	100,00%
345	Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales	21	Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales	94.278.000	275.068.151	1,61%	187.083.588	68,01%
328	Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios)	75	Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía	142.969.566	244.605.282	1,43%	240.146.059	98,18%
			Resto Programas	5.361.852.349	1.340.934.540	7,83%	1.212.491.662	90,42%
Total TC SIN DISCRIMINAR				28.190.205.343	17.125.662.426	100,00%	14.473.798.901	84,52%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°19

Variación del 100% del crédito asignado a IRD y TC por Programas

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Cod. y Desc. Servicio	Cod. y Desc. Programa	\$Cred. Inicial	Modificaciones	\$Cred. Vigente	Acto Adm	Fecha	Monto
305-Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete	47-Conservación y Promoción del Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdw ood-Programa Namuncurá	21.495.256	-21.495.256		DEA-774--2017	18/09/17	-21.495.256
317-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios)	61-Promoción del Desarrollo Sustentable	1.512.600	-1.512.600		RES-264--2017	24/05/17	-1.214.062
					RES-680--2017	25/09/17	-298.538
322-Ministerio de Turismo	16-Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional	2.195.682	-2.195.682		RES-463--2017	31/08/17	-2.195.682
327-Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	1-Actividades Centrales	8.000.000	-8.000.000		DFA-293--2017	16/05/17	-1.328.079
					RES-520--2017	19/07/17	-6.671.921
332-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)	4-Actividad Común a los Programas 18 y 23	10.790.400	-10.790.400		DEA-942--2017	23/10/17	-10.790.400
Resto de Programas		133.798.902.578	-1.813.218.846	131.985.683.732			
Total		133.842.896.516	-1.857.212.784	131.985.683.732			

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.

INVERSIÓN REAL DIRECTA

Cod. y Desc. Servicio	Cod. y Desc. Programa	\$Cred. Inicial	Modificaciones	\$Cred. Vigente	Acto Adm	Fecha	Monto
106 - Comisión Nacional de Actividades Espaciales	02 - Actividades Comunes a los Programas 16 y 17	20.000	-20.000	0	RES-1196--2017	12/09/17	-20.000
207 - Ente Nacional de Comunicaciones	20 - Control de Servicios Postales	524.220	-524.220	0	Resolución DFA-7100--2017	01/08/17	-478.000
					RES-3810--2017	01/11/17	-46.220
305 - Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete	47 - Conservación y Promoción del Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdw ood-Programa Namuncurá	8.065.000	-8.065.000	0	DEA-774--2017	18/09/17	-8.065.000
310 - Ministerio de Salud	36 - At. Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas	450.128	-450.128	0	DEA 942	23/10/17	-450.128
330 - Ministerio de Educación y Deportes	10 - Actividades Comunes a la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa	7.000.000	-7.000.000	0	Resolución DFA-2717--2017	22/06/17	-6.500.000
					Resolución DFA-3595--2017	19/09/17	-500.000
	19 - Desarrollo y Fortalecimiento de la Educación Física, la Recreación y la Infraestructura Deportiva	2.200.000	-2.200.000	0	ResoluciónDFA-2717--2017	22/06/17	-2.200.000
342 - SAF Apoyo - Autoridad Ouenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)	39 - Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR)	6.600.000	-6.600.000	0	DEA-942--2017	23/10/17	-6.600.000
Resto de Programas		65.449.724.169	348.133.818	65.797.857.987			
Total		65.474.583.517	323.274.470	65.797.857.987			

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°20: Inversión Real Directa – Programas sin ejecución financiera

Cod. y Desc. Servicio	Cod. y Desc. Programa	\$ Cred. Inicial	\$ Cred. Vigente	\$ Devengado
106 - Comisión Nacional de Actividades Espaciales	02 - Actividades Comunes a los Programas 16 y 17	20.000	0	0
	20 - Control de Servicios Postales	524.220	0	0
	22 - Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual	0	0	0
	23 - Enseñanza, Capacitación y Habilitación	0	500.000	0
	24 - Administración y Gestión de Proyecto Especiales	57.820	7.820	0
305 - Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete	47 - Conservación y Promoción del Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood-Programa Namuncurá	8.065.000	0	0
310 - Ministerio de Salud	17 - Atención de la Madre y el Niño	147.589.704	13.175.000	0
	20 - Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles	41.262	41.262	0
	24 - Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud	60.017	155.967	0
	25 - Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable	349.638	2.000	0
	36 - At. Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas	450.128	0	0
	39 - Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria	351.101	97.528	0
	44 - Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales	13.991.508	22.000	0
312 - Senado de la Nación	30 - Fortalecimiento Institucional	800.000	800.000	0
5 - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	20 - Planificación Territorial de la Inversión Pública	10.891.550	151.036	0
330 - Ministerio de Educación y Deportes	10 - Actividades Comunes a la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa	7.000.000	0	0
	17 - Desarrollo del Deporte y del Alto Rendimiento Deportivo	0	5.786.854	0
	18 - Asistencia Médico - Deportiva y Control Antidoping	1.900.000	281.000	0
	19 - Desarrollo y Fortalecimiento de la Educación Física, la Recreación y la Infraestructura Deportiva	2.200.000	0	0
	37 - Infraestructura y Equipamiento	390.000	2.454.750	0
332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)	32 - Protección de Víctimas de Violencias	23.379	23.379	0
	38 - Formación Universitaria en Derechos Humanos	323.712	323.712	0
342 - SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)	39 - Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR)	6.600.000	0	0
343 - Ministerio de Seguridad	39 - Políticas de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos	1.399.240	600.000	0
	44 - Acciones de Formación y Capacitación	420.975	420.975	0
357 - Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	47 - Coordinación Fiscal con las Provincias	4.661.787	4.661.787	0
362 - Ministerio de Producción	41 - Fortalecimiento Institucional Productivo	108.721	908.721	0
	45 - Promoción de la Productividad y Competitividad PyME	3.014.501	4.033.865	0
	46 - Acciones para el Desarrollo de Emprendedores	0	20.000	0
	47 - Financiamiento de la Producción	7.427.000	1.027.000	0
370 - Ministerio de Defensa (Gastos Propios)	21 - Formación y Capacitación	3.576.500	5.368	0
380 - Prefectura Naval Argentina	36 - Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina	699.620	699.620	0
604 - Dirección Nacional de Vialidad	39 - Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales	0	1	0
	43 - Ejecución de Obras de Mejora de la Seguridad Vial-Ruta Segura	55.971.166	2	0
	46 - Fortalecimiento de la Red Nacional Vial a través de Nuevas Rutas y Caminos	145.469.324	2	0
	83 - Desarrollo de la Infraestructura Productiva (BID N° 2185/OC-AR, N° 2655/OC-AR y N° S/N y CAF N° 7352, N° 8026, N° 8653; y S/N)	1.849.792	239.898	0
916 - Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP)	66 - Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública	0	250.523	0
Total Programas -INVERSION REAL DIRECTA-sin ejecución		426.227.665	36.690.070	0

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°21: Transferencias de Capital -SAF con menor ejecución financiera

Cod. y Desc. Servicio	Cod. y Desc. Programa	\$ Cred. Inicial	\$ Cred. Vigente	\$ Devengado
105-Comisión Nacional de Energía Atómica	23-Investigación y Aplicaciones no Nucleares	0	3.200.000	0
107-Administración de Parques Nacionales	17-Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas	270.000	270.000	0
310-Ministerio de Salud	5-Actividades Comunes a los Programas 16, 18 y 21	0	3.000.000	0
311-Ministerio de Desarrollo Social	20-Abordaje Territorial	1.188.616	1.188.616	0
	24-Economía Social	403.468	403.468	0
317-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios)	60-Planificación y Política Ambiental	2.756.082	756.082	0
	62-Coordinación de Políticas Ambientales	0	1.698.750	0
343-Ministerio de Seguridad	41-Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito Organizado	84.130.305	73.419.986	0
347-Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos	70-Formulación y Ejecución de Planes y Programas Inherentes a Contenidos	20.000.000	4.500.000	0
	71-Formulación de Iniciativas para la Implementación de Contenidos en Parques Temáticos	0	4.000.000	0
374-Estado Mayor General del Ejército	1-Actividades Centrales	450.187	450.187	0
604-Dirección Nacional de Vialidad	36-Control de Concesiones Viales	0	1	0
608-Instituto Nacional de Tecnología Industrial	1-Actividades Centrales	8.148.897	6.848.897	0
	16-Desarrollo, Innovación y Optimización de los Procesos Industriales	28.715.344	8.715.344	0
Total Programas -Transferencias de Capital-sin ejecución		146.062.899	108.451.331	0

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°22: Ministerio del Interior SAF 325 Ejecución de Programas

Programas	Crédito Inicial	Crédito Vigente	%Cv	Devengado Consumido	%Ejecución
38 Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano	15.211.879.928	15.163.361.483	43,38%	15.089.748.037	99,51%
37 Acciones del Programa "Hábitat Nación"	6.864.499.431	7.153.622.726	20,47%	7.153.622.726	100,00%
73 Recursos Hídricos	3.158.774.384	4.062.228.138	11,62%	4.046.347.803	99,61%
72 Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas	1.533.378.363	2.226.540.996	6,37%	2.189.214.968	98,32%
10 Actividades Comunes a los Programas de Vivienda	2.354.361.819	1.820.362.458	5,21%	1.820.362.237	100,00%
87 Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa (CAF N° 8673, CAF N° 8945, BID N° 2940/OC-AR, CAF N° 7908)	0	1.659.218.540	4,75%	1.651.559.913	99,54%
94 Asistencia Financiera a Empresas Públicas	1.416.001.282	1.126.663.755	3,22%	1.124.823.755	99,84%
19 Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional	1.166.600.000	869.029.272	2,49%	869.027.787	100,00%
17 Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios	430.000.000	530.000.000	1,52%	524.893.404	99,04%
86 Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios	192.452.569	330.773.926	0,95%	214.246.923	64,77%
34 Iniciativas Complementarias de Interior	0	8.000.000	0,02%	8.000.000	100,00%
66 Prevención Sísmica	1.200.000	1.200.000	0,00%	1.200.000	100,00%
20 Planificación Territorial de la Inversión Pública	0	1.000.000	0,00%	1.000.000	100,00%
Total Programas SAF 325-Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	32.329.147.776	34.952.001.294	100,00%	34.694.047.552	

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°23: Obligaciones a cargo del Tesoro Ejecución de Programas

Pg	Programa Desc.	Crédito Inicial	Crédito Vigente	%CV	Devengado Consumido	%Ejecución
87	Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del Sector Transporte	8.127.360.000	7.631.296.255	13,17%	7.631.296.254	100,00%
88	Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del Sector Energía, Combustible y Minería	4.238.770.000	12.333.645.466	21,28%	12.319.228.976	99,88%
93	Fondo Federal Solidario	30.386.000.000	25.727.000.000	44,39%	23.968.088.063	93,16%
95	Otras Asistencias Financieras a Empresas Públicas y Otros Entes	10.729.884.000	9.613.120.000	16,59%	9.535.230.000	99,19%
98	Asistencia Financiera a Provincias y Municipios	1.618.781.000	2.268.781.000	3,91%	2.261.723.200	99,69%
99	Otras Asistencias Financieras	3.569.247.975	385.631.652	0,67%	385.631.652	100,00%
Total SAF 356-Obligaciones a cargo del Tesoro		58.670.042.975	57.959.474.373	100,00%	56.101.198.145	96,79%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°24: Fondo Federal Solidario

Cod. y Desc. Ubicación Geográfica	\$ Cred. Inicial	\$ Cred. Vigente	%CV	\$ Devengado	%Ejecución
06 - Provincia de Buenos Aires	6.445.200.000	5.456.975.592	212,1%	5.083.871.159	93,16%
82 - Provincia de Santa Fe	2.622.900.000	2.220.738.113	8,63%	2.068.925.362	93,16%
14 - Provincia de Córdoba	2.606.200.000	2.206.598.677	8,58%	2.055.742.913	93,16%
22 - Provincia del Chaco	1.464.300.000	1.239.782.996	4,82%	1.155.022.164	93,16%
30 - Provincia de Entre Ríos	1.433.000.000	1.213.282.136	4,72%	1.130.335.033	93,16%
90 - Provincia de Tucumán	1.396.200.000	1.182.124.577	4,59%	1.101.333.646	93,17%
50 - Provincia de Mendoza	1.223.900.000	1.036.242.852	4,03%	965.434.587	93,17%
86 - Provincia de Santiago del Estero	1.212.700.000	1.026.760.116	3,99%	956.566.395	93,16%
66 - Provincia de Salta	1.124.900.000	952.422.244	3,70%	887.298.620	93,16%
18 - Provincia de Corrientes	1.091.200.000	923.889.370	3,59%	860.694.042	93,16%
34 - Provincia de Formosa	1.068.400.000	904.585.230	3,52%	842.717.976	93,16%
70 - Provincia de San Juan	992.100.000	839.984.095	3,26%	782.558.075	93,16%
54 - Provincia de Misiones	969.600.000	820.933.957	3,19%	764.821.690	93,16%
38 - Provincia de Jujuy	833.800.000	705.955.789	2,74%	657.684.336	93,16%
10 - Provincia de Catamarca	808.300.000	684.365.632	2,66%	637.551.142	93,16%
62 - Provincia de Río Negro	740.500.000	626.961.216	2,44%	584.102.306	93,16%
02 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	724.100.000	613.075.782	2,38%	571.159.539	93,16%
74 - Provincia de San Luis	670.000.000	567.270.783	2,20%	528.496.342	93,16%
46 - Provincia de La Rioja	607.700.000	514.523.067	2,00%	479.361.761	93,17%
42 - Provincia de La Pampa	551.200.000	466.686.052	1,81%	434.781.117	93,16%
58 - Provincia del Neuquén	509.300.000	431.210.462	1,68%	401.705.156	93,16%
26 - Provincia del Chubut	464.300.000	393.110.186	1,53%	366.232.386	93,16%
78 - Provincia de Santa Cruz	464.300.000	393.110.186	1,53%	366.232.386	93,16%
94 - Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	361.900.000	306.410.890	1,19%	285.459.929	93,16%
Total FFS por ubicación geográfica	30.386.000.000	25.727.000.000	100,00%	23.968.088.063	93,16%

Montos expresados en pesos. Fuente: Base de datos e-SIDIF.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°25: FONDO FEDERAL SOLIDARIO-AUDITORIA DE ACTAS Y EXPEDIENTES

Evaluación de las jurisdicciones	Provincias		N°Expedientes	
	1°SEMESTRE	2° SEMESTRE	1°SEMESTRE	2° SEMESTRE
Jurisdicciones con requerimientos de diversa índole, sin presentación de descargo:	Cordoba, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Tucuman, C.A.B.A.	Cordoba, Corrientes, Entre Rios, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquen, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucuman, C.A.B.A.	Cordoba: 19429155, La Rioja: 19132573, Mendoza: 19448984, Misiones: 18566833, Salta: 19159701, San Juan: 18577177, Tucuman: 19091078, C.A.B.A.: No presento informacion	Cordoba: 9716466, Corrientes: 8836108, Entre Rios: 8871295, Formosa: 8928118, La Pampa: 6889771 y 8891634, Mendoza: 9824751, Misiones: 8852168, Neuquen: 11123222, San Juan: 9859732, Santa Cruz: 8921290, Santa Fe: 8738873, Santiago del Estero: 9723498, Tierra del Fuego: 10305183 y 11240846, Tucuman: 10298262, C.A.B.A.: 9325020 y 9326224
Jurisdicciones con requerimientos de diversa índole y con solicitud de presentación de descargo bajo advertencia de aplicación de las penalidades contenidas en el art. 7 del decreto N°243/2009 del PEN (suspensión transitoria de las transferencias automáticas de fondos): La Res. Conjunta establece un plazo de 20 días corridos para la realización del descargo, contados a partir de la fecha de recepción de la nota	Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, Neuquen, Rio Negro, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego	Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Rio Negro, Salta, San Luis	Catamarca: 19428269, Chaco: 11963572, Chubut: 19450033, Corrientes: No presento informacion, Entre Rios: 19222390, Formosa: 18736503, Jujuy: 19090891, La Pampa: 18163524, Neuquen: 19186868, Rio Negro: 19186868, San Luis: No presento Informacion, Santa Cruz: 18574033, Santa Fe: No presento informacion, Santiago del Estero: No presento informacion, Tierra del Fuego: No presento informacion	Buenos Aires: 9948090, Catamarca: 12380300, Chaco: No presento Informacion, Chubut: 12705159, Jujuy: 11285584, La Rioja: 9871081, Rio Negro: 10370034, Salta: 9829833 y 11293853, San Luis: 9314229, 9321246 y 10351163

Res. Conjunta 157/2009 Min. De Economía, Res. 20/2009 Min. del Interior y N°313/2009 del Min. De Planificación. Fuente: Base de datos Respuesta a Nota N°80, de 26 de junio de 2018).



Auditoría General de la Nación

Anexo N°26: Programa Inversiones Prioritarias

Descripción PIP			Art.64 Ley de Presupuesto	Ejecución Financiera					Ejecución Física					Dictamen-DNIP							
Cod. y Desc. Servicio	Cod. y Desc. Programa	Cod. y Desc. Subprograma		Cod. y Desc. Proyecto	Cod. y Desc. Actividad	Cod. y Desc. Obra	\$ Cred. Inicial	\$ Cred. Vigente	\$ Devengado	%Ejecución	OBJETO DEL GASTO	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado al cierre	Ejecutado anual	Causas del desvío	REGISTRO BAPIN	Calificación Dictamen	N°Dictamen	Fecha Dictamen	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
305- Comisión Nacional de Energía Atómica	01- Actividades Centrales	00- Actividades Centrales	05- Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	00- Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	51- Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	x	2.040.410.328	3.020.837.328	3.020.837.328	100%	AD	26,8	16,2	7,39	7,39	Demoras en la Obra Civil, en la revisión de la Ing Básica y asistencia técnica para la Elaboración de la Especificación Técnica de los Componentes del Sistema 2600 (Muestreo de Gases y Líquidos Radioactivos, demos en el Módulo 3 del Liner de la contención del Reactor, atrasos en la compra de equipamiento por demoras en la asignación de refuerzo presupuestario	30251	APROBADO CON OBSERVACIONES	7/2008	14/04/2008	SI
						x		163.701.500	150.444.228	92%	IRD						30251	APROBADO CON OBSERVACIONES	7/2008	14/04/2008	SI
Total 305 - Comisión Nacional de Energía Atómica							2.040.410.328	3.184.538.828	3.171.281.556												
325- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	73- Recursos Hídricos	00- Recursos Hídricos	47- Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N°2050)	00- Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N°2050)	51- Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N° 2050)	x	12.849.000.000	12.759.000.000	0	0%	AD	27,19	7	0	0	No se ha logrado acuerdo de financiamiento.	63352	APROBADO CON OBSERVACIONES	1/2014	31/01/2014	NO
325- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	73- Recursos Hídricos	00- Recursos Hídricos	47- Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N°2050)	00- Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N°2050)	51- Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N° 2050)	x	100.000	100.000	0	0%	IRD						63352	APROBADO CON OBSERVACIONES	1/2014	31/01/2014	NO
325- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	73- Recursos Hídricos	00- Recursos Hídricos	48- Aprovechamiento Integral del Río Grande - Presa y Central Hidroeléctrica "Portezuelo del Viento"	00- Aprovechamiento Integral del Río Grande - Presa y Central Hidroeléctrica "Portezuelo del Viento"	51- Aprovechamiento Integral del Río Grande - Presa y Central Hidroeléctrica "Portezuelo del Viento"	x	2.750.000.000	2.376.000.000	0	0%	AD	19	12	0	0	No se ha logrado acuerdo de financiamiento.					
325- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	73- Recursos Hídricos	00- Recursos Hídricos	48- Aprovechamiento Integral del Río Grande - Presa y Central Hidroeléctrica "Portezuelo del Viento"	00- Aprovechamiento Integral del Río Grande - Presa y Central Hidroeléctrica "Portezuelo del Viento"	51- Aprovechamiento Integral del Río Grande - Presa y Central Hidroeléctrica "Portezuelo del Viento"	x	100.000	100.000	0	0%	IRD										
325- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	73- Recursos Hídricos	00- Recursos Hídricos	49- Construcción de Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastón y Medina. Prov de Tucumán y Catamarca	00- Construcción de Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastón y Medina. Prov de Tucumán y Catamarca	51- Construcción de Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastón y Medina. Prov de Tucumán y Catamarca	x	1.044.000.000	1.044.000.000	0	0%	AD	6	8	0	0	No se ha logrado acuerdo de financiamiento.					
325- Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)	73- Recursos Hídricos	00- Recursos Hídricos	49- Construcción de Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastón y Medina. Prov de Tucumán y Catamarca	00- Construcción de Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastón y Medina. Prov de Tucumán y Catamarca	51- Construcción de Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas, Gastón y Medina. Prov de Tucumán y Catamarca	x	100.000	100.000	0	0%	IRD										
Total 325 - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)							x	16.643.300.000	16.179.300.000	0											

Montos expresados en pesos. Fuente: Base e-SIDIF. Ley de Presupuesto, Información brindada por DNIP



Auditoría General de la Nación

Anexo N°26: Programa Inversiones Prioritarias

Descripción PIP						Art. 64 Ley de Presupuesto	Ejecución Financiera					Ejecución Física					Dictamen-DNIP				
Cod. y Desc. Servicio	Cod. y Desc. Programa	Cod. y Desc. Subprograma	Cod. y Desc. Proyecto	Cod. y Desc. Actividad	Cod. y Desc. Obra		\$ Cred. Inicial	\$ Cred. Vigente	\$ Devengado	%Ejecución	OBJETO DEL GASTO	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado al cierre	Ejecutado anual	Causas del desvío	REGISTRO BAPIN	Calificación Dictamen	N°Dictamen	Fecha Dictamen	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	61 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	00 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	02 - Mejora del Transporte en el Área Metropolitana	00 - Mejora del Transporte en el Área Metropolitana	51 - Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Lanús - Provincia de Buenos Aires	x	341.248.236	0	0	sin CV/CI	IRD	57		0	0						
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	61 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	00 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	02 - Mejora del Transporte en el Área Metropolitana	00 - Mejora del Transporte en el Área Metropolitana	52 - Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Morón - Provincia de Buenos Aires	x	341.248.236	216.317.160	0	0%	IRD	57	100	0	0	Se postergo la fecha de inicio de la obra para el ejercicio 2018					
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	61 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	00 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	02 - Mejora del Transporte en el Área Metropolitana	00 - Mejora del Transporte en el Área Metropolitana	53 - Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus 3 de Febrero - Provincia de Buenos Aires	x	307.498.824	307.498.824	238.496.666	78%	IRD	76,87	100	99,35	0	El desvío se produjo por la variación entre el avance real y el planificado.					
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	61 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	00 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	02 - Mejora del Transporte en el Área Metropolitana	00 - Mejora del Transporte en el Área Metropolitana	54 - Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires	x	307.498.824	307.498.824	0	0%	IRD	76,87	50	0	0	Atrasos en el proceso licitatorio, la obra se iniciara en el ejercicio 2018.					
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	61 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	00 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	02 - Mejora del Transporte en el Área Metropolitana	00 - Mejora del Transporte en el Área Metropolitana	55 - Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Córdoba - Provincia de Córdoba	x	344.000.000	339.300.000	0	0%	IRD	57,33	70	0	0	Se esta evaluando la viabilidad de la obra					
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	61 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	00 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	02 - Mejora del Transporte en el Área Metropolitana	00 - Mejora del Transporte en el Área Metropolitana	56 - Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Corrientes - Provincia de Corrientes	x	307.161.412	227.161.412	0	0%	IRD	85,32	60	0	0	Se esta evaluando la viabilidad de la obra					
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	61 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	00 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	02 - Mejora del Transporte en el Área Metropolitana	00 - Mejora del Transporte en el Área Metropolitana	58 - Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Neuquén - Provincia de Neuquén	x	370.000.000	370.000.000	0	0%	IRD	74	100	0	0	Atrasos en el proceso licitatorio, la obra se iniciara en el ejercicio 2018.					
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	61 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	00 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	02 - Mejora del Transporte en el Área Metropolitana	00 - Mejora del Transporte en el Área Metropolitana	60 - Pavimentación y Rehabilitación de Calzadas y Veredas	x	2.046.000.000	4.462.370.698	5.941.270.816	133%	IRD	37,89	70	94,06	85,19	Se amplio la licitación de la obra original					
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	61 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	00 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	02 - Mejora del Transporte en el Área Metropolitana	00 - Mejora del Transporte en el Área Metropolitana	64 - Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Mejora Refugios y Mobiliario	x	420.000.000	208.382.906	257.861.588	124%	IRD	70	70	60,66	64	El desvío se produjo por la variación entre el avance real y el planificado.					
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	61 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	00 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial		00 - Coordinación de Políticas de Transporte Vial	14 - Estructuración del Túnel Internacional Paso de Agua Negra PETAN-Argentina (BID S/N)	x	108.000.000	67.873.188	0	0%	AD										
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		23 - Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución - Ferrocarril Belgrano Sur (CAF S/N)	00 - Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución - Ferrocarril Belgrano Sur (CAF S/N)	51 - Mejoramiento Conectividad Ferrocarril Belgrano Sur: Elevación del Viaducto	x	448.649.965	448.629.965	0	0%	AD	37	6	0	0	Demora en la presentación del proyecto ejecutivo. Demora en la movilización de equipos ferroviarios. (Atraso en el pago de certificados.					

Montos expresados en pesos. Fuente: Base e-SIDIF. Ley de Presupuesto, Información brindada por DNIP



Auditoría General de la Nación

Anexo N°26: Programa Inversiones Prioritarias

Descripción PIP						Art.64 Ley de Presupuesto	Ejecución Financiera				OBJETO DEL GASTO	Ejecución Física				Dictamen-DNIP			
Cod. y Desc. Servicio	Cod. y Desc. Programa	Cod. y Desc. Subprograma	Cod. y Desc. Proyecto	Cod. y Desc. Actividad	Cod. y Desc. Obra		\$ Cred. Inicial	\$ Cred. Vigente	\$ Devengado	%Ejecución		Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado al cierre	Ejecutado anual	Causas del desvío	REGISTRO BAPIN	Calificación Dictamen	N'Dictamen
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		18 - Red de Expresos Regionales (R.E.R.)	01 - Consultorías y Estudios del Proyecto Red de Expresos Regionales	00 - Red de Expresos Regionales (R.E.R.)	x	0	2	0	0%	IRD								
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		18 - Red de Expresos Regionales (R.E.R.)	00 - Red de Expresos Regionales (R.E.R.)	53 - Construcción Estación Retiro Subterránea de las Líneas Mitre y Sarmiento y Distribuidor Retiro - Red de Expresos Regionales	x	10.000.000	0	0	sin CV/CI	IRD	50	5		No se conto con financiamiento para iniciar la obra				
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		18 - Red de Expresos Regionales (R.E.R.)	00 - Red de Expresos Regionales (R.E.R.)	54 - Construcción Estación Correo Central de las Líneas Mitre y Sarmiento	x	10.000.000	0	0	sin CV/CI	IRD	14,58	5		No se conto con financiamiento para iniciar la obra				
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		18 - Red de Expresos Regionales (R.E.R.)	00 - Red de Expresos Regionales (R.E.R.)	55 - Construcción Estación 9 de Julio Subterránea de las Líneas Mitre y Sarmiento ¿ Ciudad Autónoma de Buenos Aires	x	10.000.000	0	0	sin CV/CI	IRD	13,97	5		No se conto con financiamiento para iniciar la obra				
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		18 - Red de Expresos Regionales (R.E.R.)	00 - Red de Expresos Regionales (R.E.R.)	56 - Construcción Estación Plaza Miserere Subterránea de la Líneas Mitre y Sarmiento - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	x	10.000.000	0	0	sin CV/CI	IRD	23,62	5		No se conto con financiamiento para iniciar la obra				
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		19 - Puesta en Valor Ferrocarril Mitre	00 - Puesta en Valor Ferrocarril Mitre	53 - Construcción de Viaducto Línea Mitre: Retiro - Tigre	x	863.323.745	674.608.236	0	0%	AD	23,98	0						
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		05 - Soterramiento Ferrocarril Sarmiento	00 - Soterramiento Ferrocarril Sarmiento	51 - Soterramiento Ferrocarril Sarmiento	x	0	280.690	279.995	100%	IRD	20	10	6	6	El desvío se produjo por la variación entre el avance real y el planificado.			
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		05 - Soterramiento Ferrocarril Sarmiento	00 - Soterramiento Ferrocarril Sarmiento	51 - Soterramiento Ferrocarril Sarmiento	x	10.740.000.000	10.740.000.000	3.272.585.186	30%	AD								
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		23 - Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución - Ferrocarril Belgrano Sur (CAF S/N)	00 - Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución - Ferrocarril Belgrano Sur (CAF S/N)	52 - Mejoramiento Conectividad Ferrocarril Belgrano Sur: Eliminación de 4 Pasos a Nivel	x	56.751.800	56.751.800	0	0%	AD	98,75							
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		23 - Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución - Ferrocarril Belgrano Sur (CAF S/N)	00 - Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución - Ferrocarril Belgrano Sur (CAF S/N)	53 - Mejoramiento Conectividad Ferrocarril Belgrano Sur: Apertura de Calles	x	20.476.000	20.476.000	0	0%	AD	97,02							
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		23 - Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución - Ferrocarril Belgrano Sur (CAF S/N)	00 - Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución - Ferrocarril Belgrano Sur (CAF S/N)	54 - Mejoramiento Conectividad Ferrocarril Belgrano Sur: Prolongación del Tendido Ferroviario	x	70.020.000	70.020.000	0	0%	AD	36							
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		23 - Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución - Ferrocarril Belgrano Sur (CAF S/N)	00 - Mejoramiento de la Conectividad Ferroviaria a Constitución - Ferrocarril Belgrano Sur (CAF S/N)	55 - Construcción Nueva Estación Buenos Aires	x	36.612.000	36.612.000	0	0%	AD	20							
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		26 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	00 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	51 - Renovación Parcial Etapa 1 - Km 1202 a 1264,96 - Provincia de Santiago del Estero (CDB S/N)	x	205.543.993	205.543.993	503.360.817	245%	AD	30	100	56,73	56,73	Demora en la presentación del proyecto ejecutivo. Demora en la movilización de equipos ferroviarios. /Atraso en el pago de certificados.			

Montos expresados en pesos. Fuente: Base e-SIDIF. Ley de Presupuesto, Información brindada por DNIP



Auditoría General de la Nación

Anexo N°26: Programa Inversiones Prioritarias

Descripción PIP						Art. 64 Ley de Presupuesto	Ejecución Financiera				OBJETO DEL GASTO	Ejecución Física				Dictamen-DNIP					
Cod. y Desc. Servicio	Cod. y Desc. Programa	Cod. y Desc. Subprograma	Cod. y Desc. Proyecto	Cod. y Desc. Actividad	Cod. y Desc. Obra		\$ Cred. Inicial	\$ Cred. Vigente	\$ Devengado	%Ejecución		Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado al cierre	Ejecutado anual	Causas del desvío	REGISTRO BAPIN	Calificación Dictamen	N°Dictamen	Fecha Dictamen	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		26 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	00 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	52 - Renovación Parcial Etapa I - Km 1264,96 a 1332,5 - Provincia de Santiago del Estero (CDB S/N)	x	233.804.670	233.804.670	203.596.527	87%	AD	30	100	52,81	52,81	Demora en la presentación del proyecto ejecutivo. Demora en la movilización de equipos ferroviarios./Atraso en el pago de certificados.					
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		26 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	00 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	53 - Renovación Parcial Etapa I - Km 1411 a 1436,5 - Provincia del Chaco (CDB S/N)	x	83.249.235	83.249.235	62.984.453	76%	AD	30	85	32,17	32,17	Falta de equipos ferroviarios afectados a obra. Falta de estructura para realizar la ingeniería.					
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		26 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	00 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	54 - Renovación Parcial Etapa I - Km 723,2 a 689,785 - Provincia del Chaco (CDB S/N)	x	112.954.710	112.954.710	149.611.667	132%	AD	30	100	46,94	46,94	Atraso en la cancelación de certificados./Lluvias y secuelas./Demora en la implementación del segundo frente					
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		26 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	00 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	55 - Renovación Parcial Etapa I - Km 552,72429 a 518,023 - Provincia del Chaco (CDB S/N)	x	113.365.544	113.365.544	153.767.546	136%	AD	30	100	46,94	46,94	Atraso en la cancelación de certificados./Lluvias y secuelas./Demora en la implementación del segundo frente					
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		26 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	00 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	56 - Renovación Parcial Etapa I - Km 518,023 a 492,543 - Provincia del Chaco (CDB S/N)	x	83.183.941	83.183.941	112.208.750	135%	AD	30	100	46,94	46,94	Atraso en la cancelación de certificados./Lluvias y secuelas./Demora en la implementación del segundo frente					
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		26 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	00 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	57 - Renovación Parcial Etapa I - Km a 492,543 a 415,283 - Provincia del Chaco (CDB S/N)	x	215.136.790	215.136.790	54.309.586	25%	AD	30	89	19,59	19,59	Demora en la aprobación del EIA y FGA. Retraso en acopio de materiales y en la llegada de equipos ferroviarios.					
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		26 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	00 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	58 - Renovación Parcial Etapa II - Km 1290,4 a 1082,2 - Provincia de Salta (CDB S/N)	x	815.646.622	815.646.622	0	0%	AD	30									
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		26 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	00 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	59 - Renovación Parcial Etapa II - Km a 1082,2 a 1110,2 - Provincia de Salta (CDB S/N)	x	109.693.110	109.693.110	0	0%	AD	30	89								
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		26 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	00 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	60 - Renovación Parcial Etapa I - Km 415,283 a 338,023 - Provincia de Santa Fe (CDB S/N)	x	215.592.960	215.592.960	151.904.359	70%	AD	30	89	35,65	35,65	demoras en la presentación del proyecto ejecutivo. Demora en la movilización de equipos ferroviarios. Lluvias por encima de la media.					
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		26 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	00 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	61 - Renovación Parcial Etapa II - Km 83,8 a 53,400 - Provincia de Santa Fe (CDB S/N)	x	119.095.376	119.095.376	0	0%	AD	30									
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		26 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	00 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	62 - Renovación Parcial Etapa III - Km 53,400 a 2,1 - Provincia de Santa Fe (CDB S/N)	x	200.973.447	200.973.447	0	0%	AD	30									
327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	62 - Modernización de la Red de Transporte Ferroviario		26 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	00 - Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	63 - Renovación Parcial Etapa I - Km 1110,2 a 1138,9 - Provincia de Salta (CDB S/N)	x	112.435.437	112.435.437	1.780.692	2%	AD	30		10,95	10,95	Certificación no prevista inicialmente como parte de la obra					
328 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)	OTROS						32.384.088.288	33.769.380.951	18.593.548.894												
Total 327 - Ministerio de Transporte (Gastos Propios)							34.572.489.042	35.957.781.705	19.176.177.381												
328 - Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios)	32 - Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica	00 -	04 - Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	00 - Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	51 - Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	x	3.323.767.000	0	0	sin CV/CI	AD										
328 - Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios)	74 - Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica	00 -	46 - Aprovechamiento Hidroeléctricos del Río Santa Cruz - Néstor Kirchner - Gobernador Cepernic (CDB N° 201401)	00 - Aprovechamiento Hidroeléctricos del Río Santa Cruz - Néstor Kirchner - Gobernador Cepernic (CDB N° 201401)	51 - Aprovechamiento Hidroeléctricos del Río Santa Cruz - Néstor Kirchner - Gobernador Cepernic (CDB N° 201401)	x	20.000.000.000	19.545.000.000	2.723.029.723	14%	AD										
Total 328 - Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios)							23.323.767.000	22.868.767.000	2.723.029.723												

Montos expresados en pesos. Fuente: Base e-SIDIF. Ley de Presupuesto, Información brindada por DNIP



Auditoría General de la Nación

Anexo N°26: Programa Inversiones Prioritarias

Descripción PIP						Art.64 Ley de Presupuesto	Ejecución Financiera					Ejecución Física					Dictamen-DNIP				
Cod. y Desc. Servicio	Cod. y Desc. Programa	Cod. y Desc. Subprograma	Cod. y Desc. Proyecto	Cod. y Desc. Actividad	Cod. y Desc. Obra		\$ Cred. Inicial	\$ Cred. Vigente	\$ Devengado	%Ejecución	OBJETO DEL GASTO	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado al cierre	Ejecutado anual	Causas del desvío	REGISTRO BAPIN	Calificación Dictamen	N°Dictamen	Fecha Dictamen	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
604 - Dirección Nacional de Vialidad	42 - Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales	01 - Construcción de Autopista en Trazo Nueva	03 - Autopista Autopista Ruta Nacional N°7 de Los Andes - Palmira - Luján de Cuyo	00 - Autopista Autopista Ruta Nacional N°7 de Los Andes - Palmira - Luján de Cuyo	51- Autopista Autopista Ruta Nacional N°7 de Los Andes - Palmira - Luján de Cuyo	x	0	0	0	sin CV/CI	AD	10,21	16,67	0	0						
604 - Dirección Nacional de Vialidad	42 - Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales	01 - Construcción de Autopista en Trazo Nueva	05 - Autopista Ruta Nacional N°19 - San Francisco - Córdoba - San Francisco - Jeanmarie (BID N° 3836/OC-AR)	00 - Autopista Ruta Nacional N°19 - San Francisco - Córdoba - San Francisco - Jeanmarie (BID N°3836/OC-AR)	51- Autopista Ruta Nacional N°19 - San Francisco - Córdoba - San Francisco - Jeanmarie (BID N° 3836/OC-AR)	x	607.875.698	447.056.509	37.687.628	8%	AD	41	20	3,22	3,22	atraso corregible	71499	APROBADO CON OBSERVACIONES	41/2016	42698	NO
604 - Dirección Nacional de Vialidad	42 - Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales	01 - Construcción de Autopista en Trazo Nueva	05 - Autopista Ruta Nacional N°19 - San Francisco - Córdoba - San Francisco - Jeanmarie (BID N° 3836/OC-AR)	00 - Autopista Ruta Nacional N°19 - San Francisco - Córdoba - San Francisco - Jeanmarie (BID N°3836/OC-AR)	51- Autopista Ruta Nacional N°19 - San Francisco - Córdoba - San Francisco - Jeanmarie (BID N° 3836/OC-AR)	x	0	122.924.374	117.408.060	96%	IRD						71499	APROBADO CON OBSERVACIONES	41/2016	42698	NO
604 - Dirección Nacional de Vialidad	42 - Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales	01 - Construcción de Autopista en Trazo Nueva	06 - Autopista Ruta Nacional N°19 - San Francisco - Córdoba - Jeanmarie - Arroyito (BID N° 3836/OC-AR)	00 - Autopista Ruta Nacional N°19 - San Francisco - Córdoba - Jeanmarie - Arroyito (BID N° 3836/OC-AR)	51- Autopista Ruta Nacional N°19 - San Francisco - Córdoba - Jeanmarie - Arroyito (BID N° 3836/OC-AR)	x	607.875.698	819.246.159	261.625.759	32%	AD	20	20	9,06	9,06	atraso corregible					
604 - Dirección Nacional de Vialidad	42 - Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales	01 - Construcción de Autopista en Trazo Nueva	06 - Autopista Ruta Nacional N°19 - San Francisco - Córdoba - Jeanmarie - Arroyito (BID N° 3836/OC-AR)	00 - Autopista Ruta Nacional N°19 - San Francisco - Córdoba - Jeanmarie - Arroyito (BID N° 3836/OC-AR)	51- Autopista Ruta Nacional N°19 - San Francisco - Córdoba - Jeanmarie - Arroyito (BID N° 3836/OC-AR)	x	0	82.391.980	82.391.980	100%	IRD										
604 - Dirección Nacional de Vialidad	42 - Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales	01 - Construcción de Autopista en Trazo Nueva	07 - Autopista Ruta Nacional N°19 - Arroyito - Empalme Ruta Nacional N°19 actual (Río Primero) - Sección I (BID N° 3836/OC-AR)	00 - Autopista Ruta Nacional N°19 - Arroyito - Empalme Ruta Nacional N°19 actual (Río Primero) - Sección I (BID N° 3836/OC-AR)	51- Autopista Ruta Nacional N°19 - Arroyito - Empalme Ruta Nacional N°19 actual (Río Primero) - Sección I (BID N° 3836/OC-AR)	x	607.875.698	490.471.853	146.070.641	30%	AD	38	20	12	12	atraso corregible	71519	APROBADO CON OBSERVACIONES	41/2016	42698	NO
604 - Dirección Nacional de Vialidad	42 - Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales	01 - Construcción de Autopista en Trazo Nueva	07 - Autopista Ruta Nacional N°19 - Arroyito - Empalme Ruta Nacional N°19 actual (Río Primero) - Sección I (BID N° 3836/OC-AR)	00 - Autopista Ruta Nacional N°19 - Arroyito - Empalme Ruta Nacional N°19 actual (Río Primero) - Sección I (BID N° 3836/OC-AR)	51- Autopista Ruta Nacional N°19 - Arroyito - Empalme Ruta Nacional N°19 actual (Río Primero) - Sección I (BID N° 3836/OC-AR)	x	0	79.576.736	77.674.394	98%	IRD										
604 - Dirección Nacional de Vialidad	42 - Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales	01 - Construcción de Autopista en Trazo Nueva	08 - Autopista Ruta Nacional N°19 - Arroyito - Empalme Ruta Nacional N°19 actual (Río Primero) Sección II (BID N° 3836/OC-AR)	00 - Autopista Ruta Nacional N°19 - Arroyito - Empalme Ruta Nacional N°19 actual (Río Primero) Sección II (BID N° 3836/OC-AR)	51- Autopista Ruta Nacional N°19 - Arroyito - Empalme Ruta Nacional N°19 actual (Río Primero) Sección II (BID N° 3836/OC-AR)	x	607.875.699	556.916.753	120.026.117	22%	AD	26	20	2,39	6,43	atraso corregible					
604 - Dirección Nacional de Vialidad	42 - Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales	01 - Construcción de Autopista en Trazo Nueva	08 - Autopista Ruta Nacional N°19 - Arroyito - Empalme Ruta Nacional N°19 actual (Río Primero) Sección II (BID N° 3836/OC-AR)	00 - Autopista Ruta Nacional N°19 - Arroyito - Empalme Ruta Nacional N°19 actual (Río Primero) Sección II (BID N° 3836/OC-AR)	51- Autopista Ruta Nacional N°19 - Arroyito - Empalme Ruta Nacional N°19 actual (Río Primero) Sección II (BID N° 3836/OC-AR)	x	0	53.884.820	53.884.820	100%	IRD										
Total 604 - Dirección Nacional de Vialidad							2.431.502.793	2.652.469.184	896.769.399												
TOTAL OBRAS QUE INTEGRAN EL PIP							79.011.469.163	80.842.856.717	25.967.258.059												
PIP - FINANCIADAS CON ADELANTOS A PROVEEDORES A LARGO PLAZO							74.186.513.631	73.901.266.791	19.047.545.512												
PIP - FINANCIADAS CON INVERSION REAL DIRECTA							4.824.955.532	6.941.589.926	6.919.712.547												

Montos expresados en pesos. Fuente: Base e-SIDIF. Ley de Presupuesto, Información brindada por DNIP



Auditoría General de la Nación

Anexo N°27: SAF 328 - Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios)

SAF 328 - Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios)														
Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Otra	Descripción	Ejecución Financiera					% de Avance Físico			
						Crédito		Devengado	Variación Presup.	Ejecutado	Ejec. Física Acum. Ejercicio 2016	Meta Final (a)	Meta Ejecutada (b)	% Meta Ejecutada (c=b/a)
						Inicial	Vigente							
32	0				Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera	6.500	0	0	0	0,00%				
		4	0		Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio									
				51	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (3)	6.500	0	0			-	-	-	-
73	0				Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos	0	674.882	548.345	674.882	81,25%				
		1	0		Construcción Gasoducto Centro II									
				51	Construcción Gasoducto Centro II (2)	0	250.671	217.720			0,00	15,00	0,00	0,00
		2	0		Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata									
				51	Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata (2)	0	166.553	137.244			0,00	15,00	1,00	6,67
		3	0		Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano - Patagónico									
				51	Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano - Patagónico (2)	0	257.658	193.381			0,00	15,00	0,00	0,00
74	0				Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica	-	-	-						
		4	0		Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio									
				51	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (3)	-	-	-			-	-	-	-
		1	0		Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner - Gobernador Jorge Cepernic (CDB N°203403)									
				51	Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner - Gobernador Jorge Cepernic (CDB N°203403) (3)	-	-	-			9,64	1,48	2,10	14189
Totales						6.500	674.882	548.345		0				

Montos expresados en miles de pesos.

Fuente: Cuenta de Inversión 2017 - Parametrizado SIDIF - Salida Básica de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2017.

- La ejecución física de este proyecto fue prevista por la DA dentro del Programa 32, no obstante, no se efectuó la programación correspondiente. El proyecto se encuentra en una profunda revisión y re-evaluación de su plan de obras quedando sus actividades reducidas al mantenimiento mínimo.
- (1)
 - (2) La DA no informó el avance físico previsto de estos proyectos. Demoras en la formalización de los contratos y sus correspondientes pagos de anticipos y certificaciones. Demoras en la obtención de la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y permisos ante Vialidades Nacional y Provincial. Asimismo, se produjo un error en la confección del informe de ejecución en el 4° trimestre.
 - (3) El porcentaje de avance físico acumulado al 2016 informado por la DA, no coincide con el expuesto en el formulario de Cierre. Este proyecto se financió con Adelantos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°28: SAF 342 - SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)

SAF 342 - SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)														
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripcion	Ejecución Financiera					% de Avance Físico			
						Crédito		Devengado	Variación Presup.	Ejecutado	Ejec. Física Acum. Ejercicio 2016	Meta Final (a)	Meta Ejecutada (b)	% Meta Ejecutada (c=b/a)
						Inicial	Vigente							
39	0				Gestión Ambiental Matanza Riachuelo (BID 1059/OC-AR)	6.600	0	0	-6.600	0,00%				
		1	0		Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR)									
				51	Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza	2.200	0	0			100,00	0,00	0,00	0,00
				52	Ampliación de Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza	2.200	0	0			100,00	0,00	0,00	0,00
				53	Colector Troncal-Ruta 21en La Matanza	2.200	0	0			100,00	0,00	0,00	0,00
44	0				Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF N°7706-	261.121	44.110	42.469	-217.011	96,28%				
		4	0		Ampliación de la Red de Agua-Cañuelas									
				51	Ampliación de la Red de Agua-Cañuelas	27.210	9.665	9.387			68,00	32,00	32,00	100
		5	0		Ampliación Red de Agua-Marcos Paz									
				51	Ampliación Red de Agua- Marcos Paz (1)	72.511	21.744	20.442			0,00	60,00	12,84	0,21
		6	0		Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC-Lanús									
				51	Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (2)	60.000	0	0			0,00	7,00	0,00	0,00
		7	0		Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24)									
				51	Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (3)	74.400	12.700	12.640			10,00	48,00	14,62	0,30
		8	0		Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón									
				51	Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón	15.000	0	0			0,00	0,00	0,00	0,00
		9	0		Construcción Reservorios de Regulación-Control de Inundaciones R2									
				51	Construcción Reservorios de Regulación-Control de Inundaciones R2	12.000	0	0			0,00	0,00	0,00	0,00
Totales Generales						267.721	44.110	42.469	-223.611	96,28%				

Montos expresados en miles de pesos.

Fuente: Cuenta de Inversión 2017 - Parametrizado SIDIF - Salida Básica de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2017.

Referencias:

(1) Demoras en la adjudicación de la obra.

(2) Demoras en los procesos licitatorios.

(3) Interferencias en la traza que obligó a gestionar una adenda al proyecto original.

LA DA NO ESPECIFICA LA EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL 2016 NI LA PROGRAMADA PARA EL EJERCICIO.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°29: SAF 350-Ministerio de Trabajo, Empleo Y Seguridad Social

SAF 350 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social														
Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Otra	Descripción	Ejecución Financiera					% de Avance Físico			
						Crédito		Devengado	Variación Presup.	Ejecutado	Ejec. Física Acum. Ejercicio 2016	Meta Final (a)	Meta Ejecutada (b)	% Meta Ejecutada (c=b/a)
						Inicial	Vigente							
1	0				Actividades Centrales	1.583	0	0	-1.583	0,00%				
		6	0		Reparación Pisos 2 Al 6, Edificio Callao 114-Etapa II									
				51	Reparación Pisos 2 Al 6, Edificio Callao 114-Etapa II (1)	1.583	0	0			5,54	4,44	0,00	0,00
22	0				Regularización del Trabajo	10.243	0	0	-10.243	0,00%				
		7	0		Construcción Delegación Regional Jujuy									
				51	Construcción Delegación Regional Jujuy	3.766	0	0			0,00	39,64	0,00	0,00
		8	0		Construcción Delegación Regional La Rioja									
				51	Construcción Delegación Regional La Rioja	921	0	0			0,00	39,82	0,00	0,00
		9	0		Construcción Delegación Regional Formosa									
				51	Construcción Delegación Regional Formosa	5.384	0	0			0,00	43,13	0,00	0,00
		10	0		Construcción Delegación Regional San Nicolas									
				51	Construcción Delegación Regional San Nicolas	373	0	0			0,00	15,09	0,00	0,00
24	0				Sistema Federal de Empleo	5.445	0	0	-5.445	0,00%				
		1	0		Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral									
				51	Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	5.445	0	0			0,00	28,25	0,00	0,00
Totales Generales						17.272	0	0	-17.272	0,00%				

Montos expresados en miles de pesos.

Fuente: Cuenta de Inversión 2017 - Parametrizado SIDIF - Salida Básica de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2017.

Referencias:

El porcentaje acumulado al 2016 informado en la DA no coincide con el expuesto en el formulario de Cierre.

- (1) Por decisión de las autoridades se dispuso la no realización de la presente obra.
- (2) Readecuación de Pliegos de Obra Pública de acuerdo a la normativa vigente.
- (3) No hubo inicio de obra.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°30: SAF 366 - Ministerio de Modernización

SAF 366 - Ministerio de Modernización														
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripción	Ejecución Financiera					% de Avance Físico			
						Crédito		Devengado	Variación Presup.	Ejecutado	Ejec. Física Acum. Ejercicio 2016	Meta Final (a)	Meta Ejecutada (b)	% Meta Ejecutada (c=b/a)
						Inicial	Vigente							
1	0				Actividades Centrales	31.333	27.333	24.993	-4.000	91,44%				
		1	0		Puesta en Valor Edificio Sede Central Ministerio de Modernización									
				51	Puesta en Valor Edificio Sede Central Ministerio de Modernización	31333	27.333	24.993			0,00	16,00	15,51	0,97
21	0				Integración de la Infraestructura Tecnológica	317.435	327.435	201.391	10.000	61,51%				
		1	0		Desarrollo del Centro y Soporte de Datos									
				51	Desarrollo del Centro y Soporte de Datos	281435	291435	171314			0,00	37,00	25,30	0,68
		2	0		Desarrollo de Conexiones Interministeriales Vía Redes									
				51	Desarrollo de Conexiones Interministeriales Vía Redes	36.000	36.000	30.077			0,00	22,00	25,30	1,15
22	0				Desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Público	161.260	161.260	132.082	0	81,91%				
		1	0		Puesta en Valor de la Infraestructura del Instituto Nacional de Administración Pública									
				51	Puesta en Valor de la Infraestructura del Instituto Nacional de Administración Pública	161260	161260	132.082			0,00	50,00	44,50	0,89
23	0				Impulso a la Iniciativa País Digital	125.536	101.536	72.921	-24.000	71,82%				
		1	0		Fortalecimiento de la Red de Comunicaciones y Conectividad									
				51	Fortalecimiento de la Red de Comunicaciones y Conectividad	41731	41731	27.771			0,00	33,00	25,05	0,76
		2	0		Desarrollo de Núcleos de Acceso al Conomiento									
				51	Desarrollo de Núcleos de Acceso al Conomiento	83.805	59.805	45.150			0,00	33,00	19,80	0,60
24	0				Fortalecimiento de la Gestión e Innovación Pública	143.512	147.512	119.498	4.000	81,01%				
		1	0		Desarrollo Infraestructura Tecnológica para Gobierno Digital - Herramientas Web									
				51	Desarrollo Infraestructura Tecnológica para Gobierno Digital - Herramientas Web	143.512	147.512	119.498			0,00	33,00	37,40	1,13
25	0				Modernización Administrativa	220.399	210.399	187.691	-10.000	89,21%				
		1	0		Desarrollo Infraestructura Tecnológica para Modernización Administrativa									
				51	Desarrollo Infraestructura Tecnológica para Modernización Administrativa	220.399	210.399	187.691			0,00	37,00	33,80	0,91
Totales Generales						999.475	975.475	738.576	-24.000	75,71%				

Montos expresados en miles de pesos.

Fuente: Cuenta de Inversión 2017 - Parametrizado SIDIF - Salida Básica de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2017.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°31: SAF 604-Dirección Nacional de Vialidad

Programa	Descripción	Programa	Descripción	Ejecución Financiera				
				Crédito		Devengado	Variación Presup.	Ejecutado
				Inicial	Vigente			
1	Actividades Centrales			50.000.000	11.723.801	6.030.826		
Total Programa 1Actividades Centrales				50.000.000	11.723.801	6.030.826	-38.276.199	51,44%
16	Mantenimiento	1	Mantenimiento por Administración	702.000.000	1.598.561.176	1.534.934.504		
16	Mantenimiento	3	Mantenimiento por Convenio	53.644.606	90.824.651	90.824.639		
16	Mantenimiento	4	Señalamiento	358.922.148	953.069.851	953.069.837		
16	Mantenimiento	5	Obras de Emergencia	35.585.547	22.902.796	22.902.792		
16	Mantenimiento	6	Mantenimiento por Sistema Modular	238.635.800	703.712.951	696.711.660		
16	Mantenimiento	7	Obras de Seguridad Vial	192.163.490	114.428.378	114.422.368		
16	Mantenimiento	8	Obras de Conservación Mejorativas - Fase I	87.927.116	426.742.941	421.495.540		
16	Mantenimiento	9	Obras de Conservación Mejorativa - Fase II	443.830.612	460.906.086	460.893.322		
16	Mantenimiento	10	Obras de Seguridad Vial en Acceso a Puentes	148.860.754	2	0		
16	Mantenimiento	11	Obras de Conservación Mejorativa - Fase III	1.673.610.975	35.336.594	34.113.772		
16	Mantenimiento	12	Obras de Conservación Mejorativa - Fase IV	133.947.279	20.086.168	20.086.157		
Total Programa 16 Mantenimiento				4.069.128.327	4.426.571.594	4.349.454.591	357.443.267	98,26%
22	Construcciones	2	Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID N° 1294)	233.261.281	10.564.718	10.564.714		
22	Construcciones	3	Obras por Convenio con Provincias	500.632.014	790.854.693	789.793.583		
22	Construcciones	4	Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas	253.953.708	277.270.921	272.677.755		
22	Construcciones	5	Obras por Concesión sin Peaje (COT)	3.748.957	22.282.387	22.282.386		
22	Construcciones	6	Obras Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes	101.324.357	239.566.813	239.210.004		
22	Construcciones	7	Obras en Corredores Viales Concesionados	0	123.686	5.222		
22	Construcciones	9	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II	855.473.081	1.530.619.862	1.523.928.207		
22	Construcciones	10	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III	1.383.969.059	1.042.184.161	1.039.051.398		
22	Construcciones	11	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase IV	10.295.569	80.852.409	80.852.406		
22	Construcciones	12	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V	490.136.974	679.844.864	679.635.501		
22	Construcciones	13	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VI	1.409.199.752	2.318.747.477	2.313.026.064		
22	Construcciones	14	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VII	3.684.739.159	4.065.440.148	4.062.980.306		
22	Construcciones	15	Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VIII	824.097.728	1.571.281.216	1.571.281.208		
22	Construcciones	16	Obras de Mejoramiento y Reposición de Puentes - Fase II	48.510.273	136.457.553	136.456.264		
22	Construcciones	17	Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IX	47.047.877	43.378.946	43.378.943		
Total Programa 22 Construcciones				9.846.389.789	12.809.469.854	12.785.123.962	2.963.080.065	99,81%
26	Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento	1	CREMA I (Préstamo 4295)	0	1	0		
26	Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento	2	CREMA II (Préstamo 4295)	1.307.462	18.026.165	18.026.162		
26	Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento	3	CREMA III (8° Préstamo "Gestión de Activos Viales")	498.302.364	788.229.964	785.845.343		
26	Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento	4	CREMA IV	1.804.246.358	2.149.384.026	2.133.271.833		
26	Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento	5	CREMA V	2.781.832.988	1.465.649.612	1.401.668.423		
Total Programa 26 Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento				5.085.689.172	4.421.289.768	4.338.811.761	-664.399.404	98,13%
36	Control de Concesiones Viales	0		0	333.300	333.300		
Total Programa 36Control de Concesiones Viales				0	333.300	333.300	333.300	100,00%
37	Infraestructura en Concesiones Viales	0		0	73.620.857	73.620.855		
Total Programa 37 Infraestructura en Concesiones Viales				0	73.620.857	73.620.855	73.620.857	100,00%
38	Infraestructura en Áreas Urbanas	0		10.000.000	22.752.716	22.752.715		
Total Programa 38 Infraestructura en Áreas Urbanas				10.000.000	22.752.716	22.752.715	12.752.716	100,00%
39	Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales	0		0	1	0		
Total Programa 39Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales				0	1	0	1	0,00%

Montos expresados en pesos.Fuente : Cuenta de Inversión 2017-Sidif



Auditoría General de la Nación

Anexo N°31: SAF 604-Dirección Nacional de Vialidad

Programa	Descripción	Programa	Descripción	Ejecución Financiera				
				Crédito		Devengado	Variación Presup.	Ejecutado
Inicial	Vigente							
40	Obras en Corredores Viales	1	Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I	710.628.687	960.123.104	960.123.098		
40	Obras en Corredores Viales	2	Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II	212.206.076	539.702.946	539.702.942		
40	Obras en Corredores Viales	3	Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III	211.225.193	464.377.512	464.189.071		
40	Obras en Corredores Viales	4	Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV	770.947.209	1.656.539.766	1.656.501.237		
40	Obras en Corredores Viales	5	Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial V	1.084.713.856	579.456.249	579.456.241		
40	Obras en Corredores Viales	6	Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI	844.169.422	628.648.030	628.648.009		
40	Obras en Corredores Viales	7	Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII	119.117.395	774.959.001	774.959.000		
40	Obras en Corredores Viales	8	Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII	989.413.075	1.123.248.823	1.123.866.608		
40	Obras en Corredores Viales	10	Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial X	441.247.464	363.404.818	363.404.815		
Total Programa 39 Obras en Corredores Viales				5.383.668.377	7.090.460.249	7.090.851.022	1.706.791.872	100,01%
42	Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales	1	Construcción de Autopista en Traza Nueva	1.037.370.664	169.388.958	165.679.627		
42	Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales	4	Duplicación de Calzada en Entorno Rural	1.491.100.971	7.254.916	3.627.453		
42	Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales	5	Duplicación de Calzada en Travesía Urbana	581.614.647	3	0		
42	Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales	6	Adecuación de Autovías a Autopistas	41.858.714	9.297.571	9.297.570		
42	Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales	7	Puesta en Valor de Autopistas Existentes	40.088.602	0	0		
42	Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales	8	Construcción de Autovías Secundarias	102.888.005	170.192.369	169.253.392		
Total Programa 42-Fortalecimiento de la Red de Autopistas Federales				3.294.921.603	356.133.817	347.858.042	-2.938.787.786	97,68%
43	Ejecución de Obras de Mejora de la Seguridad Vial-Ruta Segura	2	Obras de Seguridad sobre Calzada Existente-Ruta Segura	55.971.166	2	0		
Total Programa 43-Ejecución de Obras de Mejora de la Seguridad Vial-Ruta Segura				55.971.166	2	0	-55.971.164	0,00%
44	Ejecución de Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial	1	Ejecución de Obras Especiales de Acceso a Puertos	251.358.350	3	0		
44	Ejecución de Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial	2	Ejecución de Obras Especiales de Circunvalación y Variantes	669.924.351	147.022.260	147.022.259		
44	Ejecución de Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial	4	Ejecución de Obras Especiales de Puentes Medianos	10.000.000	0	0		
44	Ejecución de Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial	6	Ejecución de Obras Especiales de Túneles	62.470.680	0	0		
44	Ejecución de Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial	7	Ejecución de Obras Especiales de Autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires	281.597.075	522.717.025	522.717.021		
44	Ejecución de Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial	8	Ejecución de Obras Especiales de Seguridad en Montaña	29.812.263	0	0		
Total Programa 44-Ejecución de Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial				1.305.162.719	669.739.288	669.739.280	-635.423.431	100,00%
45	Ejecución de Obras de Pavimentación	1	Ejecución de Obras de Pavimentación de Camino Existente	214.929.690	0	0		
45	Ejecución de Obras de Pavimentación	5	Ejecución de Obras de Repavimentación	317.570.478	175.049.130	174.869.756		
Total Programa 45-Ejecución de Obras de Pavimentación				532.500.168	175.049.130	174.869.756	-357.451.038	99,90%
46	Fortalecimiento de la Red Nacional Vial a través de Nuevas Rutas y Caminos	1	Construcción de Nuevas Rutas de Alto Tránsito	71.280.763	1	0		
46	Fortalecimiento de la Red Nacional Vial a través de Nuevas Rutas y Caminos	3	Construcción de Camino de Acceso desde Rutas Troncales	74.188.561	1	0		
Total Programa 46-Fortalecimiento de la Red Nacional Vial a través de Nuevas Rutas y Caminos				145.469.324	2	0	-145.469.322	0,00%
83	Desarrollo de la Infraestructura Productiva (BID N° 2185/OC-AR, N° 2655/OC-AR y N° S/N y CAF N° 7352, N° 8026, N° 8653; y S/N)	0		1.849.792	239.898	0		
Total Programa 83-Desarrollo de la Infraestructura Productiva (BID N° 2185/OC-AR, N° 2655/OC-AR y N° S/N y CAF N° 7352, N° 8026, N° 8653; y S/N)				1.849.792	239.898	0	-1.609.894	0,00%
85	Acciones para el Desarrollo Integrador del Norte Grande (BID N° 1851/OC-AR, Ampliación N° 2698/OC-AR y N° 3050/OC-AR, CAF N° S/N y BIRF N° 7991 y N° S/N)	0		242.176.102	215.342.697	128.446.706		
Total Programa 85-Acciones para el Desarrollo Integrador del Norte Grande (BID N° 1851/OC-AR, Ampliación N° 2698/OC-AR y N° 3050/OC-AR, CAF N° S/N y BIRF N° 7991 y N° S/N)				242.176.102	215.342.697	128.446.706	-26.833.405	59,65%
Total IRD saf 604				30.022.926.539	30.272.726.974	29.987.892.815	288.076.634	99,06%
SAF 604-Actividades				294.025.894	296.788.730	201.626.315		
SAF 604-Proyectos				29.728.900.645	29.975.938.244	29.786.266.501		

Montos expresados en pesos.Fuente : Cuenta de Inversión 2017-Sidif



Auditoría General de la Nación

Anexo N°32: SAF 623-Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

SAF 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria														
Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Obra	Descripcion	Ejecución Financiera					% de Avance Físico			
						Crédito		Devengado	Variación Presup.	Ejecutado	Ejec. Física Acum. Ejercicio 2016	Meta Final (a)	Meta Ejecutada (b)	% Meta Ejecutada (c=b/a)
						Inicial	Vigente							
22	0				Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria	72.296	173.560	166.725	101.264	96,06%				
		7	0		Construcción y Equipamiento del Laboratorio Vegetal Dilab									
				51	Construcción y Equipamiento del Laboratorio Vegetal Dilab (1)	72.296	173.560	166.725			32,9	67,1	63,98	95,35%
Totales Generales						72.296	173.560	166.725	101.264	96,06%				

Montos expresados en miles de pesos.

Fuente: Cuenta de Inversión 2017 - Parametrizado SIDIF - Salida Básica de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2017.

Referencias:

- (1) El Crédito Presupuestario se incrementó en un 140,06%, en virtud de que no se contaba con el Aporte Local pertinente para hacer frente a los gastos comprometidos teniendo en cuenta que la obra se encontraba con un avance físico superior al 90%. DNU N° 1013/2017.



Auditoría General de la Nación

Anexo N°33: SAF 906-Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán

SAF 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán														
Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Otra	Descripción	Ejecución Financiera					% de Avance Físico			
						Crédito		Devengado	Variación Presup.	Ejecutado	Ejec. Física Acum. Ejercicio 2016	Meta Final (a)	Meta Ejecutada (b)	% Meta Ejecutada (c=b/a)
						Inicial	Vigente							
56					Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud	28.613	30.616	29.246	2.003	95,52%				
	0				Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud	6.722	2.132	1.992						
		25	0		Recuperación Patrimonial de las Fachadas, Vestíbulos de Acceso, Circulaciones Principales, Cubiertas y Espacios Pab Dr. Malbrán									
			51		Recuperación Patrimonial de las Fachadas, Vestíbulos de Acceso, Circulaciones Principales, Cubiertas y Espacios Pab Dr. Malbrán	2.101	1	0			0,00	100	0,00	0,00
		26	0		Refuncionalización de Edificio de Tecnologías de la Información A.N.L.I.S. para Instalación de Data Center									
			51		Refuncionalización de Edificio de Tecnologías de la Información A.N.L.I.S. para Instalación de Data Center	1050	307	280			100,00	0,00	0,00	0,00
		32	0		Construcción de Control de Acceso al Edificio Central por Avenida Suarez									
			51		Construcción de Control de Acceso al Edificio Central por Avenida Suarez	0	75	74			100,00	—	0,00	—
		34	0		Adecuación Espacios Exteriores y Contrafrente del Edificio Central									
			51		Adecuación Espacios Exteriores y Contrafrente del Edificio Central	3.571	0	0			0,00	2,00	0,00	0,00
		38	0		Adecuación de Instalaciones Toma de Muestras de Efluentes									
			51		Adecuación de Instalaciones Toma de Muestras de Efluentes	0	1350	1313			—	—	50,00	—
		43	0		Construcción Sanitarios para el Personal de Higiene y Medicina Laboral- Depósito de Residuos Especiales, Patológicos y Balanza									
			51		Construcción Sanitarios para el Personal de Higiene y Medicina Laboral- Depósito de Residuos Especiales, Patológicos y Balanza	0	400	325			0,00	100,00	60,00	0,60
1					Desarrollo y Producción de Biológicos	1.500	19.436	18.345						
		39	0		Adecuación de Instalaciones del Campo de Marcos Paz									
			51		Adecuación de Instalaciones del Campo de Marcos Paz	1500	11370	10.934			0,00	80,00	80,00	100
		25	0		Remodelación y Adecuación Instalaciones Sector Control de Calidad Físico Químicos									
			51		Remodelación y Adecuación Instalaciones Sector Control de Calidad Físico Químicos	0	917	644			0,00	100,00	80,00	0,80
		26	0		Remodelación y Ampliación de Sector Vacunas Bacterianas									
			51		Remodelación y Ampliación de Sector Vacunas Bacterianas	0	2.230	1875			0,00	100,00	90,00	0,90
		27	0		Remodelación y Adecuación del Sector de Toxinas y Toxoides - Tetanos									
			51		Remodelación y Adecuación del Sector de Toxinas y Toxoides - Tetanos	0	1688	1688			0,00	100,00	100,00	100
		28	0		Adecuación Planta de Tratamiento y Purificación de Agua Tipo Wfi									
			51		Adecuación Planta de Tratamiento y Purificación de Agua Tipo Wfi	0	1895	1894			0,00	70,00	25,00	0,36
		29	0		Remodelación Sector Bioterio Central									
			51		Remodelación Sector Bioterio Central	0	1335	1311			0,00	100,00	45,00	0,45
2					Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virósicas	18.905	5.335	5.298						
		30	0		Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatología y Enterobacterias - Departamento de Bacteriología del INEI- Etapa II									
			51		Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatología y Enterobacterias - Departamento de Bacteriología del INEI- Etapa II	18.905	2.745	2.709			0,00	38,70	25,00	0,65
		32	0		Remodelación de Oficina y Sector Laboratorio del Departamento de Parasitología									
			51		Remodelación de Oficina y Sector Laboratorio del Departamento de Parasitología	0	951	951			0,00	100,00	100,00	100
		33	0		Remodelación Cubiertas y Sistema Pluvial Servicio Fisiopatología									
			51		Remodelación Cubiertas y Sistema Pluvial Servicio Fisiopatología	0	1639	1638			0,00	100,00	100,00	100
3					Investigación, Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias	0	470	369						
		33	0		Reordenamiento Planta Subsuelo - Nuevo Tendido de Gas para Caldera con Habilitación del Tendido y Habilitación de Caldera									
			51		Reordenamiento Planta Subsuelo - Nuevo Tendido de Gas para Caldera con Habilitación del Tendido y Habilitación de Caldera	0	470	369			0,00	100,00	95,00	0,95
6					Control de Tuberculosis y otras Enfermedades Respiratorias	0	2.647	2.646						
		9	0		Puesta en Valor del Tendido de Red Eléctrico Subterráneo y Tablero Eléctrico del INER									
			51		Puesta en Valor del Tendido de Red Eléctrico Subterráneo y Tablero Eléctrico del INER	0	207	206			93,80		6,20	—
		11	0		Reparación de Cubiertas, Tanque de Agua y Sanitario de Laboratorios del INER - Santa Fe									
			51		Reparación de Cubiertas, Tanque de Agua y Sanitario de Laboratorios del INER - Santa Fe	0	2.440	2.440			39,00		6100	—
8					Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias	1.260	596	595						
		33	0		Puesta en Valor Áreas Comunes del Instituto Nacional de Epidemiología (INE)									
			51		Puesta en Valor Áreas Comunes del Instituto Nacional de Epidemiología (INE)	0	596	595			9120		8,80	—
		34	0		Instalación Sistema de Ventilación en Laboratorios del Instituto Nacional de Epidemiología (INE)									
			51		Instalación Sistema de Ventilación en Laboratorios del Instituto Nacional de Epidemiología (INE)	1260	0	0			0,00	7,00	0,00	0,00
9					Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional	225	0	0						
		2	0		Construcción de Nuevo Edificio del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales									
			51		Construcción de Nuevo Edificio del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales	225	0	0			0,00	2,00	0,00	0,00
Totales Generales						28.613	30.616	29.246	2.003	95,52%				

Montos expresados en miles de pesos.

etizado SIDIF - Salida Básica de Ejecución Anual de Mediciones Físicas al 31/12/2017.
